




| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc | |
|--------|-------|------------|---|----------|--------------|--------------|-----|--|
| 1 | 0 | | Yenilik Okulda | 235 gün | Sal 08.11.16 | Pzt 02.10.17 | | |
| 2 | 1 | | Proje Yöneticisinin Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması | 21 gün | Sal 08.11.16 | Çar 07.12.16 | | |
| 13 | 2 | | Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin Tasarım İzinlerinin Alınması | 16 gün | Çar 09.11.16 | Çar 30.11.16 | 2 | |
| 65 | 1.9 | | Yazılım Sözleşmelerinin İmzalanması | 3 gün | Sal 08.11.16 | Per 10.11.16 | 2 | |
| 16 | 3 | | Sınıf ve Laboratuvarların Tasarımının Yapılması | 17 gün | Cum 30.12.16 | Pzt 23.01.17 | 13 | |
| 20 | 1.4 | | Sınıf ve Laboratuvarların Boşaltılması İşlemlerinin Yapılması | 10 gün | Pzt 23.01.17 | Cum 03.02.17 | 16 | |
| 28 | 4 | | Binanın Isı, Işık ve Ses Yalıtımı ve Boya için Gerekli İşlemlerinin Yapılması | 9 gün | Pzt 23.01.17 | Per 02.02.17 | 20 | |
| 29 | 4.1 | | Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin İç Mantolama, Işık Yalıtım ve Ses Yalıtım Malzemelerin Alınması | 2,88 gün | Pzt 23.01.17 | Çar 25.01.17 | | |
| 30 | 1.5.2 | | Kapıların Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 31 | 1.5.3 | | Cam Filmi Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 32 | 1.5.4 | | Elektrik Sistemleri İçin Anahtarların Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 33 | 1.5.5 | | Duvardaki Prizlerin Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 34 | 1.5.6 | | 6'lı Prizlerin Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 35 | 1.5.7 | | Ampullerin Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 36 | 1.5.8 | | Perdelerin Alınması | 7 gün | Pzt 23.01.17 | Sal 31.01.17 | | |
| 37 | 1.5.9 | | Sınıflar ve Laboratuvarların İç Mantolama İşlemlerinin Yapılması | 3 gün | Per 19.01.17 | Pzt 23.01.17 | | |

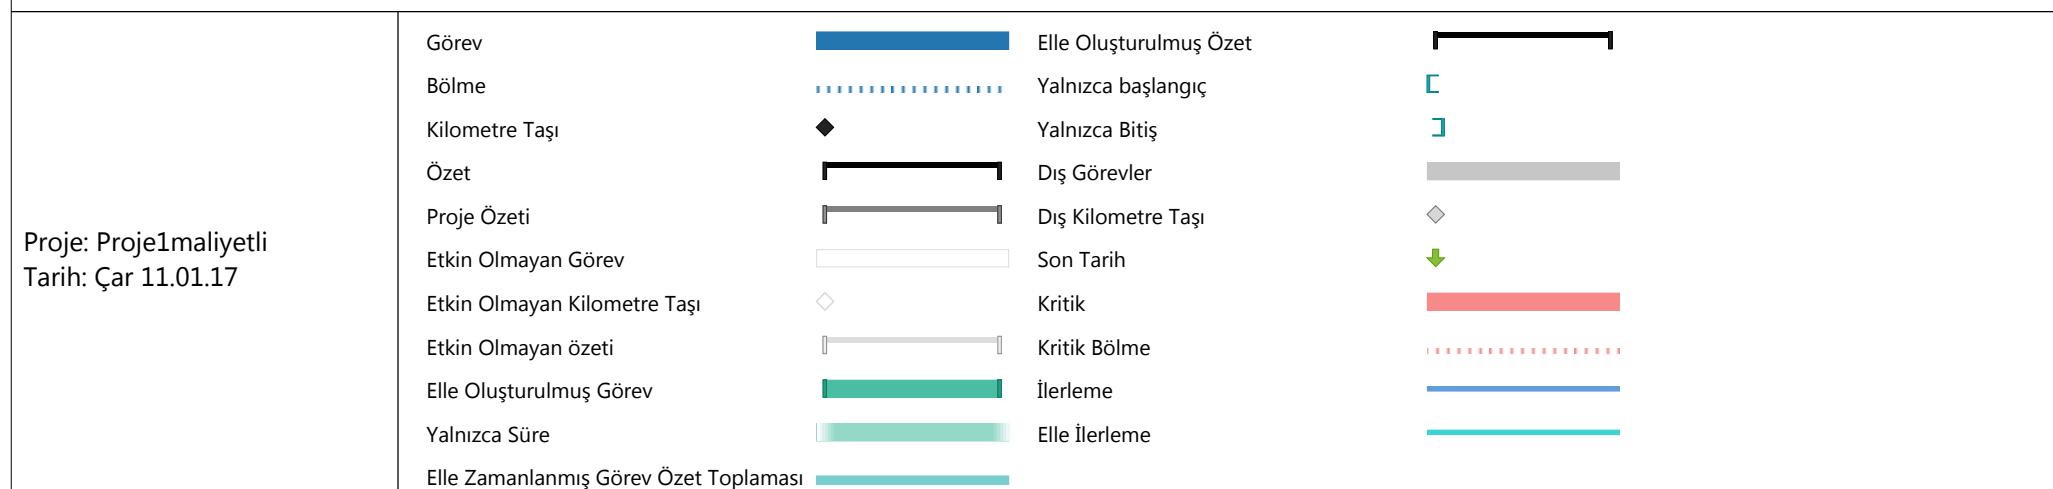


| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc |
|--------|--------|------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----------|
| 38 | 1.5.10 | ⭐ | İç Mantolama İşleminin Kuruması | 1 gün | Pzt 23.01.17 | Pzt 23.01.17 | |
| 39 | 1.5.11 | ⭐ | Sınıflar ve Laboratuvarların Ses Yalıtımı İşlemlerinin Yapılması | 3 gün | Sal 24.01.17 | Per 26.01.17 | |
| 40 | 1.5.12 | ⭐ | Ses Yalıtım İşleminin Kuruması | 1 gün | Per 26.01.17 | Per 26.01.17 | |
| 41 | 1.5.13 | ⭐ | Sınıflar ve Laboratuvarların Işık Yalıtımı İşlemlerinin Yapılması | 3 gün | Cum 27.01.17 | Sal 31.01.17 | |
| 42 | 1.5.14 | ⭐ | Işık Yalıtım Sisteminin Kuruması | 1 gün | Sal 31.01.17 | Sal 31.01.17 | |
| 43 | 1.5.15 | ⭐ | Sınıflar ve Laboratuvarların Boya İşlemlerinin Yapılması | 1 gün | Çar 01.02.17 | Çar 01.02.17 | |
| 44 | 1.5.16 | ⭐ | Boyanın Kuruması | 2 gün | Çar 01.02.17 | Per 02.02.17 | |
| 45 | 1.6 | ⭐ | Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Alım Sözleşmesinin İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | 28 |
| 46 | 1.6.1 | 📅 | İpad Pro'lar İçin Alım Sözleşmesinin İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |
| 47 | 1.6.2 | ⭐ | Apple Pencil'lar İçin Alım Sözleşmesinin İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |
| 48 | 1.6.3 | ⭐ | Parmak İzi Okuyan Sensörün Alım Sözleşmesinin İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |
| 49 | 1.6.4 | ⭐ | Basınç Ölçen Sensörün Alım Sözleşmesinin İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |
| 50 | 1.6.5 | ⭐ | iMac satın alma sözleşmesinin imzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |

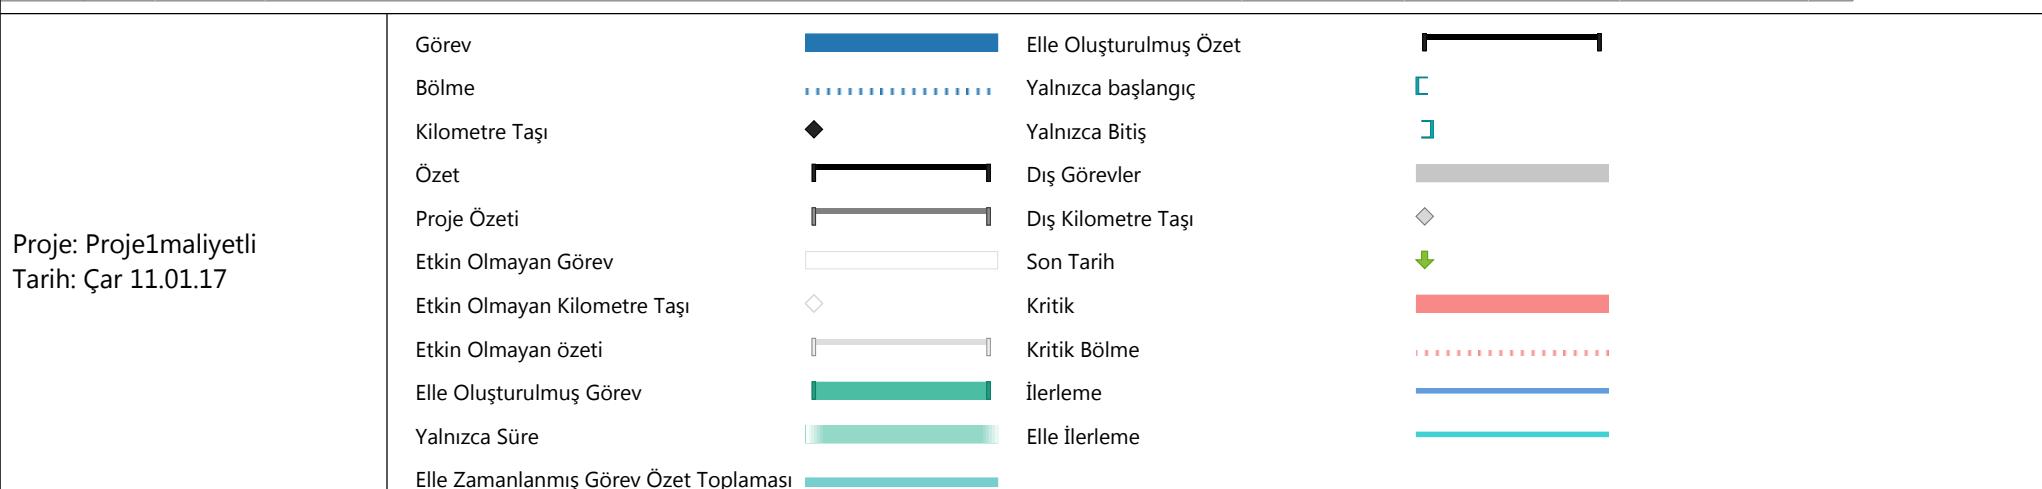


| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc |
|--------|--------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 51 | 1.6.6 | | Elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duy alınması İçin Alım Sözleşmesi İmzalanması | 3 gün | Per 02.02.17 | Pzt 06.02.17 | |
| 52 | 1.7 | | Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | 45 |
| 53 | 1.7.1 | | İpad Pro'ların Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 54 | 1.7.2 | | Parmak İzi Okuyucu | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 55 | 1.7.3 | | Basınç Ölçen Sensörlerin Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 56 | 1.7.4 | | Apple Pencil'ların Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 57 | 1.7.5 | | iMac pelerin Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 58 | 1.7.6 | | Fiber Kabloların Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 59 | 1.7.6. | | İç Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 60 | 1.7.6. | | Dış Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 61 | 1.7.7 | | Switchlerin Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 62 | 1.7.8 | | Modemlerin Tedarik Edilmesi | 30 gün | Sal 07.02.17 | Pzt 20.03.17 | |
| 63 | 1.8 | | Sınıf ve Laboratuvarların Düzeninin Oluşturulması | 5 gün | Cum 06.01.17 | Per 12.01.17 | 52 |
| 64 | 1.8.1 | | Sınıf ve Laboratuvarlarda Yerleşim Planlarının Oluşturulması | 5 gün | Cum 06.01.17 | Per 12.01.17 | |
| 68 | 1.10 | | Laboratuvar ve Sınıflar İçin Alınmış Malzemelerin Sınıfa Yerleşmesi | 90 gün | Cum 06.01.17 | Per 11.05.17 | 65 |
| 85 | 1.13 | | Yazılımların Ekran Tasarımlarının Yapılması | 15 gün | Per 10.11.16 | Çar 30.11.16 | 65 |
| 100 | 1.15 | | Yazılımı Ürünlere Yerleştirmek | 90 gün | Sal 14.03.17 | Pzt 17.07.17 | 65 |

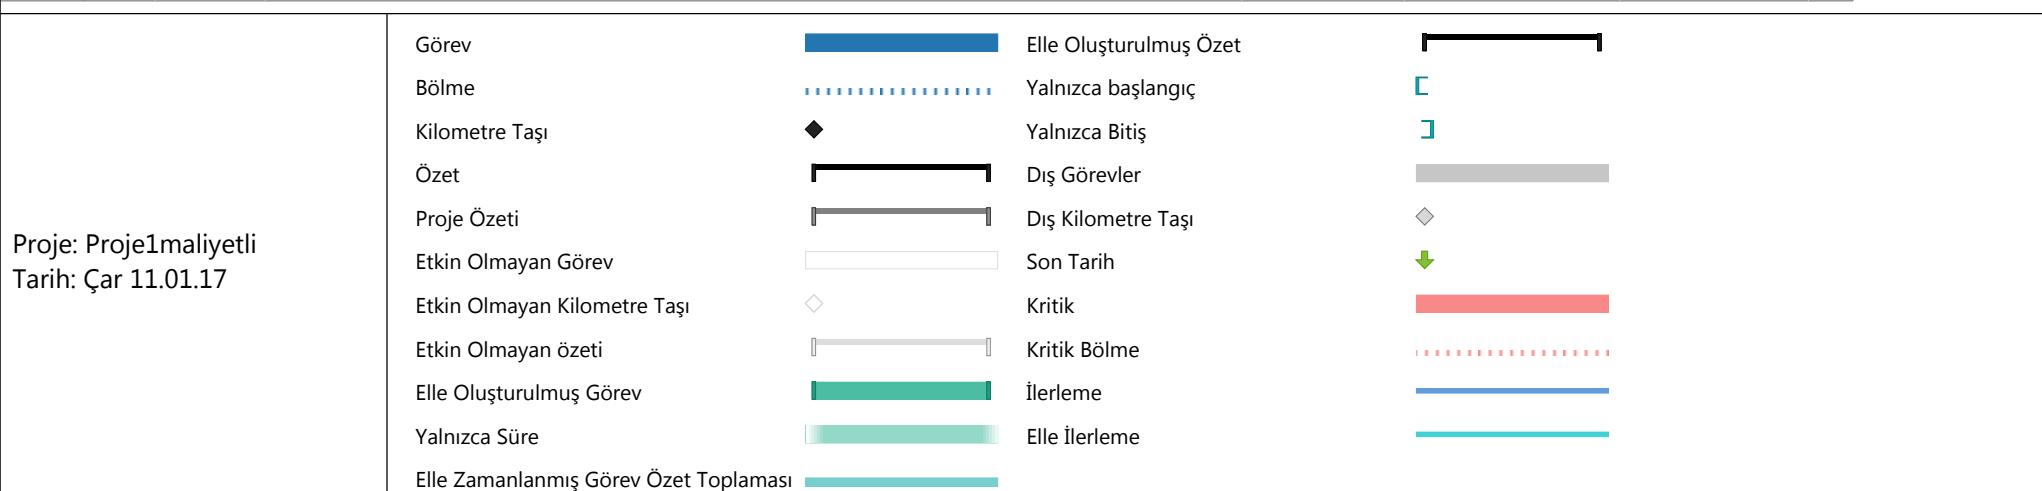


| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc |
|--------|--------|------------|---|--------|--------------|--------------|-----|
| 77 | 1.11 | | İnternet Bağlantısının Yapılması | 20 gün | Cum 06.01.17 | Per 02.02.17 | 68 |
| 82 | 1.12 | | İnternet Bağlantısının Test Edilmesi | 17 gün | Çar 11.01.17 | Per 02.02.17 | 77 |
| 88 | 1.14 | | Yazılımların Kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | 85 |
| 89 | 1.14.1 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri elde edilmesinin kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 90 | 1.14.1 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin okunmasının kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 91 | 1.14.1 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin işlenmesinin kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 92 | 1.14.4 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının kodlaması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 93 | 1.14.5 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün kodlaması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 94 | 1.14.6 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının kodlaması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 95 | 1.14.7 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin kodlaması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 96 | 1.14.8 | | Veri okuma yazılımının veri alımının kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |

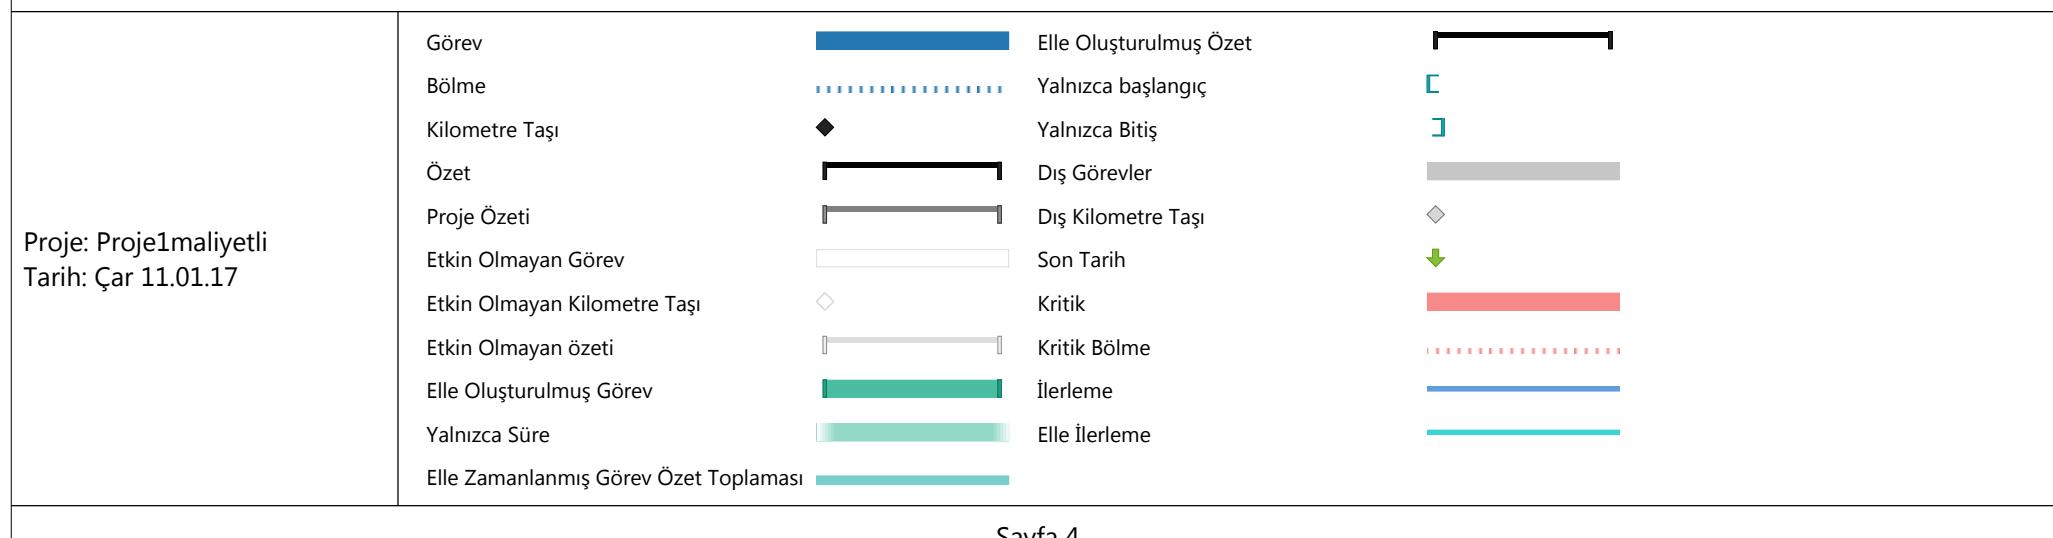


| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc |
|--------|--------|------------|---|--------|--------------|--------------|------|
| 97 | 1.14.5 | | Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 98 | 1.14.1 | | Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 99 | 1.14.1 | | Veri okuma yazılımının İdareye gönderilecek verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması | 75 gün | Çar 30.11.16 | Sal 14.03.17 | |
| 108 | 1.16 | | Yazılımların Test Edilmesi | 8 gün | Cum 28.07.17 | Sal 08.08.17 | 100% |
| 109 | 1.16.1 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri elde edilmesinin kodlanması test edilmesi | 1 gün | Cum 28.07.17 | Cum 28.07.17 | |
| 110 | 1.16.2 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin okunmasının kodlanması test edilmesi | 1 gün | Cmt 29.07.17 | Cmt 29.07.17 | |
| 111 | 1.16.3 | | Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin işlenmesinin kodlanması test edilmesi | 1 gün | Paz 30.07.17 | Paz 30.07.17 | |
| 112 | 1.16.4 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının kodlamasının test edilmesi | 1 gün | Pzt 31.07.17 | Pzt 31.07.17 | |
| 113 | 1.16.5 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün kodlamasının test edilmesi | 1 gün | Sal 01.08.17 | Sal 01.08.17 | |
| 114 | 1.16.6 | | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının kodlamasının test edilmesi | 1 gün | Paz 02.07.17 | Paz 02.07.17 | |

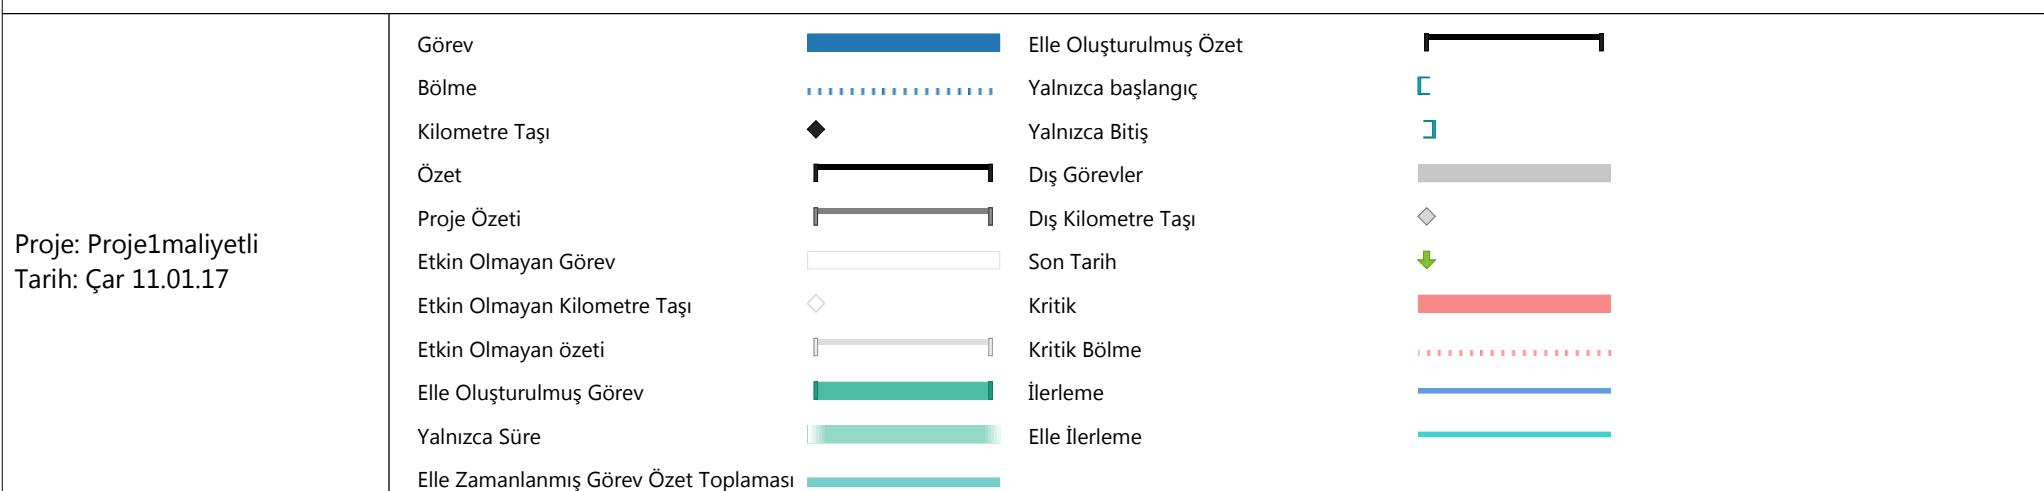


| Kimlik | ÇÇY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc |
|--------|--------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| 115 | 1.16.1 | ★ | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin kodlanmasıının test edilmesi | 1 gün | Pzt 03.07.17 | Pzt 03.07.17 | |
| 116 | 1.16.8 | ★ | Veri okuma yazılımının veri alımının kodlanmasıının test edilmesi | 1 gün | Sal 04.07.17 | Sal 04.07.17 | |
| 117 | 1.16.9 | ★ | Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin kodlanmasıının test edilmesi | 1 gün | Çar 05.07.17 | Çar 05.07.17 | |
| 118 | 1.16.1 | ★ | Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanmasıının test edilmesi | 1 gün | Per 06.07.17 | Per 06.07.17 | |
| 119 | 1.16.1 | ★ | Veri okuma yazılımının idareye gönderilecek verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanmasıının test edilmesi | 1 gün | Cum 07.07.17 | Cum 07.07.17 | |
| 120 | 1.16.1 | ★ | Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının test edilmesinin test edilmesi | 1 gün | Cmt 08.07.17 | Cmt 08.07.17 | |
| 121 | 1.17 | ★ | Eğitimlerin Hazırlanması | 12 gün | Sal 08.08.17 | Çar 23.08.17 | 108 |
| 122 | 1.17.1 | █ | Öğretmenler İçin Eğitimlerin Hazırlanması | 12 gün | Sal 08.08.17 | Çar 23.08.17 | |
| 123 | 1.17.1 | ★ | İdari Personele Verilecek Eğitimlerin Hazırlanması | 12 gün | Sal 08.08.17 | Çar 23.08.17 | |
| 124 | 1.17.3 | ★ | Öğrencilere Verilecek Eğitimlerin Hazırlanması | 12 gün | Sal 08.08.17 | Çar 23.08.17 | |
| 125 | 1.18 | ★ | Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması | 10 gün | Çar 30.08.17 | Sal 12.09.17 | 121 |
| 126 | 1.18.1 | ★ | Veli Bilgilendirme Sisteminin Kurulması | 10 gün | Çar 30.08.17 | Sal 12.09.17 | |

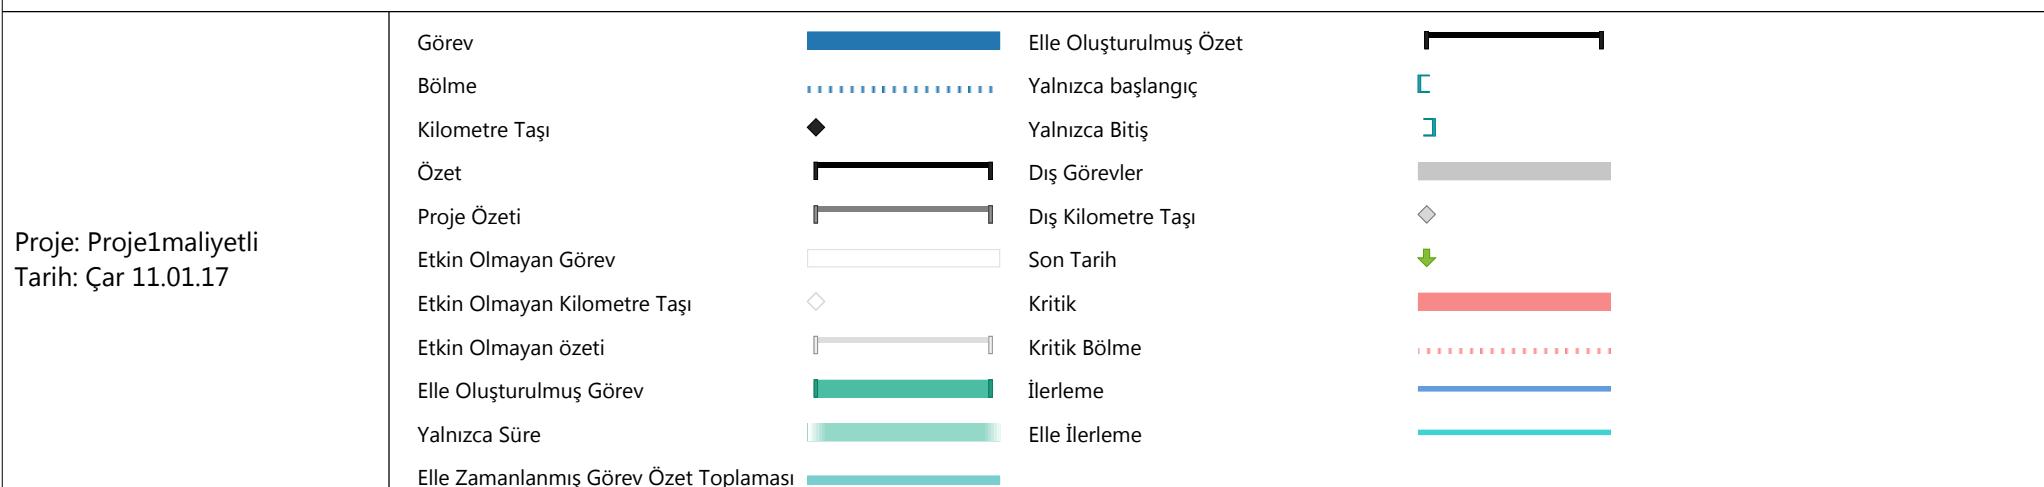

| Kimlik | ÇCY | Görev Modu | Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş | Önc | |
|--------|---|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| 127 | 1.18.  | | Öğretmen Bilgilendirme Sisteminin Kurulması | 10 gün | Çar 30.08.17 | Sal 12.09.17 | | |
| 128 | 1.18.  | | Okul Yönetimi Bilgilendirme Sistemi Kurulması | 10 gün | Çar 30.08.17 | Sal 12.09.17 | | |
| 129 | 1.19.  | | Eğitimlerin Verilmesi | 15 gün | Sal 12.09.17 | Pzt 02.10.17 | 125 | |
| 130 | 1.19.  | | Öğretmenlere Eğitimlerin Verilmesi | 15 gün | Sal 12.09.17 | Pzt 02.10.17 | | |
| 131 | 1.19.  | | İdari Personele Eğitimlerin Verilmesi | 15 gün | Sal 12.09.17 | Pzt 02.10.17 | | |
| 132 | 1.19.  | | Öğrencilere Eğitimlerin Verilmesi | 15 gün | Sal 12.09.17 | Pzt 02.10.17 | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev |  | Elle Oluşturulmuş Özet |  |
| | Bölme |  | Yalnızca başlangıç |  |
| | Kilometre Taşı |  | Yalnızca Bitiş |  |
| | Özet |  | Dış Görevler |  |
| | Proje Özeti |  | Dış Kilometre Taşı |  |
| | Etkin Olmayan Görev |  | Son Tarih |  |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı |  | Kritik |  |
| | Etkin Olmayan özeti |  | Kritik Bölme |  |
| | Elle Oluşturulmuş Görev |  | İlerleme |  |
| | Yalnızca Süre |  | Elle İlerleme |  |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması |  | | |


| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Alauç A.Ş. Proje Yöneticisi | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Proje Yöneticisi;Zübeyde Hanım Ortaokulunun Yönetim Kurulu | | | | | | | | | |
| İç Cephe Çalışanları | | | | | | | | | |
| GESER PAREX A.Ş Satın Alma Departmanı;isi- Ses Yalıtım Sivası - Camlı Sıva 1PKT T32[1.320] | | | | | | | | | |
| Valiodor Classic VDM ATLANTİS YALITIMLI KAPI[22] | | | | | | | | | |
| EV OFİS CAM FİLMİ ISI YALITIMLI 75 CM * 10 MT[66] | | | | | | | | | |
| VİKO CARMEN ANAHTAR BEYAZ/TV SONLU[22] | | | | | | | | | |
| VİKO KARE TOPRAKLI PRİZ ÇERÇEVE DAHİL[242] | | | | | | | | | |
| VİK MULTİ-LED 6lı Priz Anahtarlı,Topraklı, Çocuk Korumalı KL | | | | | | | | | |
| DIALİ FLORASAN AMPUL E27 15/65 WATT)[22] | | | | | | | | | |
| Siyah Prestige Blackout Stor Perde[66] | | | | | | | | | |
| İç Cephe Çalışanları;İnşaat Yöneticisi | | | | | | | | | |

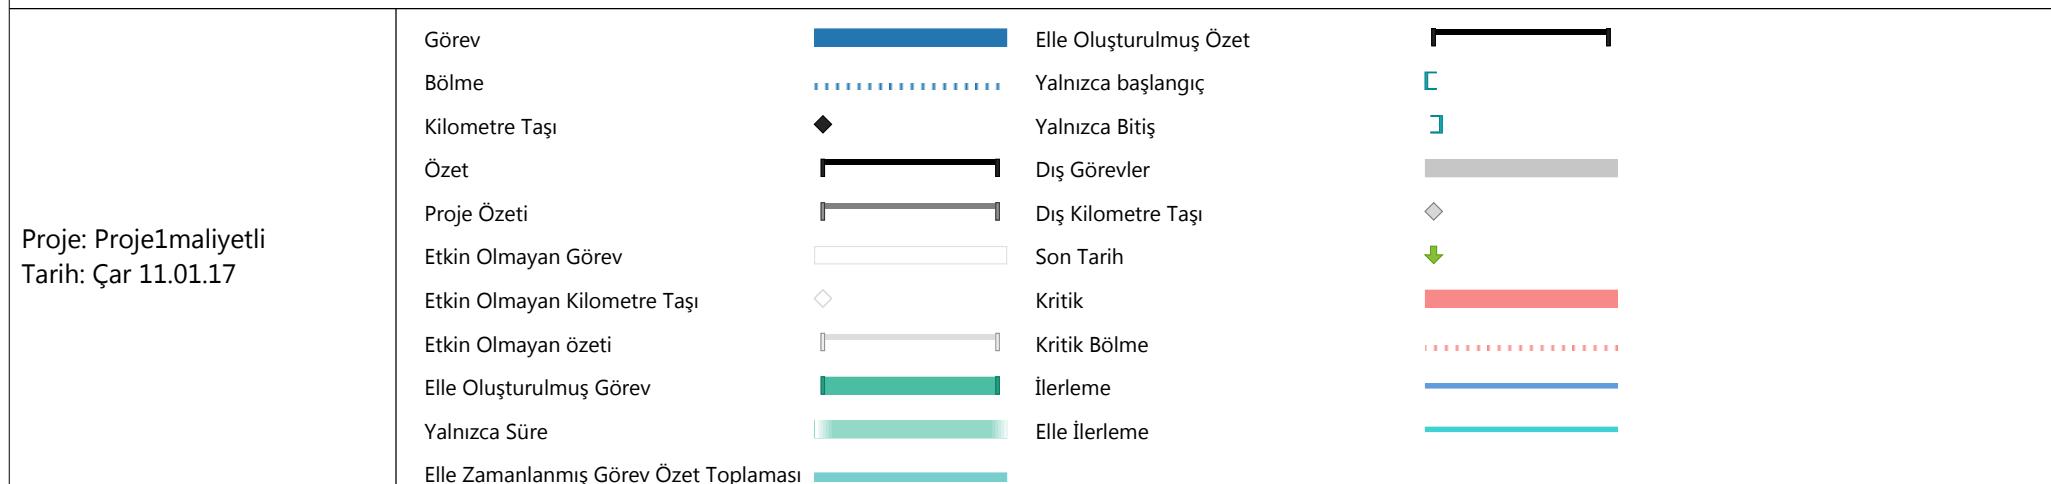

| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İç Cephe Çalışanları;İnşaat Yöneticisi | | | | | | | | | |
| İç Cephe Çalışanları;İnşaat Yöneticisi | | | | | | | | | |
| İç Cephe Çalışanları;İnşaat Yöneticisi | | | | | | | | | |
| Apple inc. Satın Alma Departmanı;Alauç A.Ş. Satın Alma Departmanı | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Apple inc. Satın Alma Departmanı;Alauç A.Ş. Satın Alma De | | | | | | | | | |
| iPad Pro 12.9[770] | | | | | | | | | |
| Parmak izi okuyucu sensor/ growe[770] | | | | | | | | | |
| HT - 163 Basınç ısı nem ölçer usb data loger[770] | | | | | | | | | |
| iPad Pro için Apple Pencil[770] | | | | | | | | | |
| 21,5 inc retina 4k ekranlı imac[30] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ic fiber patch kablo 3 mt[3] | | | | | | | | | |
| MM-50/125 OM3 Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Dahili/Harici LSZ | | | | | | | | | |
| Zyxel XGS-4728F SWiTCH[1] | | | | | | | | | |
| TP-LINK ARCHER VR900 1900 MBPS WIRELESS DUVAL BANT | | | | | | | | | |
| Zübeyde Hanım Ortaokulu Eğitim Teknoloğu;Alauç A.Ş. Proj | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Yazılım Geliştirme Ekibi Lideri;Alauç A.Ş. Yazılım | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi | | | | | | | | | |

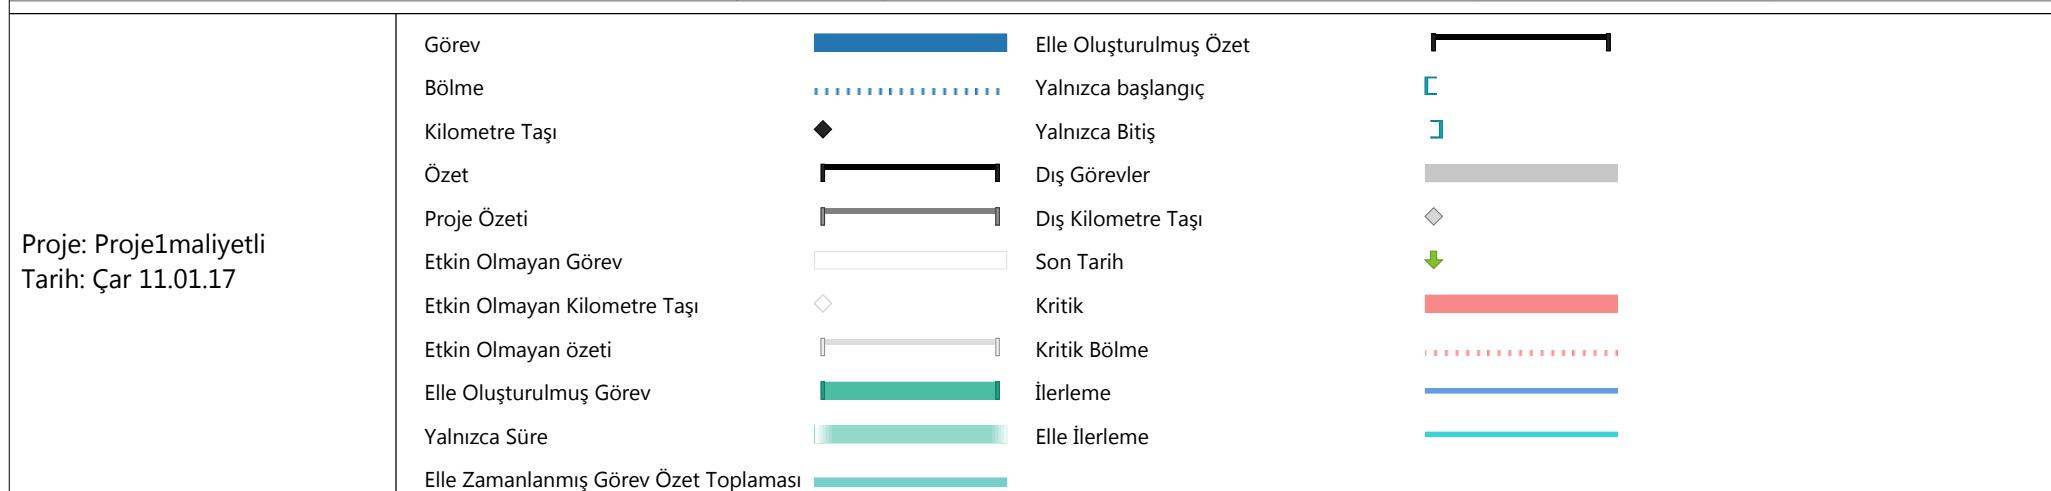

| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Yazılım Test Ekibi | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Yazılım Mühendisleri | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17




| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Zübeyde Hanım Ortaokulu Eğitim Teknoloğu | | | | | | | | | |
| Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| Kaynak Adları | Pzt 07.11 0 12 | Sal 08.11 0 12 | Çar 09.11 0 12 | Per 10.11 0 12 | Cum 11.11 0 12 | Cmt 12.11 0 12 | Paz 13.11 0 12 | Pzt 14.11 0 12 | Sal 15.11 0 12 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zübeyde Hanım Ortaokulu Eğitim Teknoloğu | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

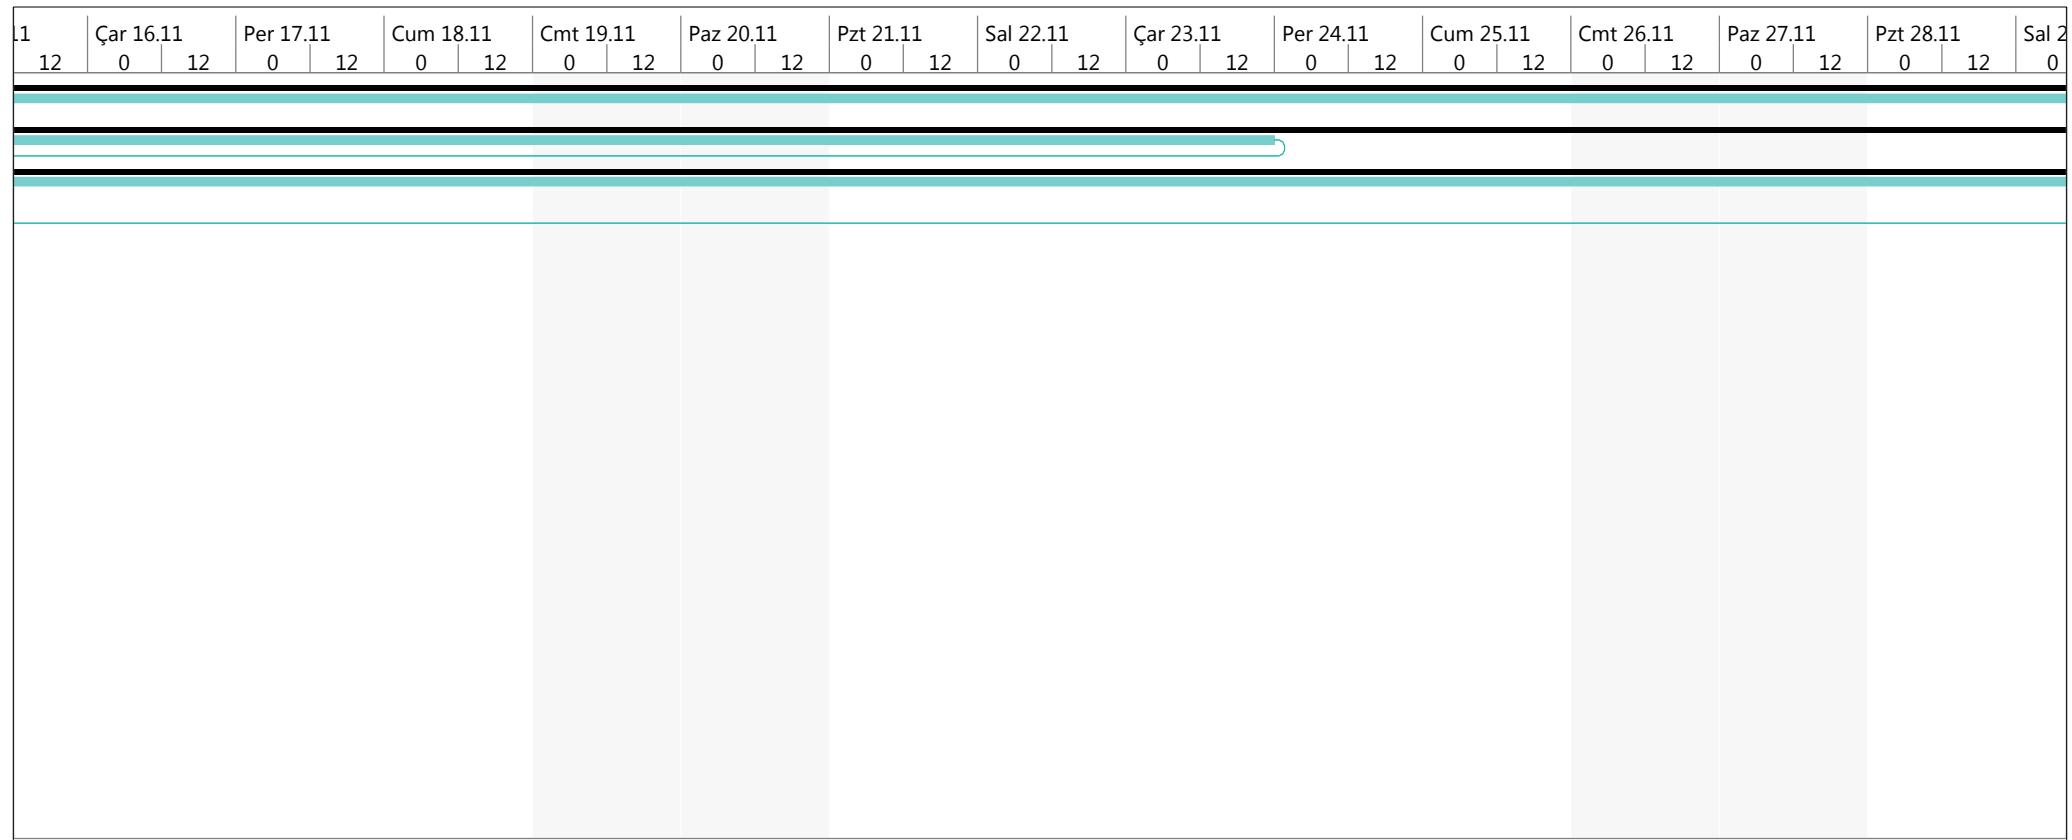

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 12 | Çar 0 | 16.11 12 | Per 0 | 17.11 12 | Cum 0 | 18.11 12 | Cmt 0 | 19.11 12 | Paz 0 | 20.11 12 | Pzt 0 | 21.11 12 | Sal 0 | 22.11 12 | Çar 0 | 23.11 12 | Per 0 | 24.11 12 | Cum 0 | 25.11 12 | Cmt 0 | 26.11 12 | Paz 0 | 27.11 12 | Pzt 0 | 28.11 12 | Sal 0 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Sal 29.11 0 | Çar 30.11 12 | Per 01.12 0 | Cum 02.12 12 | Cmt 03.12 0 | Paz 04.12 12 | Pzt 05.12 0 | Sal 06.12 12 | Çar 07.12 0 | Per 08.12 12 | Cum 09.12 0 | Cmt 10.12 0 | Paz 11.12 12 | Pzt 12.12 0 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|

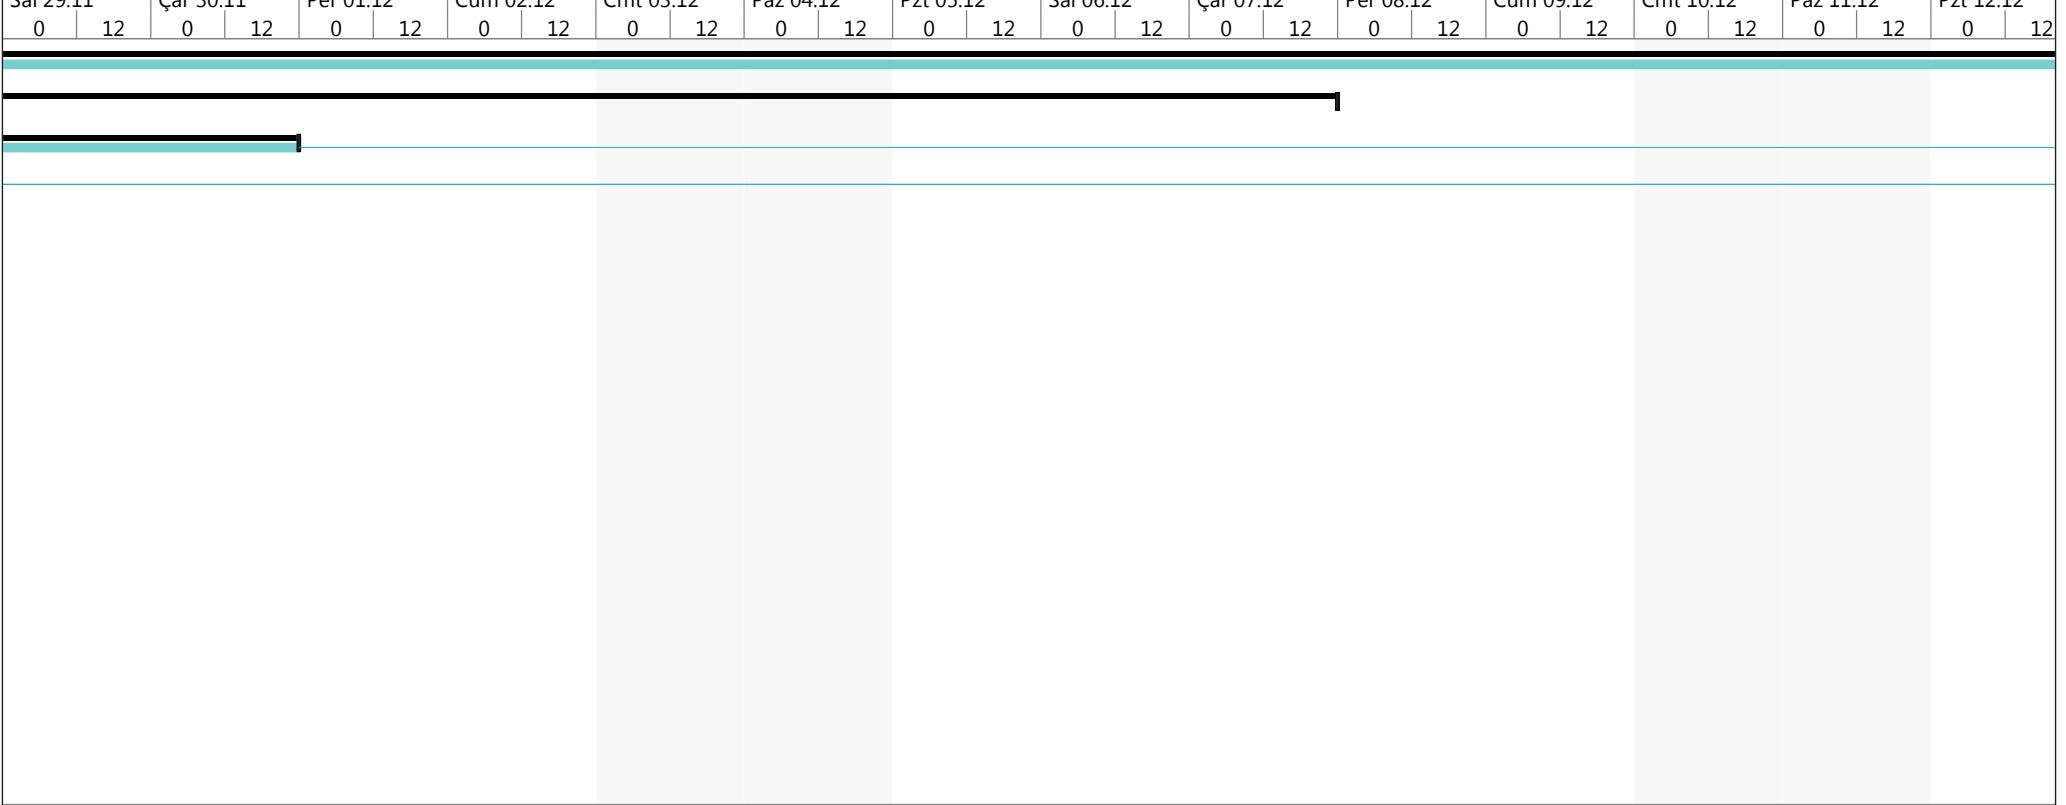


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

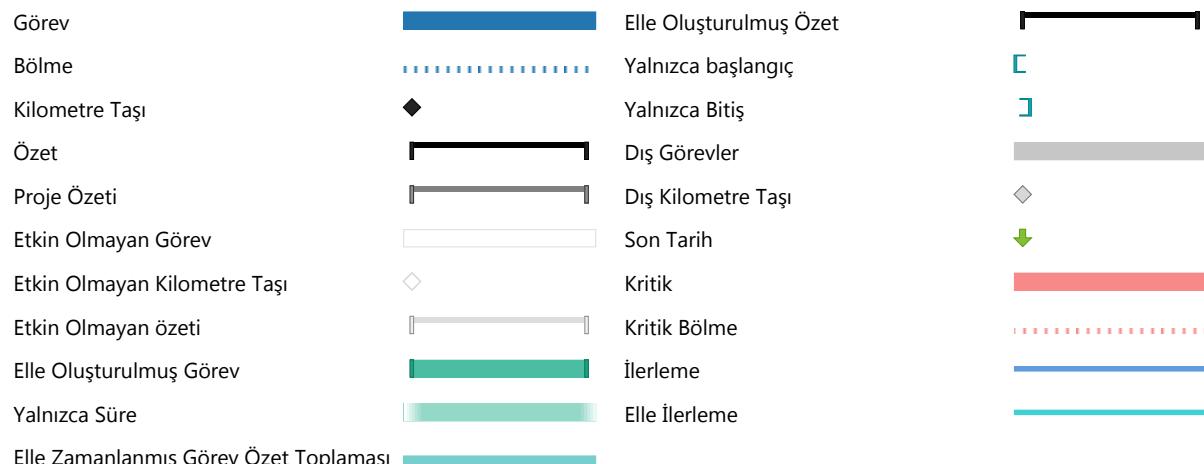

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sal 29.11 0 | Çar 30.11 12 | Per 01.12 0 | Cum 02.12 12 | Cmt 03.12 0 | Paz 04.12 12 | Pzt 05.12 0 | Sal 06.12 12 | Çar 07.12 0 | Per 08.12 12 | Cum 09.12 0 | Cmt 10.12 0 | Paz 11.12 0 | Pzt 12.12 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |




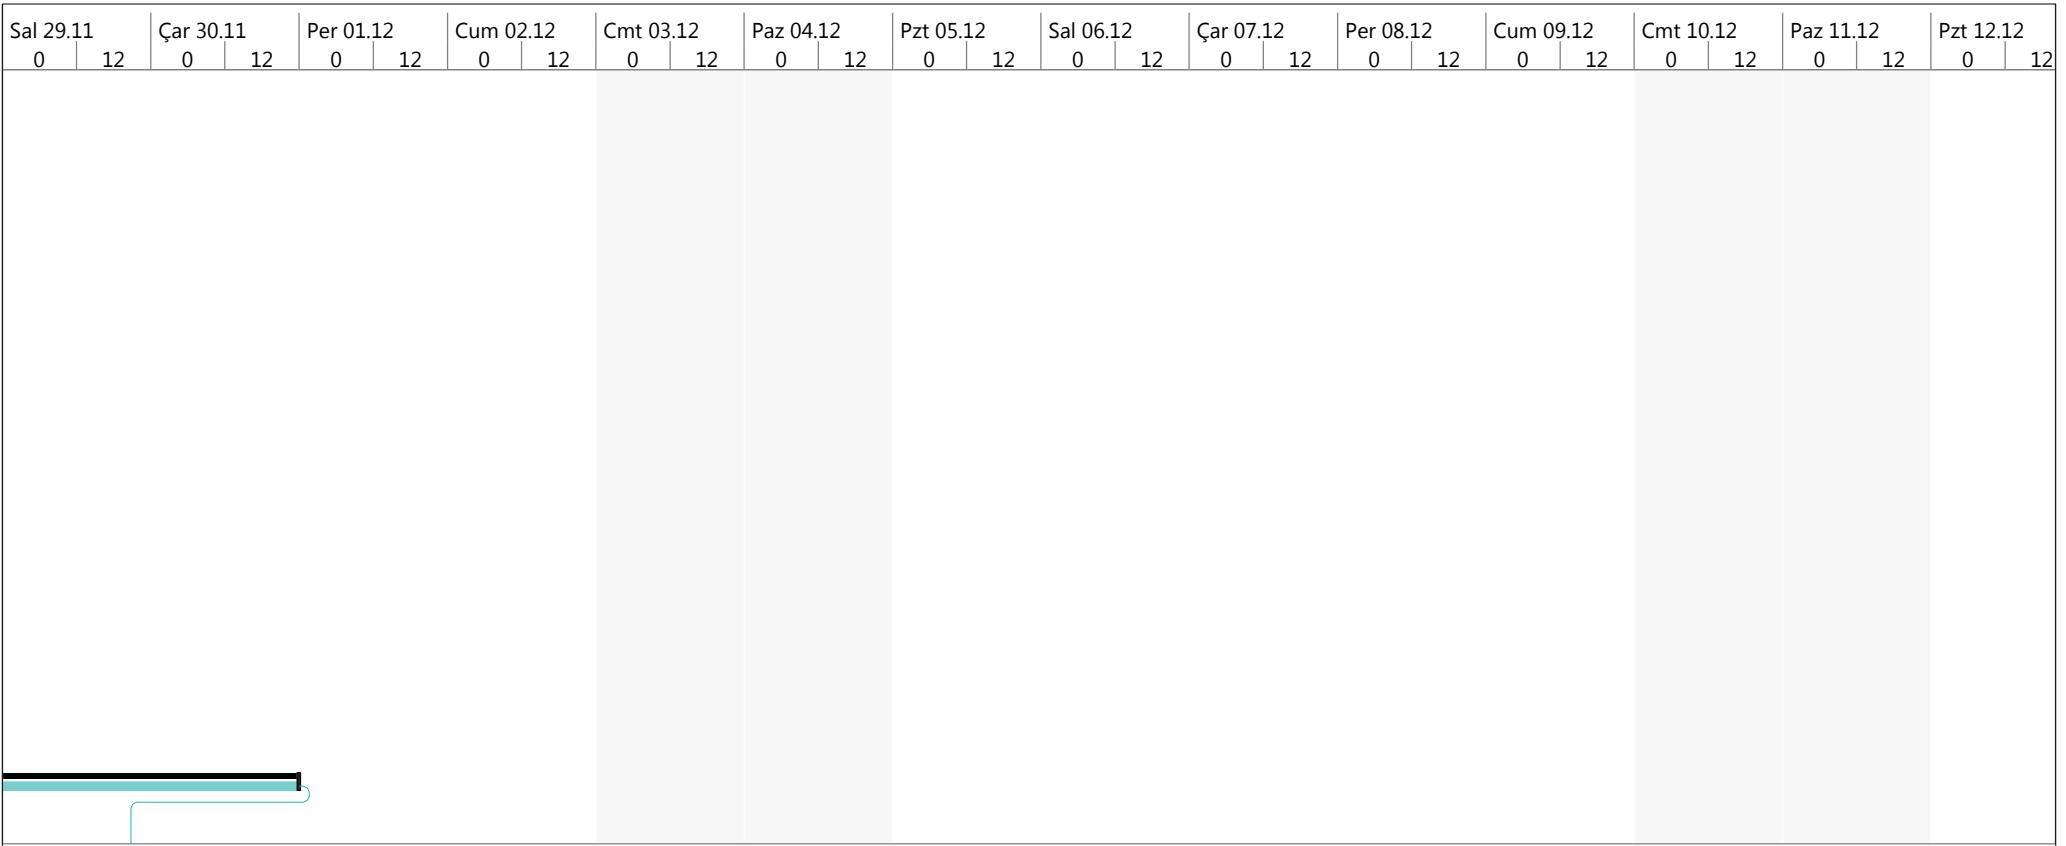


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

A Gantt chart illustrating a timeline from Saturday, November 29, to Sunday, December 1. The chart is divided into 24-hour segments by vertical grid lines at 0 and 12 hours. A thick black horizontal bar spans the entire width of the chart, starting from the 0-hour mark on Saturday. Below this black bar, there are seven thin red horizontal bars, each representing a different task or activity. These red bars are positioned at various heights between the 0 and 12-hour marks. The chart uses a light gray background with white grid lines for the hours.

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



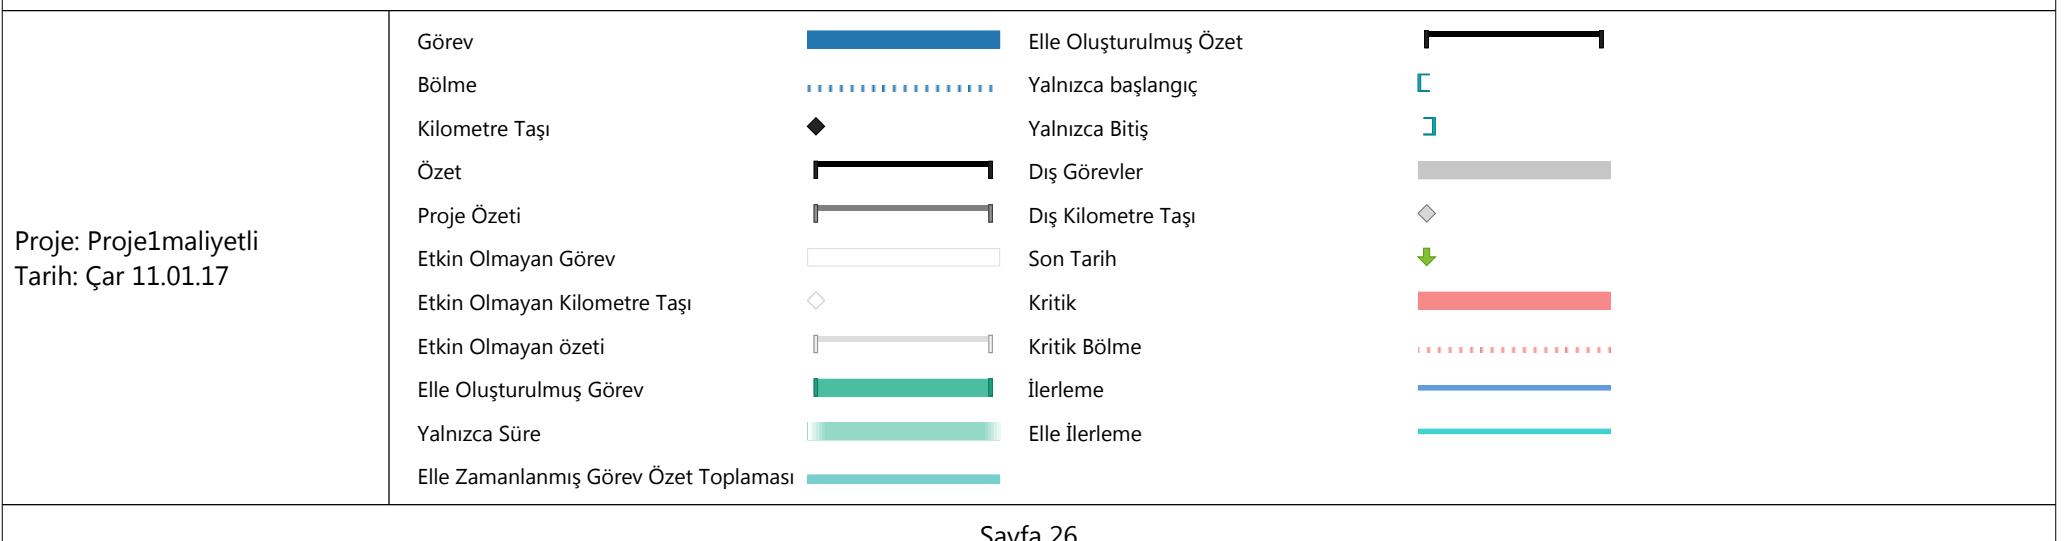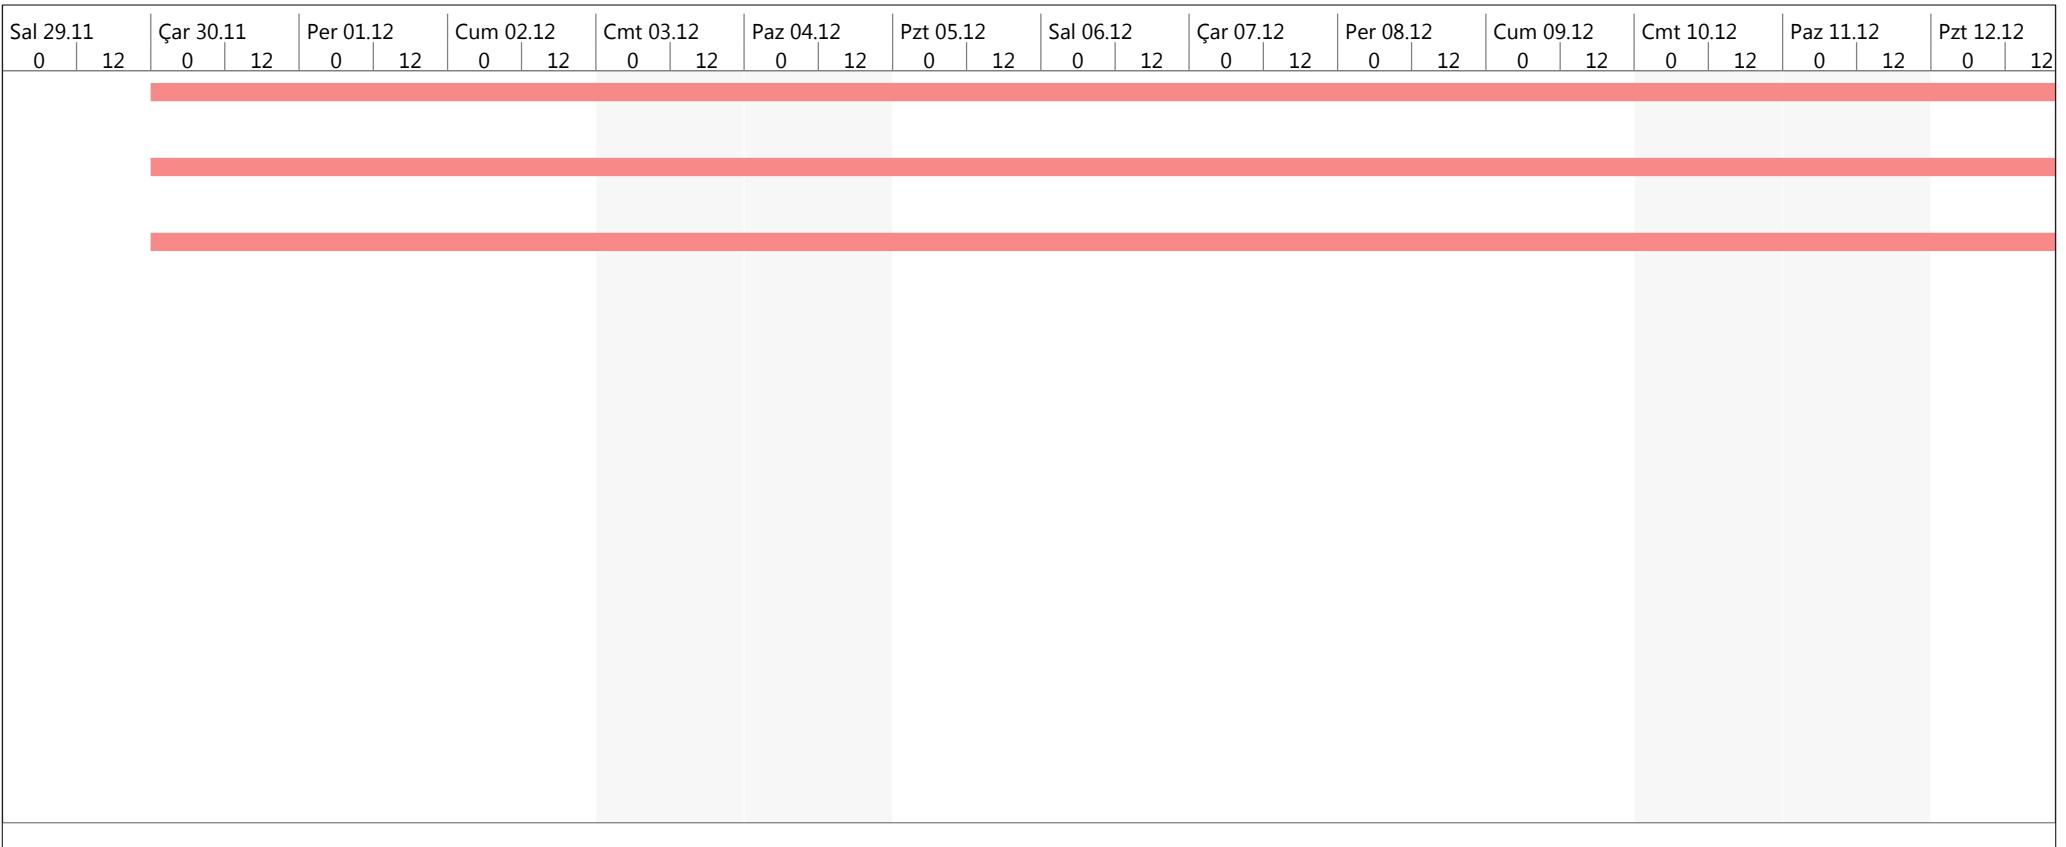

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sal 29.11 0 | Çar 30.11 12 | Per 01.12 0 | Cum 02.12 12 | Cmt 03.12 0 | Paz 04.12 12 | Pzt 05.12 0 | Sal 06.12 12 | Çar 07.12 0 | Per 08.12 12 | Cum 09.12 0 | Cmt 10.12 0 | Paz 11.12 0 | Pzt 12.12 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|
| Sal 29.11 0 | 12 | | Çar 30.11 0 | 12 | | Per 01.12 0 | 12 | | Cum 02.12 0 | 12 | | Cmt 03.12 0 | 12 | | Paz 04.12 0 | 12 | | Pzt 05.12 0 | 12 | | Sal 06.12 0 | 12 | | Çar 07.12 0 | 12 | | Per 08.12 0 | 12 | | Cum 09.12 0 | 12 | | Cmt 10.12 0 | 12 | | Paz 11.12 0 | 12 | | Pzt 12.12 0 | 12 |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 12 12 | Sal 13.12 0 | Çar 14.12 12 | Per 15.12 0 | Cum 16.12 12 | Cmt 17.12 0 | Paz 18.12 12 | Pzt 19.12 0 | Sal 20.12 12 | Çar 21.12 0 | Per 22.12 12 | Cum 23.12 0 | Cmt 24.12 12 | Paz 25.12 0 | Pzt 2 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-------|
| 12 | Sal 13.12 | 12 | Çar 14.12 | 12 | Per 15.12 | 0 | Cum 16.12 | 0 | Cmt 17.12 | 12 | Paz 18.12 | 0 | Pzt 19.12 | 12 | Sal 20.12 | 0 | Çar 21.12 | 12 | Per 22.12 | 0 | Cum 23.12 | 12 | Cmt 24.12 | 0 | Paz 25.12 | 12 | Pzt 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

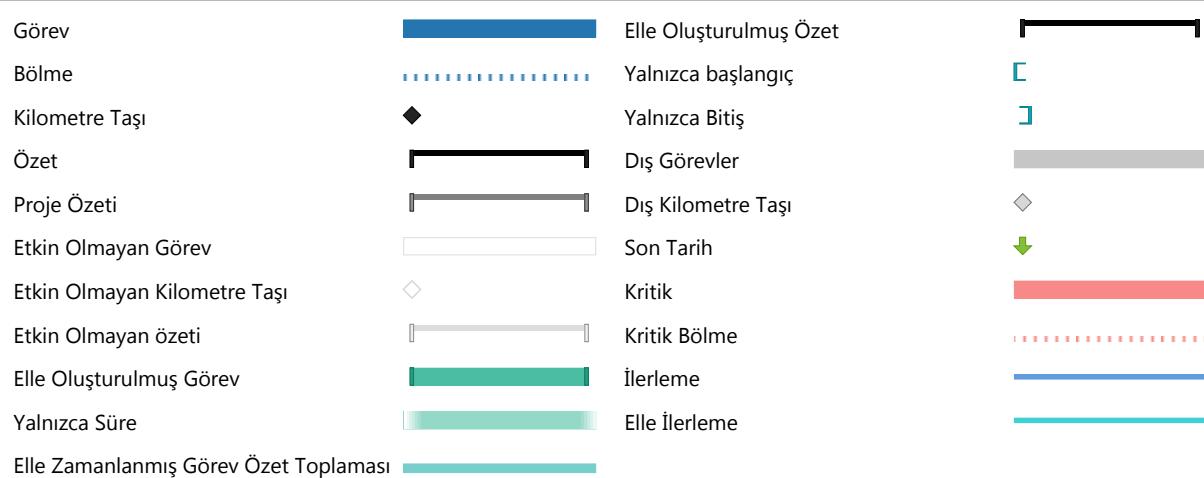


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-------|
| 12 | Sal 13.12 | 12 | Çar 14.12 | 12 | Per 15.12 | 0 | Cum 16.12 | 0 | Cmt 17.12 | 12 | Paz 18.12 | 0 | Pzt 19.12 | 12 | Sal 20.12 | 0 | Çar 21.12 | 12 | Per 22.12 | 0 | Cum 23.12 | 12 | Cmt 24.12 | 0 | Paz 25.12 | 12 | Pzt 2 |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 12 12 | Sal 13.12 0 | Çar 14.12 12 | Per 15.12 0 | Cum 16.12 12 | Cmt 17.12 0 | Paz 18.12 12 | Pzt 19.12 0 | Sal 20.12 12 | Çar 21.12 0 | Per 22.12 0 | Cum 23.12 12 | Cmt 24.12 0 | Paz 25.12 0 | Pzt 2 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

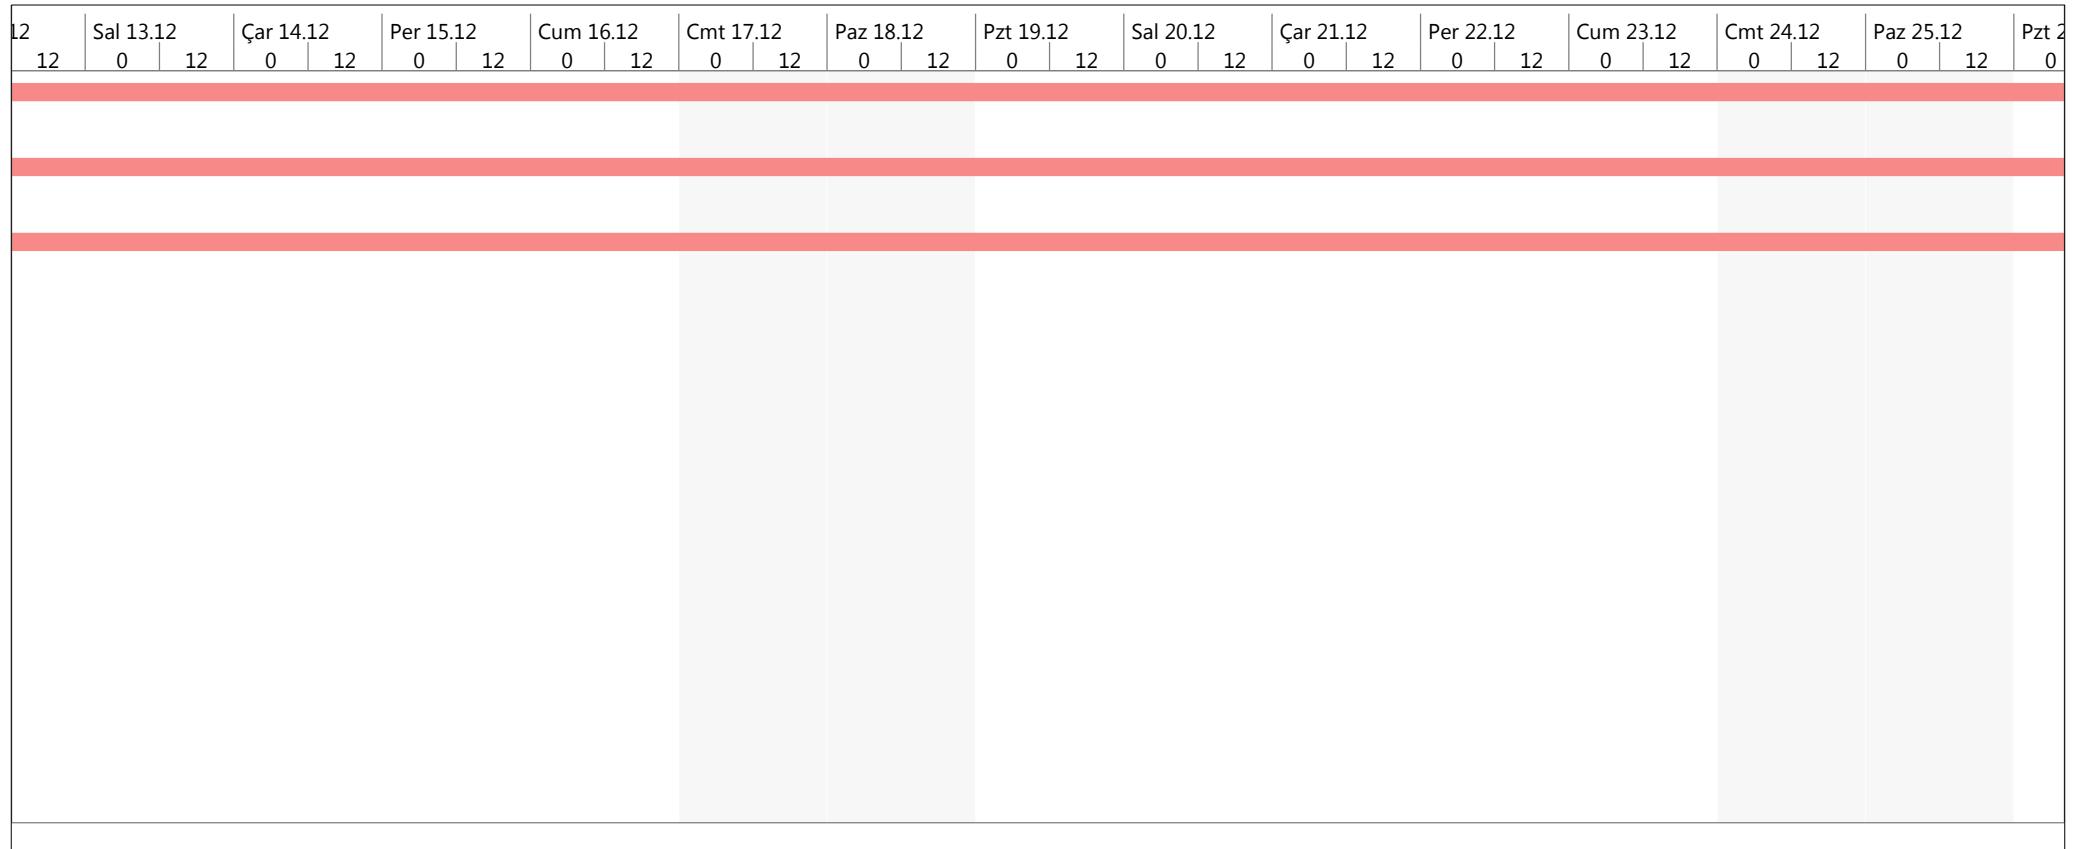

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

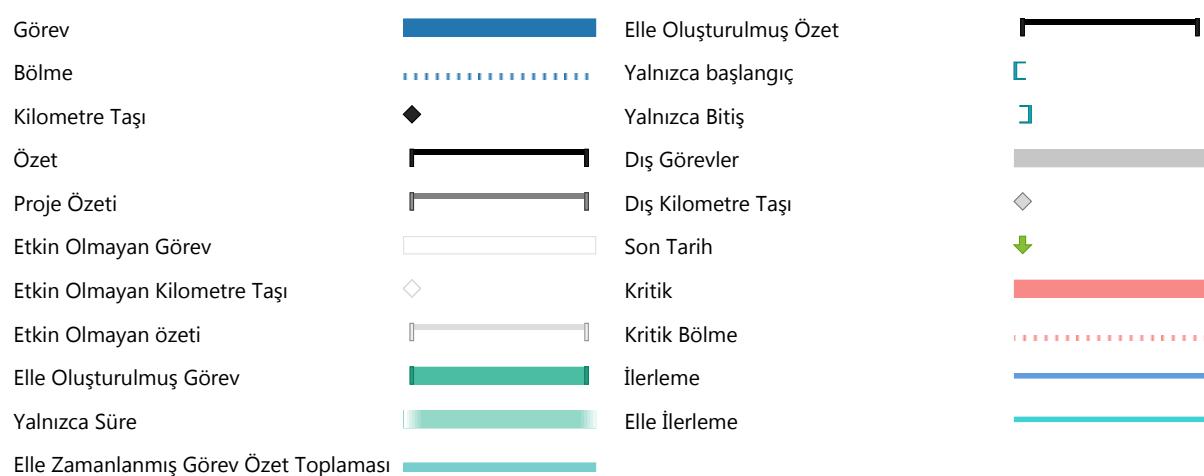


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-----------|---|-----------|----|-------|
| 12 | Sal 13.12 | 12 | Çar 14.12 | 12 | Per 15.12 | 0 | Cum 16.12 | 0 | Cmt 17.12 | 12 | Paz 18.12 | 0 | Pzt 19.12 | 12 | Sal 20.12 | 0 | Çar 21.12 | 12 | Per 22.12 | 0 | Cum 23.12 | 12 | Cmt 24.12 | 0 | Paz 25.12 | 12 | Pzt 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 12 12 | Sal 13.12 0 | Çar 14.12 12 | Per 15.12 0 | Cum 16.12 0 | Cmt 17.12 0 | Paz 18.12 12 | Pzt 19.12 0 | Sal 20.12 12 | Çar 21.12 0 | Per 22.12 0 | Cum 23.12 0 | Cmt 24.12 0 | Paz 25.12 0 | Pzt 2 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

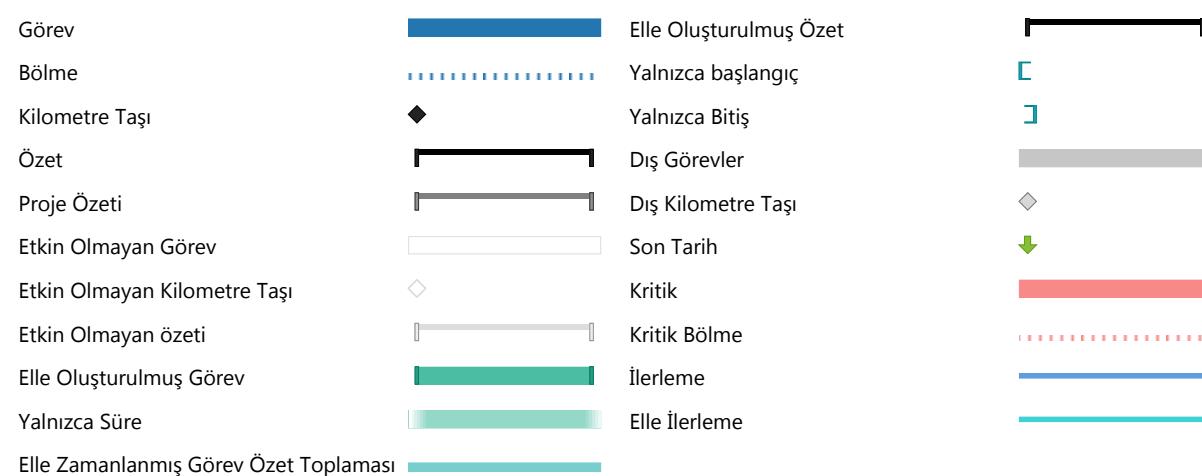


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Pzt 26.12 | 0 | 12 | Sal 27.12 | 0 | 12 | Çar 28.12 | 0 | 12 | Per 29.12 | 0 | 12 | Cum 30.12 | 0 | 12 | Cmt 31.12 | 0 | 12 | Paz 01.01 | 0 | 12 | Pzt 02.01 | 0 | 12 | Sal 03.01 | 0 | 12 | Çar 04.01 | 0 | 12 | Per 05.01 | 0 | 12 | Cum 06.01 | 0 | 12 | Cmt 07.01 | 0 | 12 | Paz 08.01 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|





| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pzt 26.12 0 | Sal 27.12 12 | Çar 28.12 0 | Per 29.12 12 | Cum 30.12 0 | Cmt 31.12 12 | Paz 01.01 0 | Pzt 02.01 12 | Sal 03.01 0 | Çar 04.01 12 | Per 05.01 0 | Cum 06.01 0 | Cmt 07.01 12 | Paz 08.01 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |


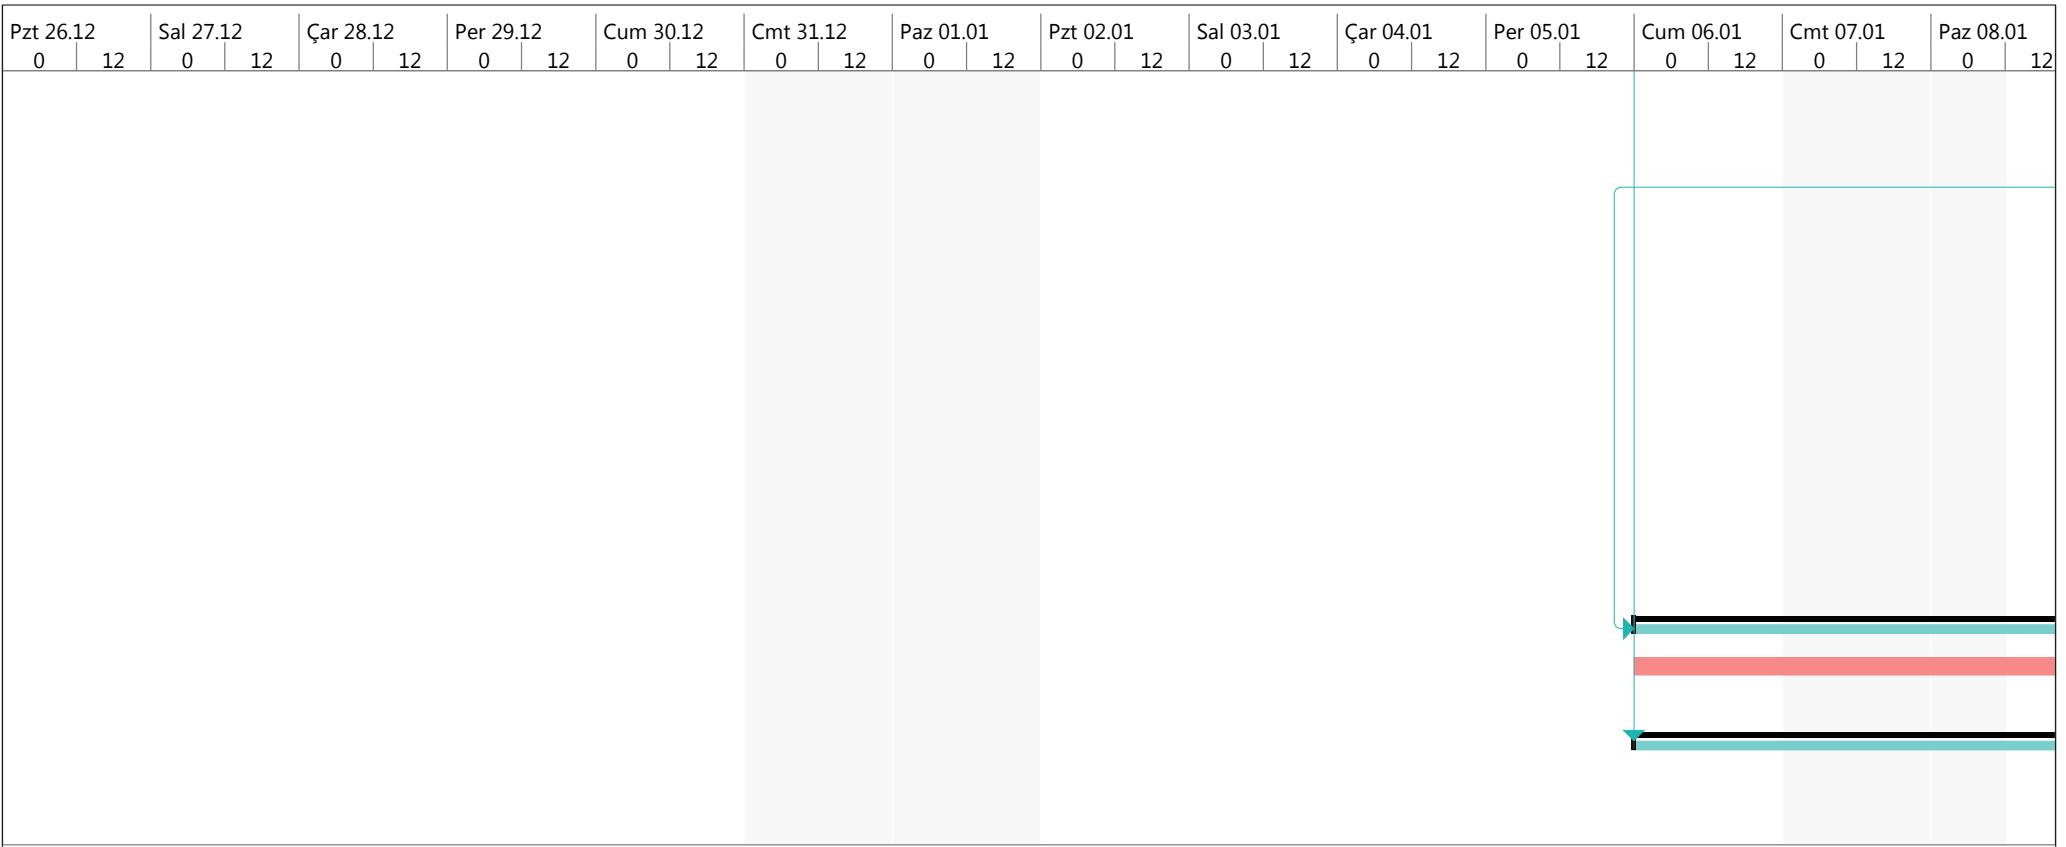


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

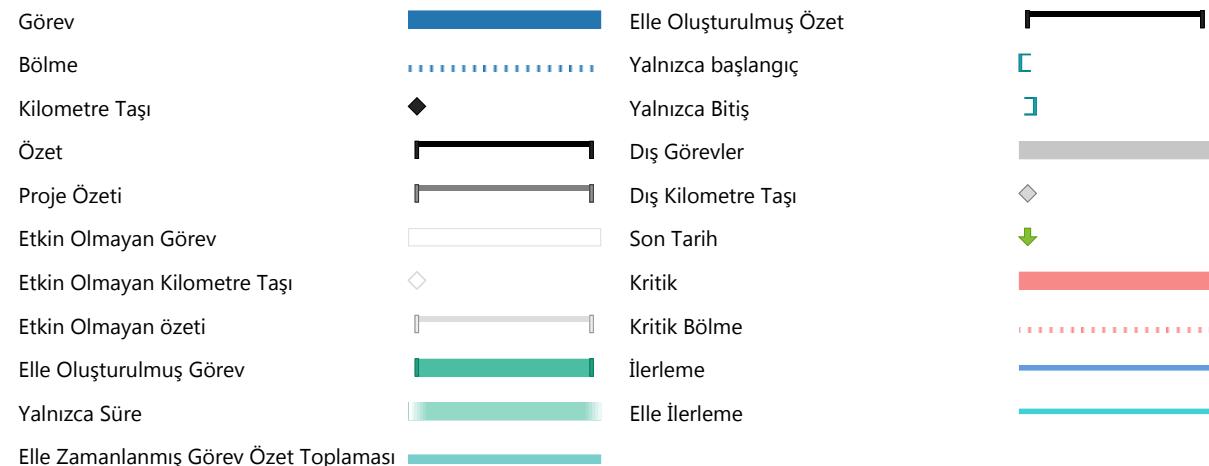

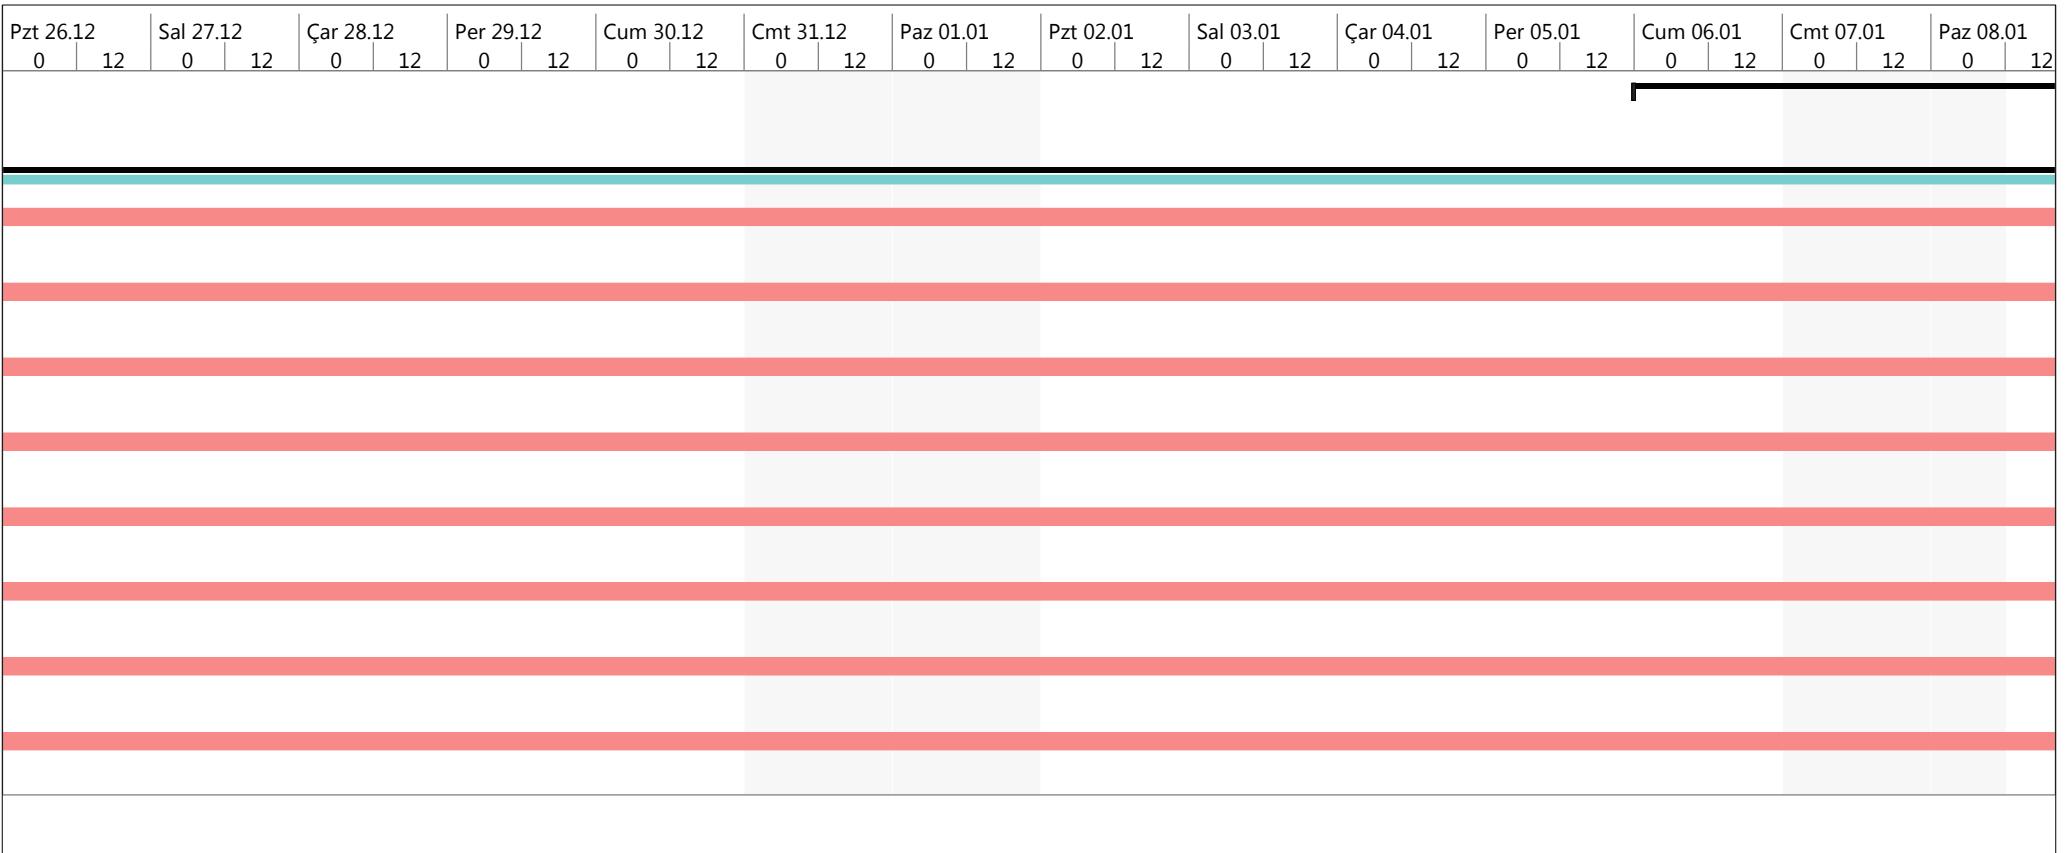

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| | Bölme | | Yalnızca Başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

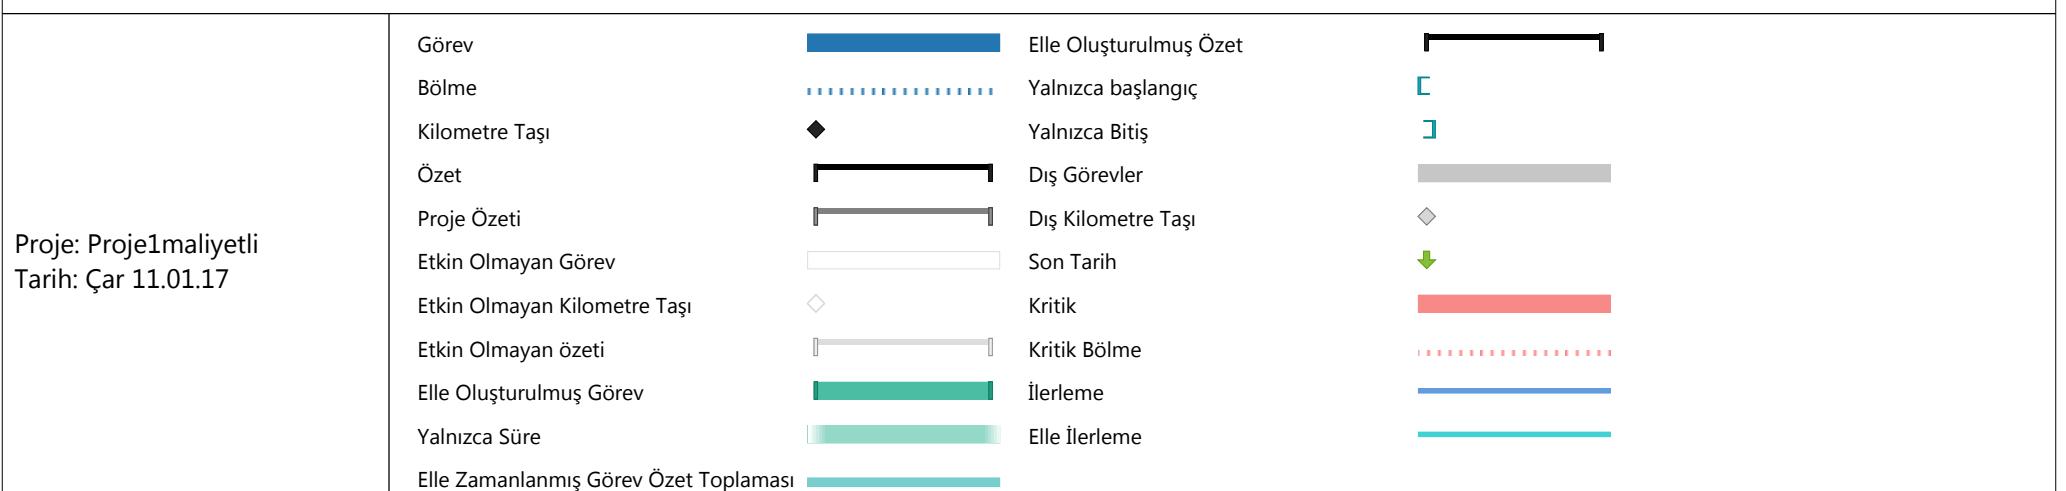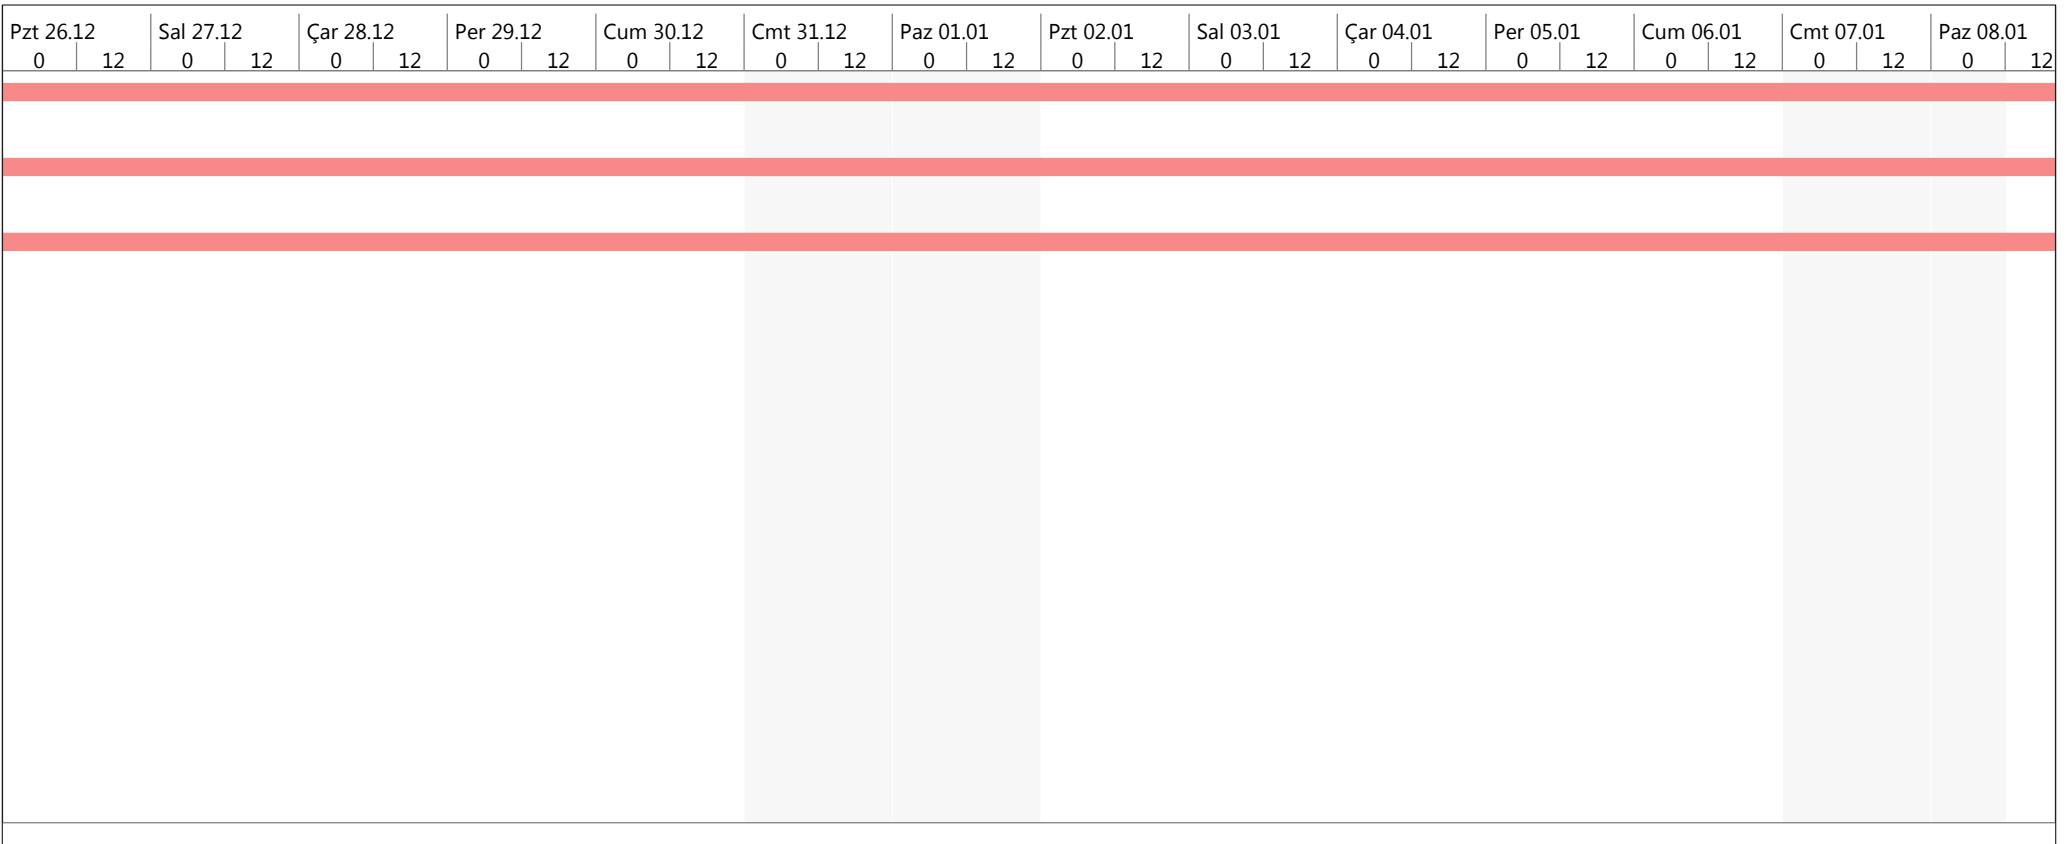


| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pzt 26.12 0 | Sal 27.12 12 | Çar 28.12 0 | Per 29.12 12 | Cum 30.12 0 | Cmt 31.12 12 | Paz 01.01 0 | Pzt 02.01 12 | Sal 03.01 0 | Çar 04.01 12 | Per 05.01 0 | Cum 06.01 0 | Cmt 07.01 12 | Paz 08.01 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pzt 26.12 0 | Sal 27.12 12 | Çar 28.12 0 | Per 29.12 12 | Cum 30.12 0 | Cmt 31.12 12 | Paz 01.01 0 | Pzt 02.01 12 | Sal 03.01 0 | Çar 04.01 12 | Per 05.01 0 | Cum 06.01 0 | Cmt 07.01 12 | Paz 08.01 12 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|



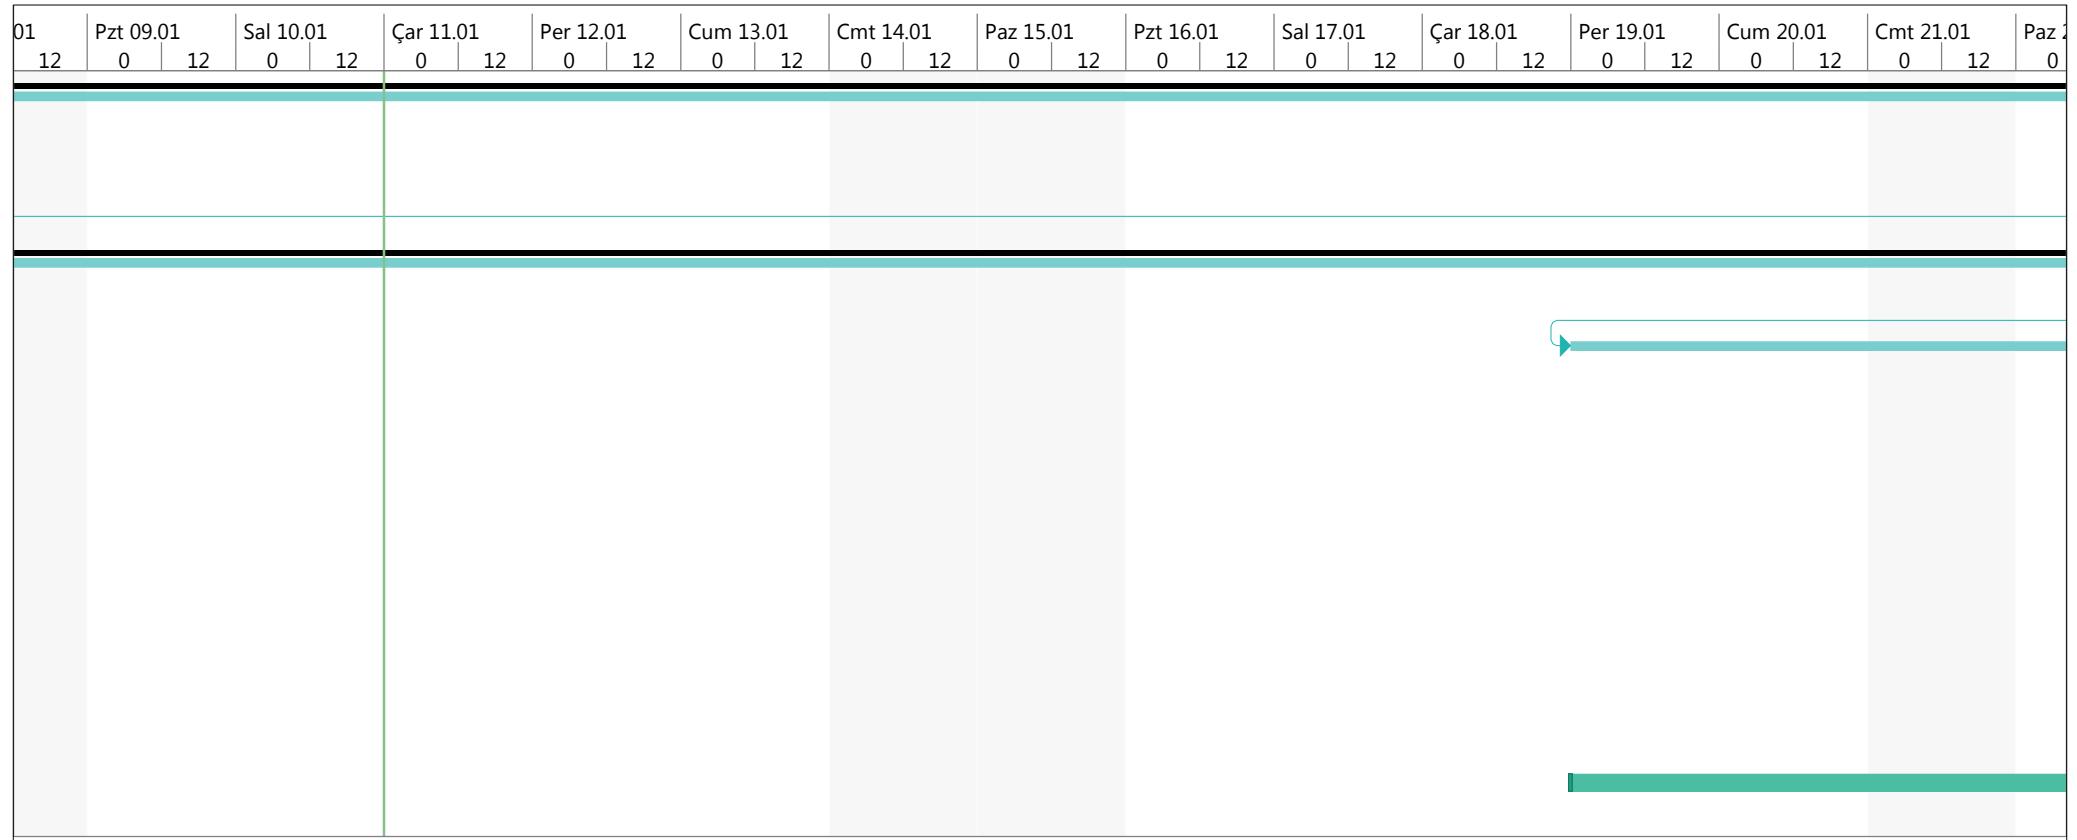


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|
| | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | ♦ | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | ◇ | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özet | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 01 12 | Pzt 09.01 0 | Sal 10.01 12 | Çar 11.01 0 | Per 12.01 12 | Cum 13.01 0 | Cmt 14.01 12 | Paz 15.01 0 | Pzt 16.01 12 | Sal 17.01 0 | Çar 18.01 12 | Per 19.01 0 | Cum 20.01 12 | Cmt 21.01 0 | Paz 22.01 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

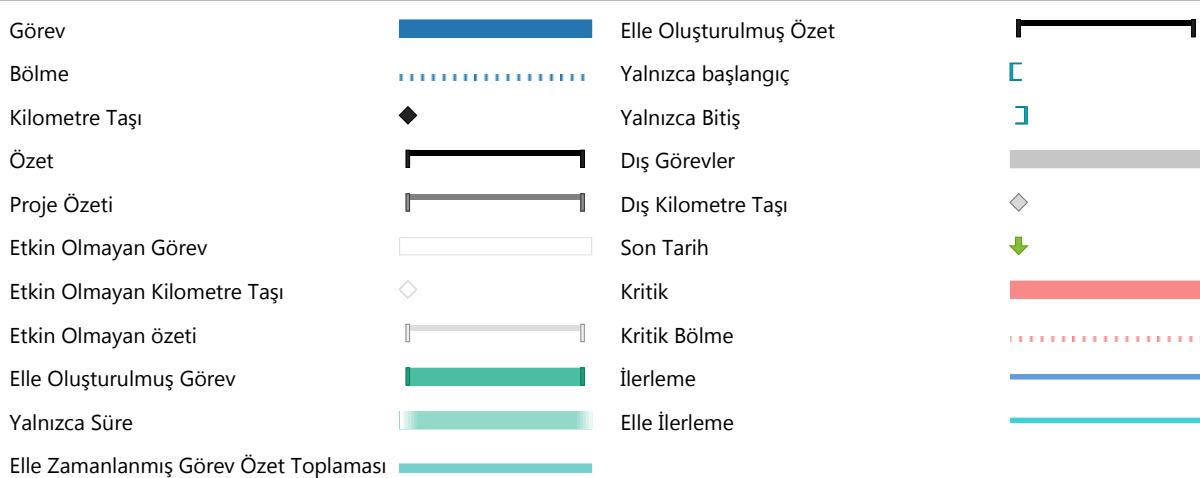

The Gantt chart displays the status of various project tasks over a 21-day period. The tasks are categorized by color and duration:


- Black:** Elle Oluşturulmuş Özeti (Completed Summary), Dış Görevler (External Tasks), Dış Kilometre Taşı (External Kilometer Stone), Son Tarih (Last Date), Kritik (Critical), Kritik Bölme (Critical Block), İlerleme (Progress), Elle İlerleme (Own Progress).
- Red:** Yalnızca Başlangıç (Only Start), Yalnızca Bitiş (Only End), Etkin Olmayan Görev (Inactive Task), Etkin Olmayan Kilometre Taşı (Inactive Kilometer Stone), Etkin Olmayan özeti (Inactive Summary), Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması (Time-Scheduled Task Summary Total).
- Green:** Elle Oluşturulmuş Görev (Completed Task), Yalnızca Süre (Only Duration).
- Blue:** Proje Özeti (Project Summary), Kilometre Taşı (Kilometer Stone).

Legend:


- Görev (Task)
- Bölme (Block)
- Kilometre Taşı (Kilometer Stone)
- Özet (Summary)
- Proje Özeti (Project Summary)
- Etkin Olmayan Görev (Inactive Task)
- Etkin Olmayan Kilometre Taşı (Inactive Kilometer Stone)
- Etkin Olmayan özeti (Inactive Summary)
- Elle Oluşturulmuş Görev (Completed Task)
- Yalnızca Süre (Only Duration)
- Elle Oluşturulmuş Özeti (Completed Summary)
- Yalnızca Başlangıç (Only Start)
- Yalnızca Bitiş (Only End)
- Dış Görevler (External Tasks)
- Dış Kilometre Taşı (External Kilometer Stone)
- Son Tarih (Last Date)
- Kritik (Critical)
- Kritik Bölme (Critical Block)
- İlerleme (Progress)
- Elle İlerleme (Own Progress)


Project Information:

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

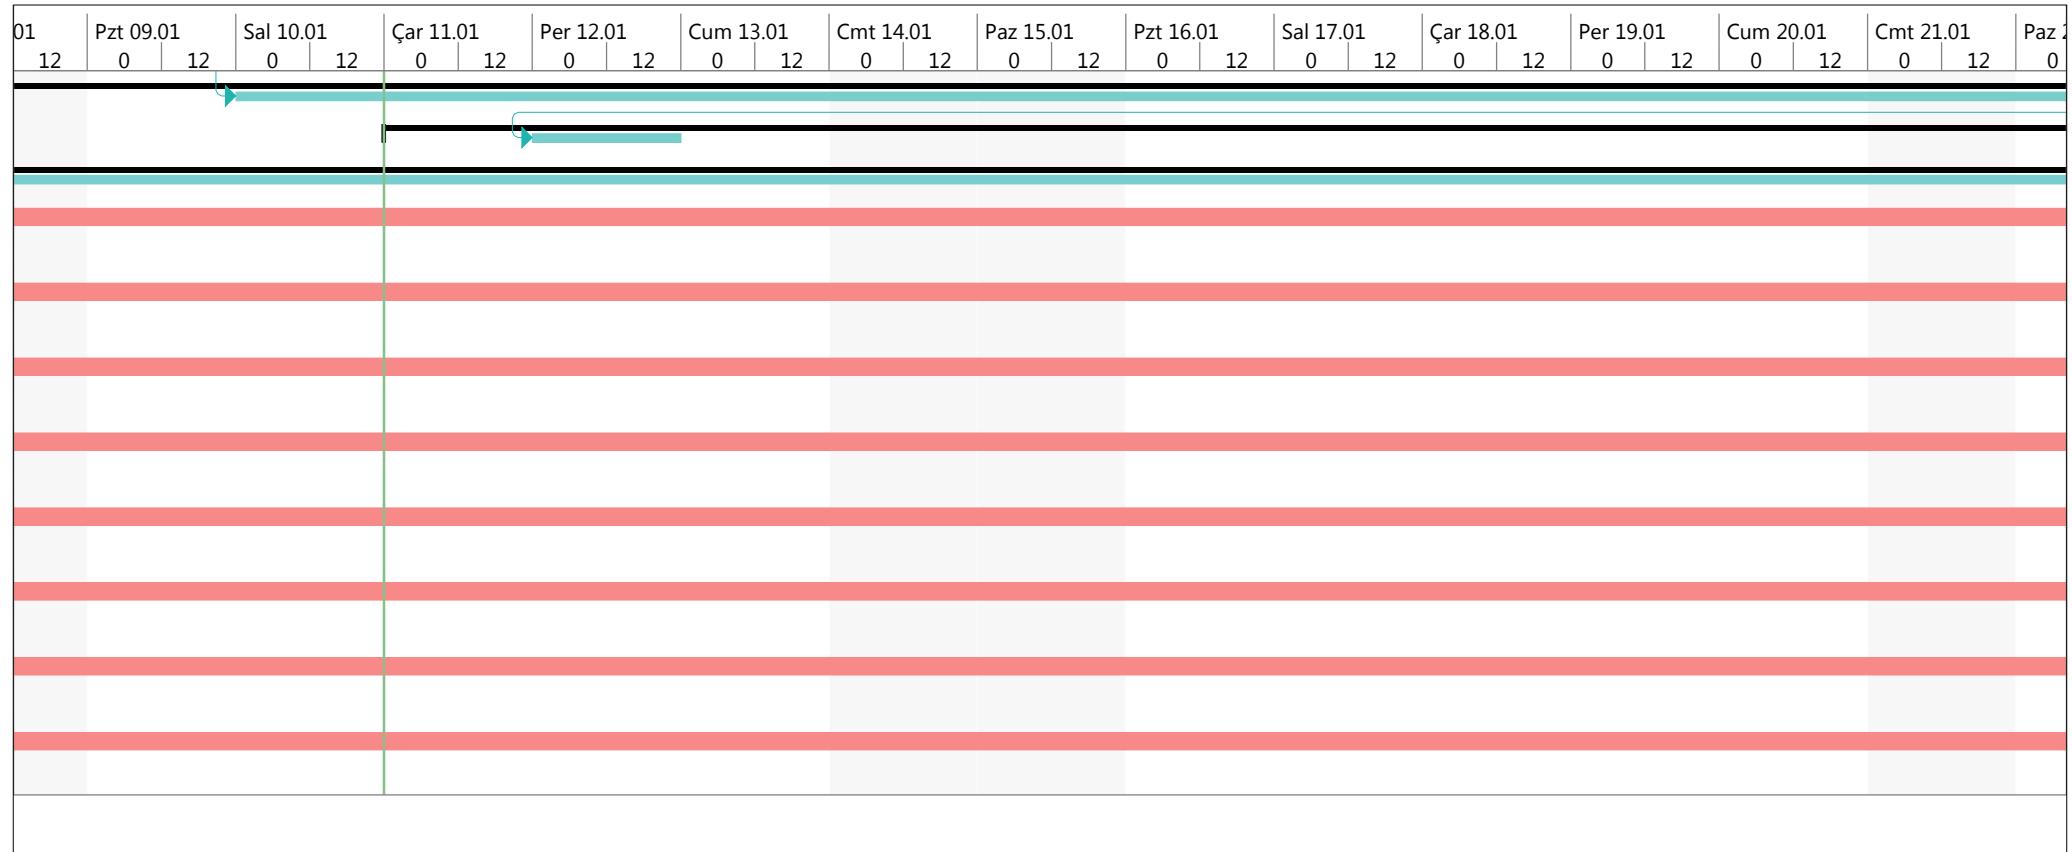

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

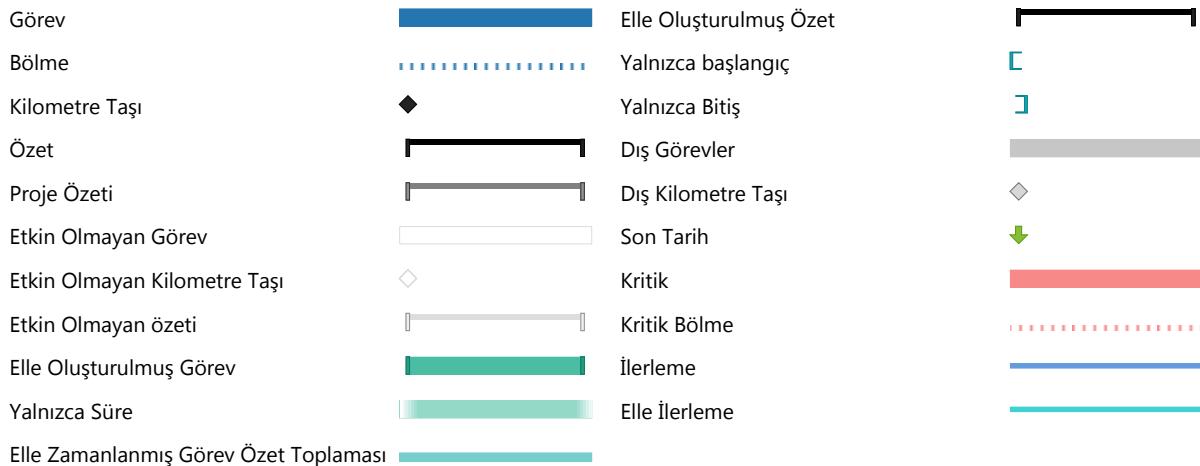

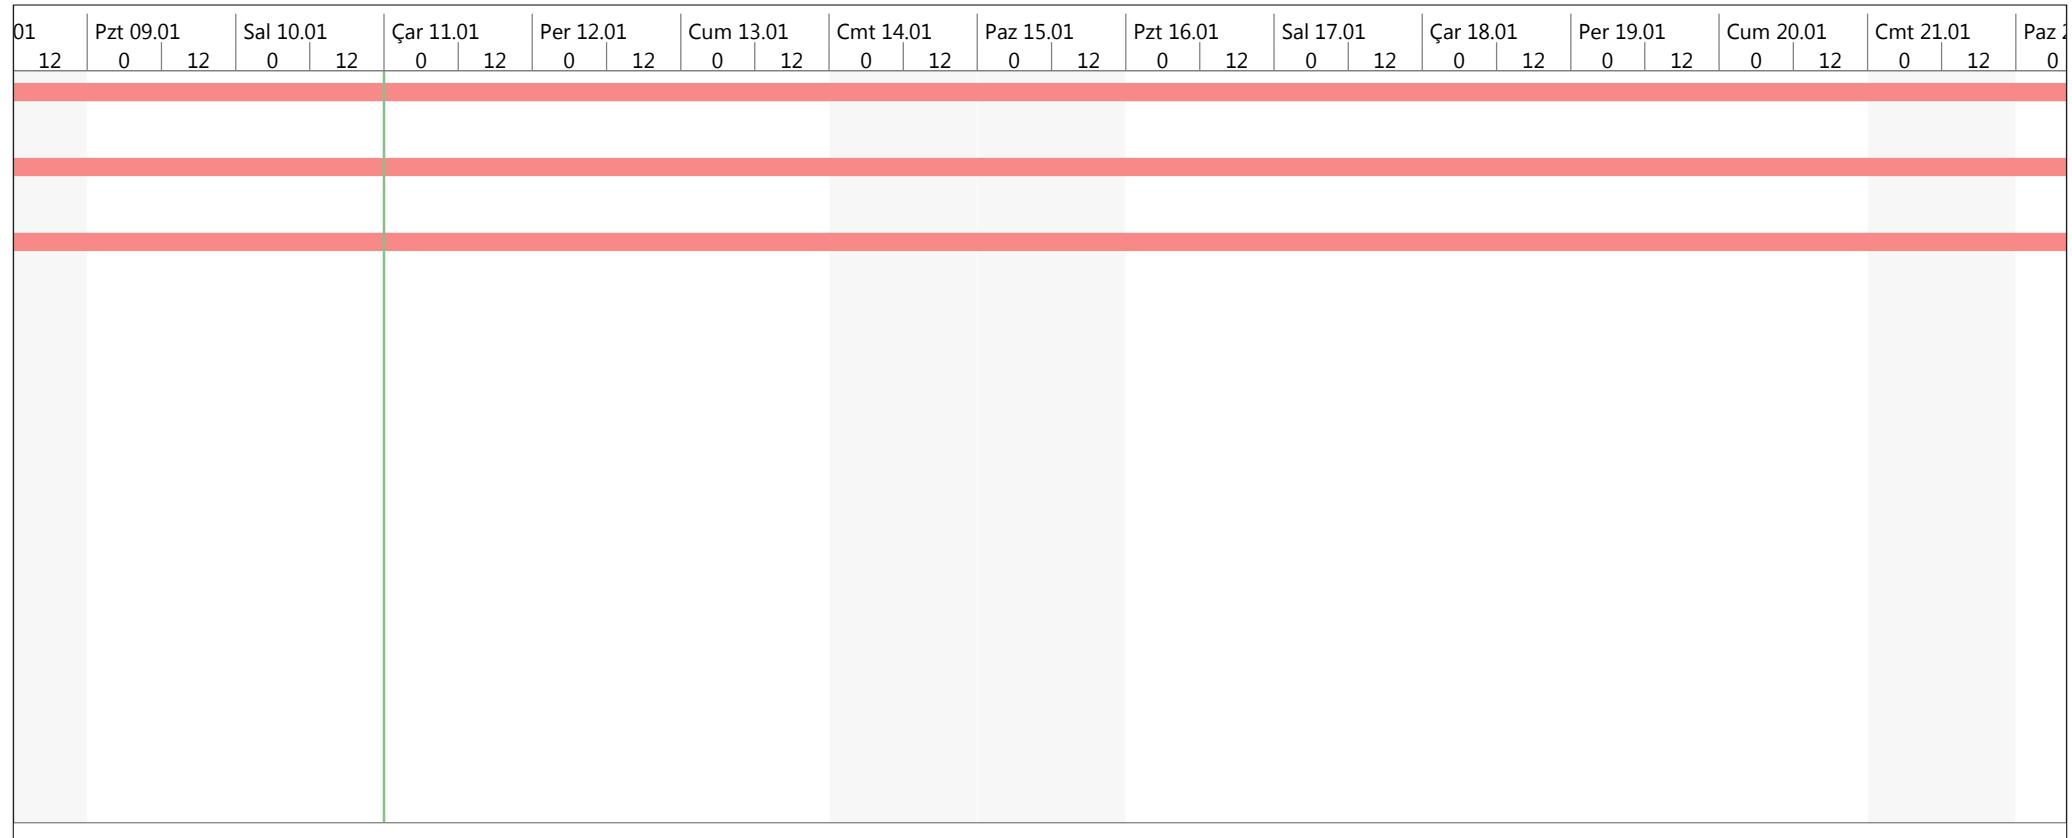


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 01 12 | Pzt 09.01 0 | Sal 10.01 12 | Çar 11.01 0 | Per 12.01 12 | Cum 13.01 0 | Cmt 14.01 12 | Paz 15.01 0 | Pzt 16.01 12 | Sal 17.01 0 | Çar 18.01 12 | Per 19.01 0 | Cum 20.01 12 | Cmt 21.01 0 | Paz 22.01 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|

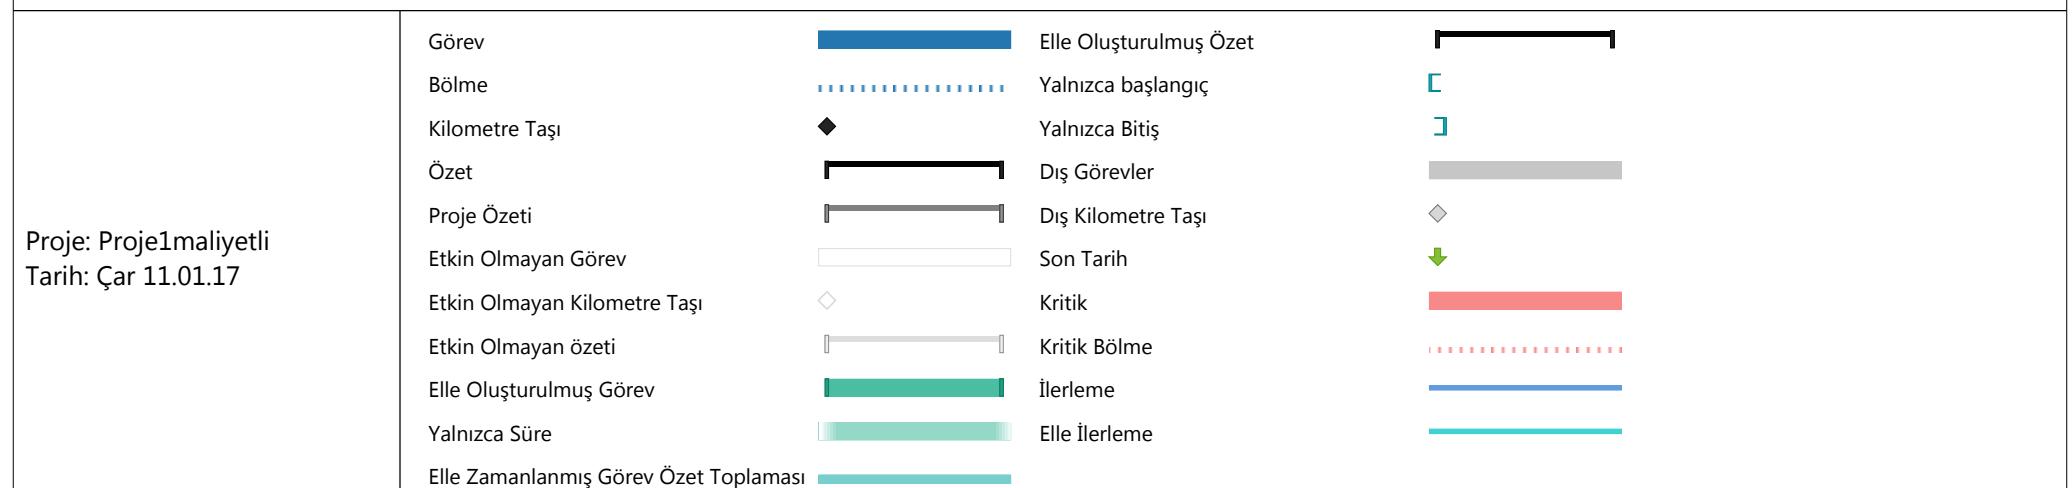

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Paz 22.01 0 | Pzt 23.01 0 | Sal 24.01 12 | Çar 25.01 0 | Per 26.01 12 | Cum 27.01 0 | Cmt 28.01 12 | Paz 29.01 0 | Pzt 30.01 12 | Sal 31.01 0 | Çar 01.02 12 | Per 02.02 0 | Cum 03.02 12 | Cmt 04.02 0 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

GESER PAREX A.Ş Satın Alma Departmanı;isi- Ses Yalıtım Sivası - Camlı Sıva 1PKT T32[1.320]

Valiodor Classic VDM ATLANTİS YALITIMLI
EV OFİS CAM FİLMİ ISI YALITIMLI 75 CM * 1
VIKO CARMEN ANAHTAR BEYAZ/TV SONLU
VIKO KARE TOPRAKLı PRİZ ÇERÇEVE DAHİL
VİK MULTİ-LED 6lı Priz Anahtarlı,Topraklı, Ç
DIALL FLORASAN AMPUL E27 15/65 WATT)
Siyah Prestige Blackout Stor Perde[66]

İç Cephe Çalışanları;İnşaat Yöneticisi

Görev Elle Oluşturulmuş Özет

Bölme Yalnızca başlangıç

Kilometre Taşı ♦ Yalnızca Bitiş

Özet Dış Görevler

Proje Özeti Dış Kilometre Taşı

Etkin Olmayan Görev Son Tarih

Etkin Olmayan Kilometre Taşı ◇ Kritik

Etkin Olmayan özeti Kritik Bölme

Elle Oluşturulmuş Görev İlerleme



Yalnızca Süre Elle İlerleme


Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17




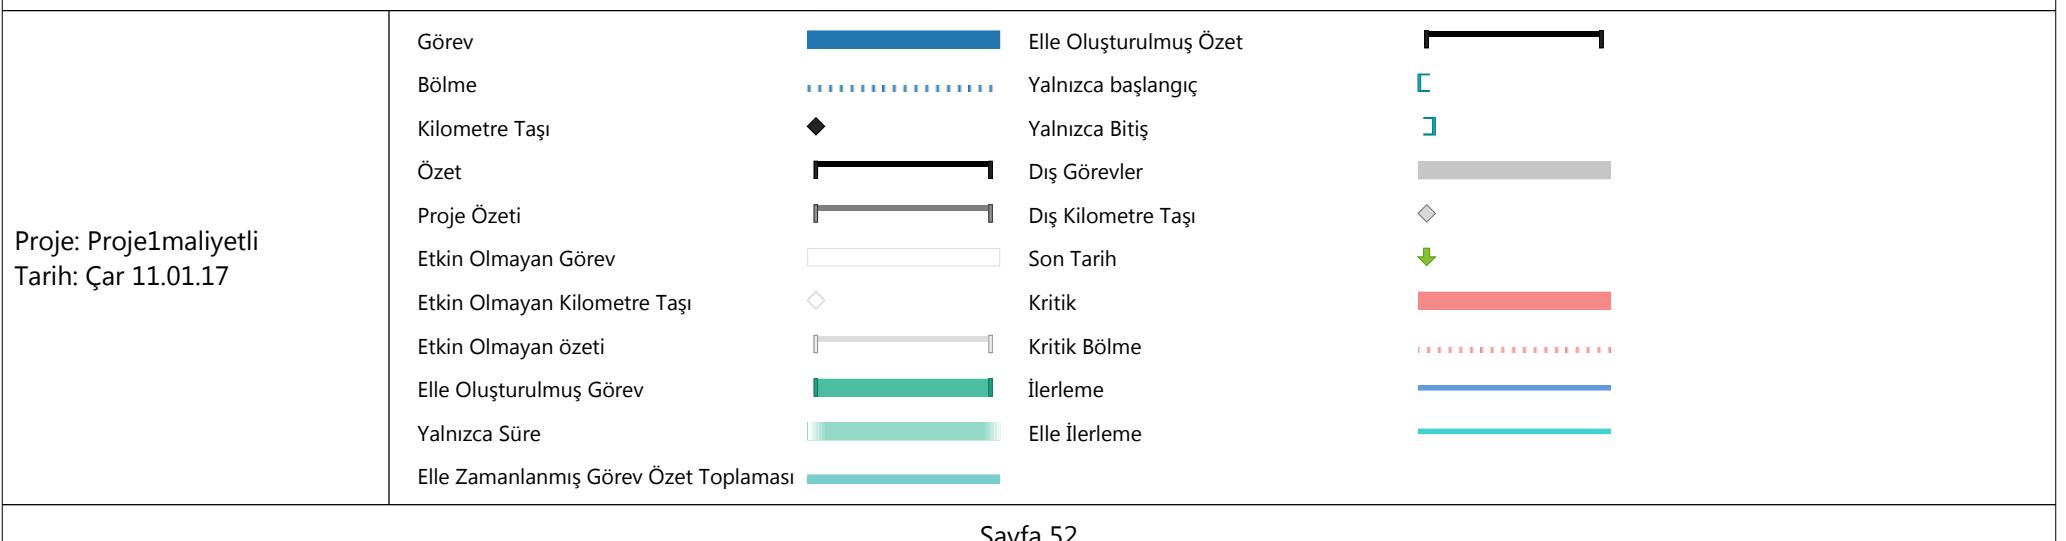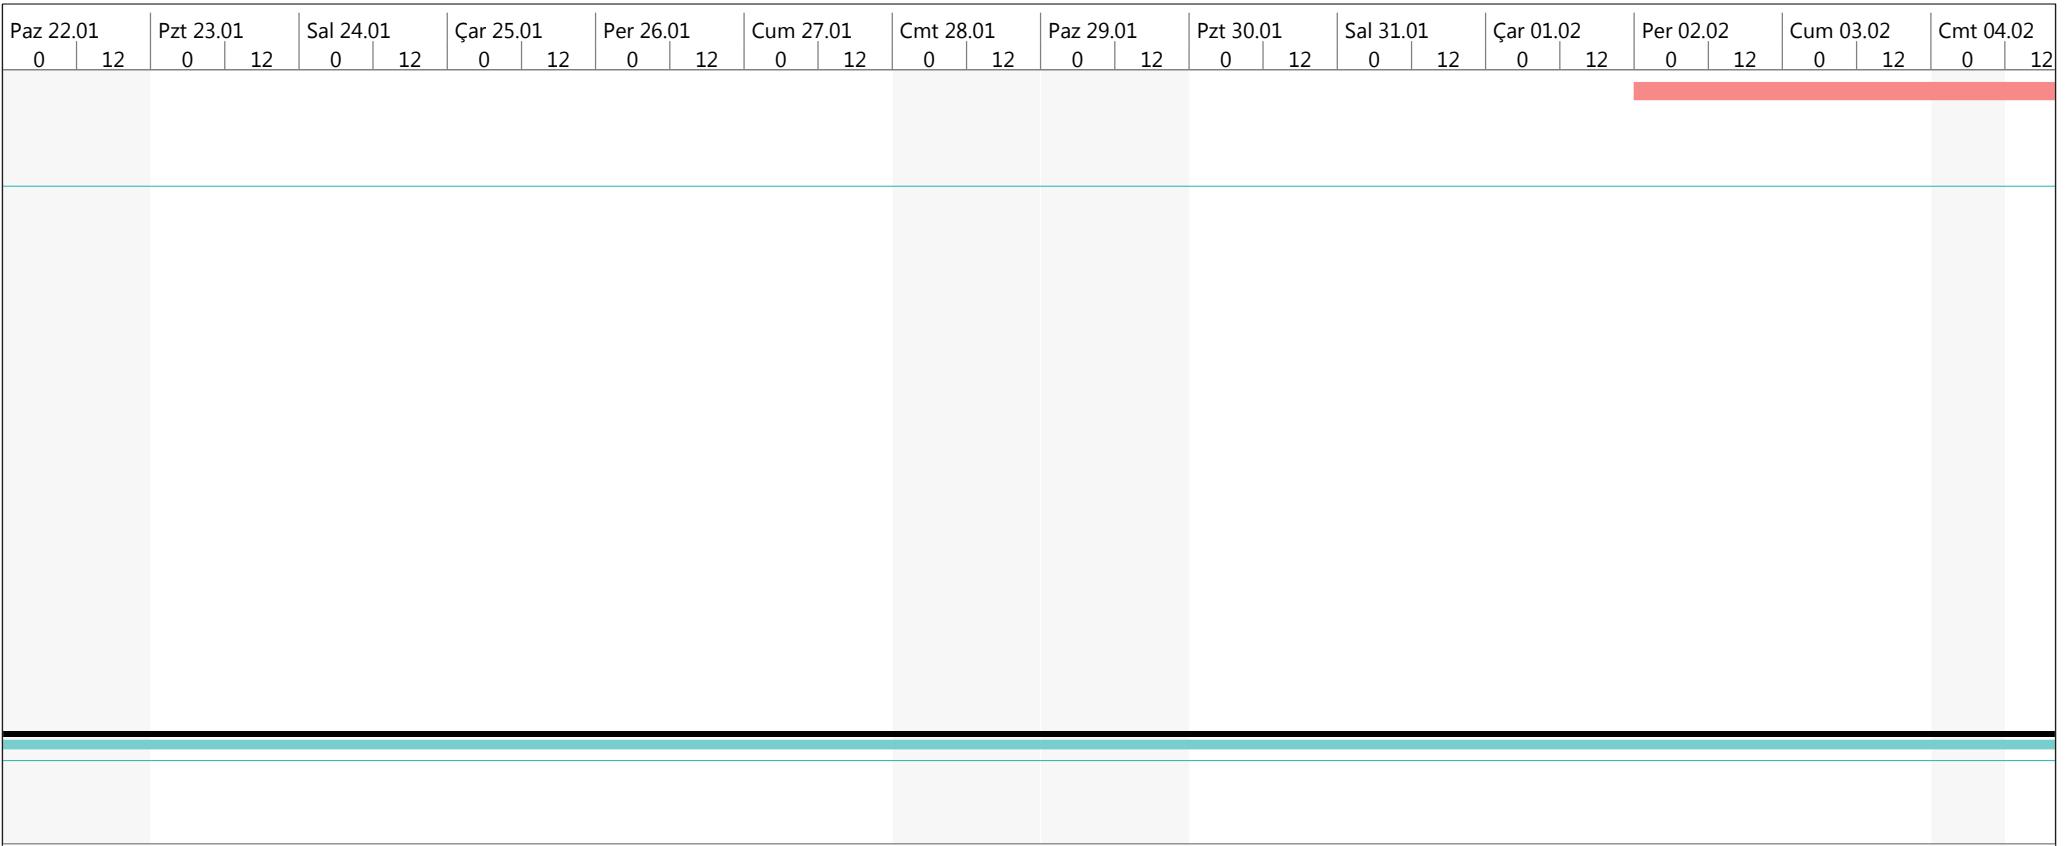

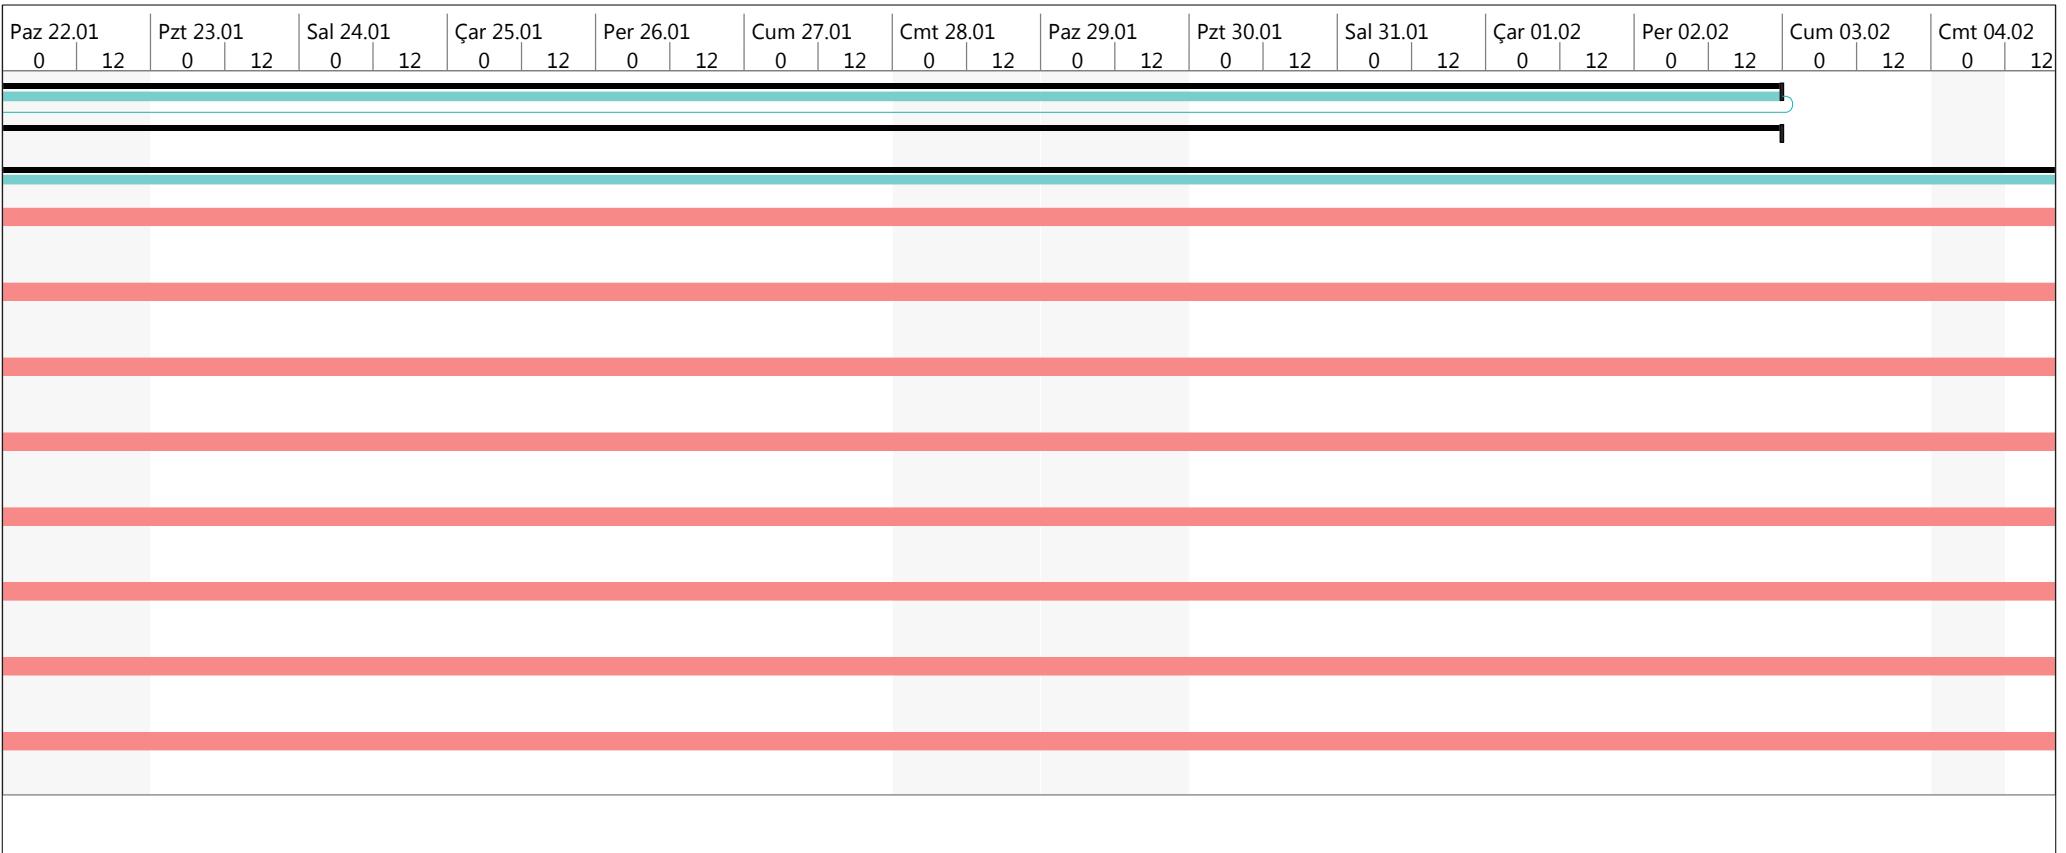

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

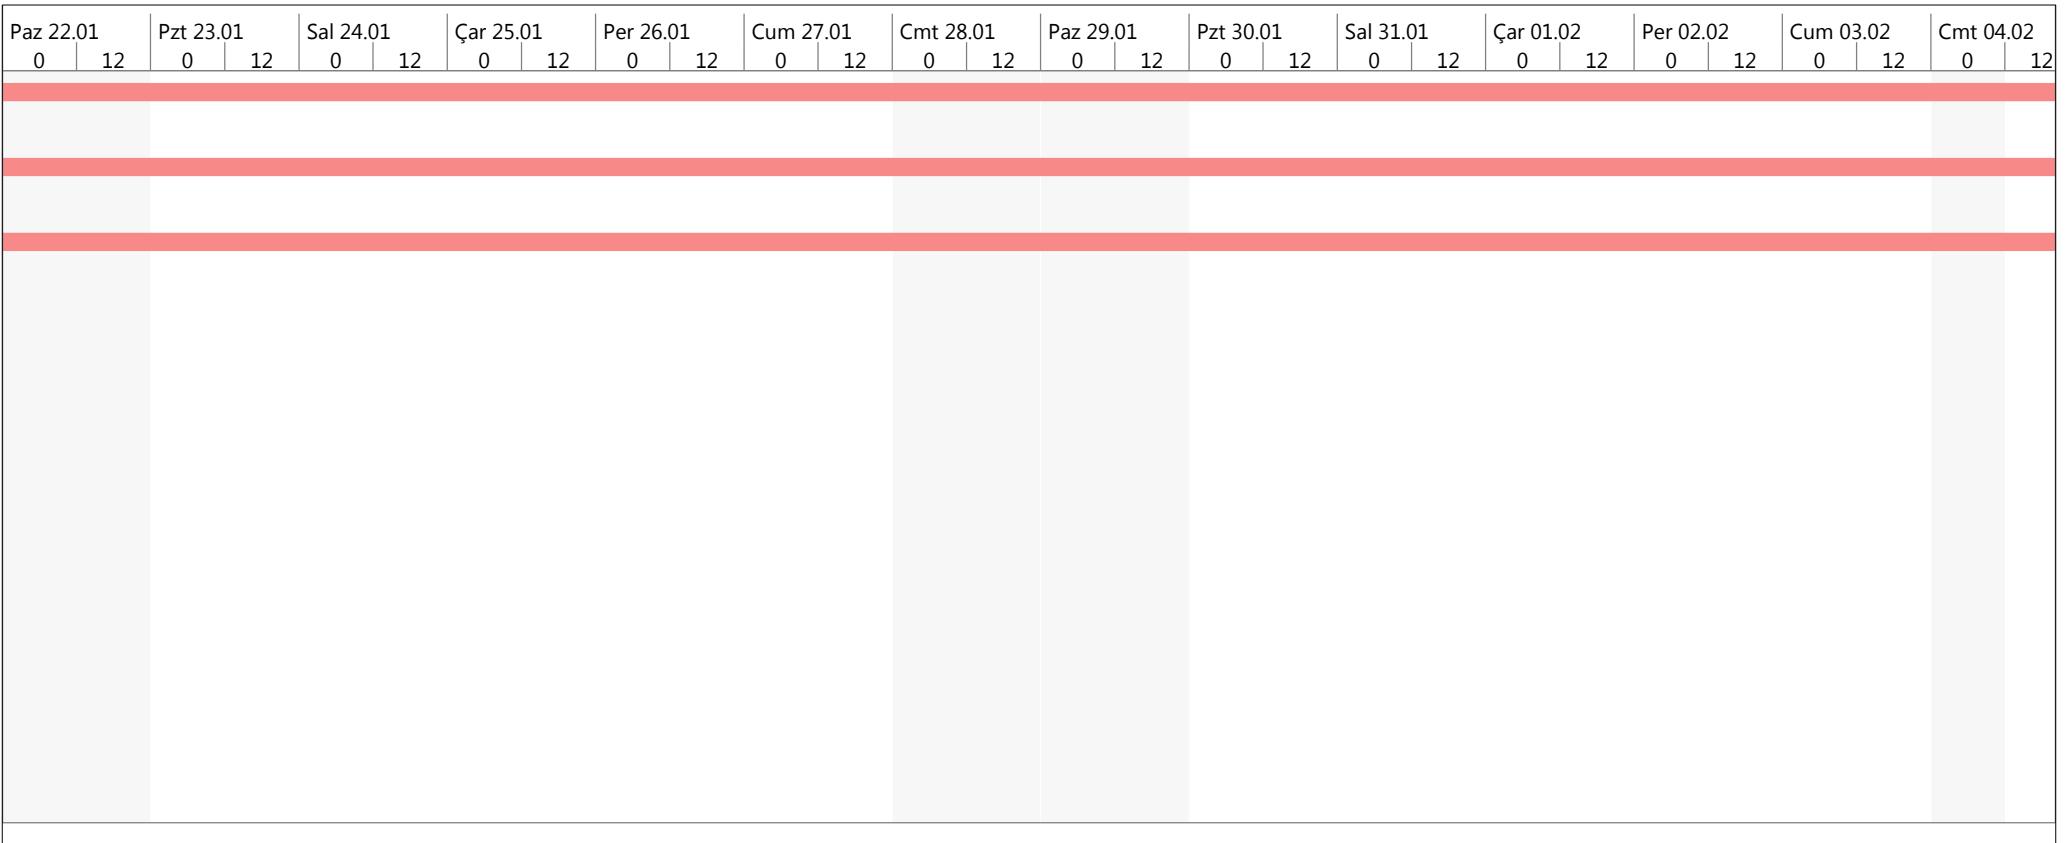

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 22.01 0 | Pzt 23.01 0 | Sal 24.01 0 | Çar 25.01 0 | Per 26.01 0 | Cum 27.01 0 | Cmt 28.01 0 | Paz 29.01 0 | Pzt 30.01 0 | Sal 31.01 0 | Çar 01.02 0 | Per 02.02 0 | Cum 03.02 0 | Cmt 04.02 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Paz 22.01 0 | Pzt 23.01 0 | Sal 24.01 12 | Çar 25.01 0 | Per 26.01 12 | Cum 27.01 0 | Cmt 28.01 12 | Paz 29.01 0 | Pzt 30.01 12 | Sal 31.01 0 | Çar 01.02 12 | Per 02.02 0 | Cum 03.02 12 | Cmt 04.02 0 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| .02 12 | Paz 05.02 0 | Pzt 06.02 12 | Sal 07.02 0 | Çar 08.02 0 | Per 09.02 12 | Cum 10.02 0 | Cmt 11.02 0 | Paz 12.02 12 | Pzt 13.02 0 | Sal 14.02 0 | Çar 15.02 0 | Per 16.02 12 | Cum 17.02 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|

İMLİ KAPI[22]

M * 10 MT[66]


ONLU[22]

AHİL[242]

İkili, Çocuk Korumalı KLEMENSLİ - Beyaz[176]


/ATT)[22]

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

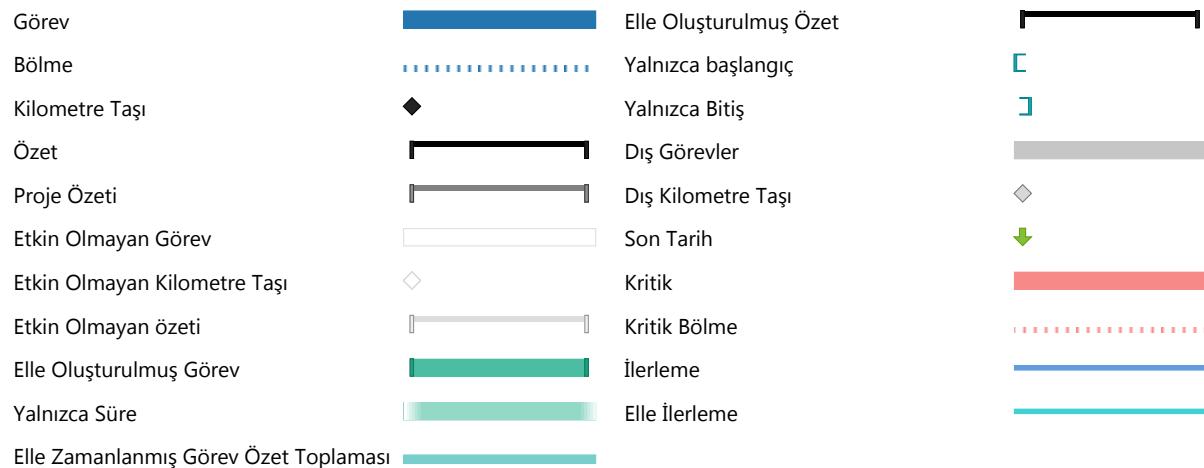


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .02 12 | Paz 05.02 0 | Pzt 06.02 0 | Sal 07.02 0 | Çar 08.02 0 | Per 09.02 0 | Cum 10.02 0 | Cmt 11.02 0 | Paz 12.02 0 | Pzt 13.02 0 | Sal 14.02 0 | Çar 15.02 0 | Per 16.02 0 | Cum 17.02 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|


Yöneticisi

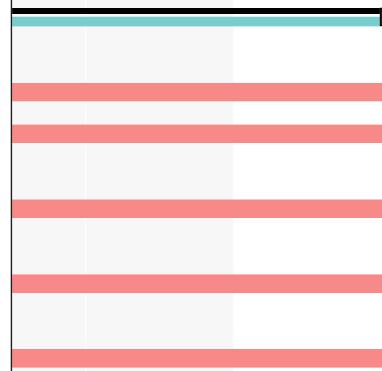


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

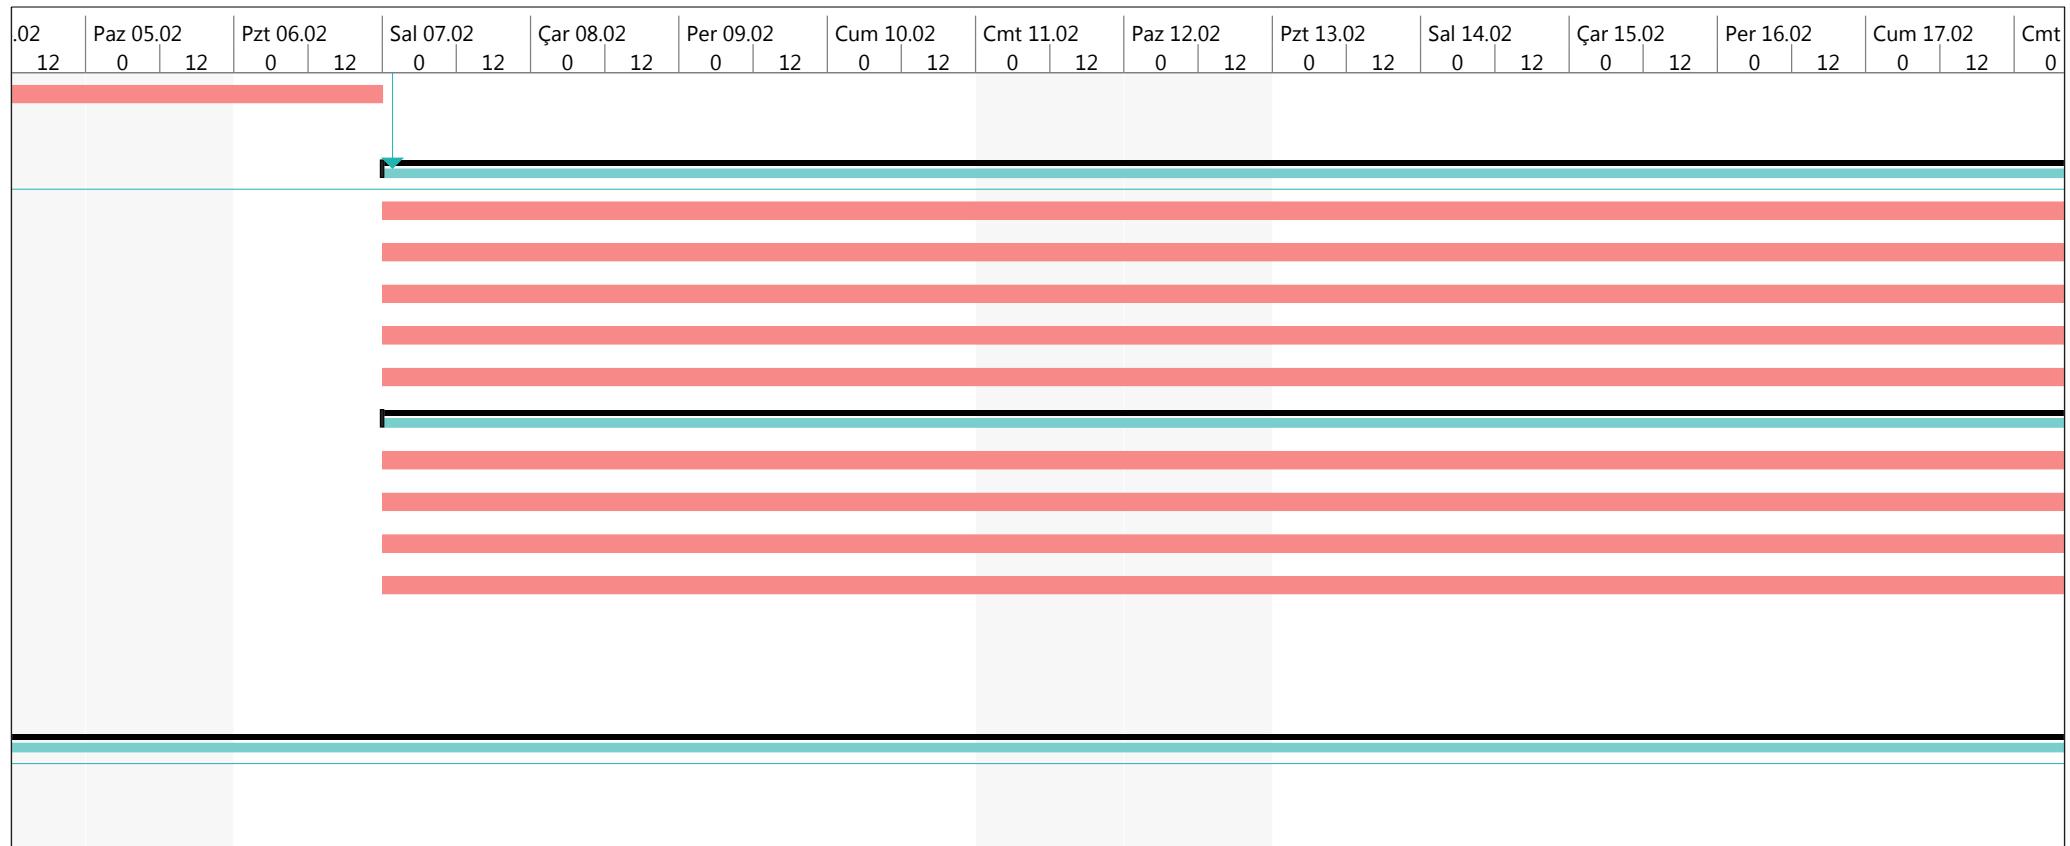

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

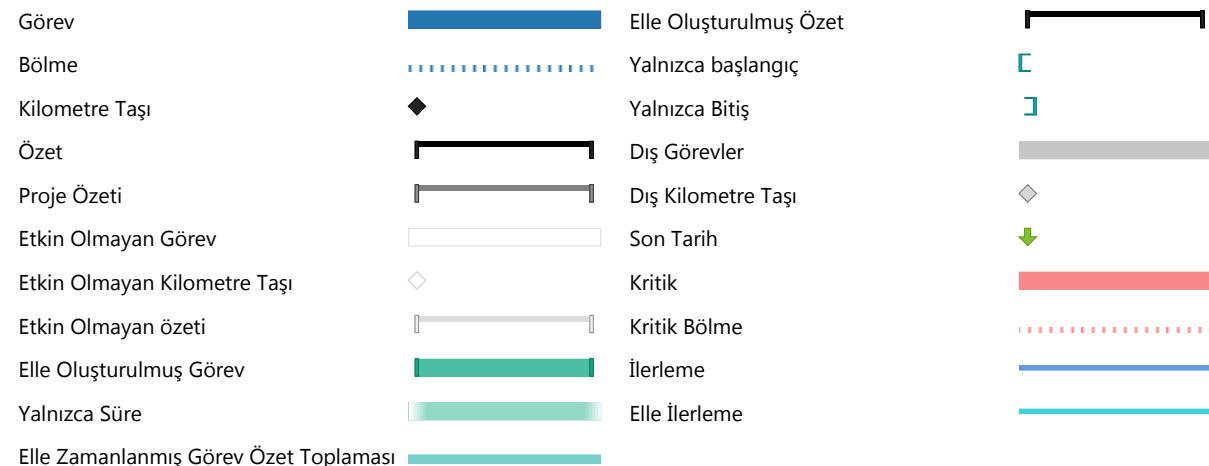


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| .02 12 | Paz 05.02 0 | Pzt 06.02 12 | Sal 07.02 0 | Çar 08.02 0 | Per 09.02 12 | Cum 10.02 0 | Cmt 11.02 0 | Paz 12.02 12 | Pzt 13.02 0 | Sal 14.02 0 | Çar 15.02 0 | Per 16.02 12 | Cum 17.02 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|

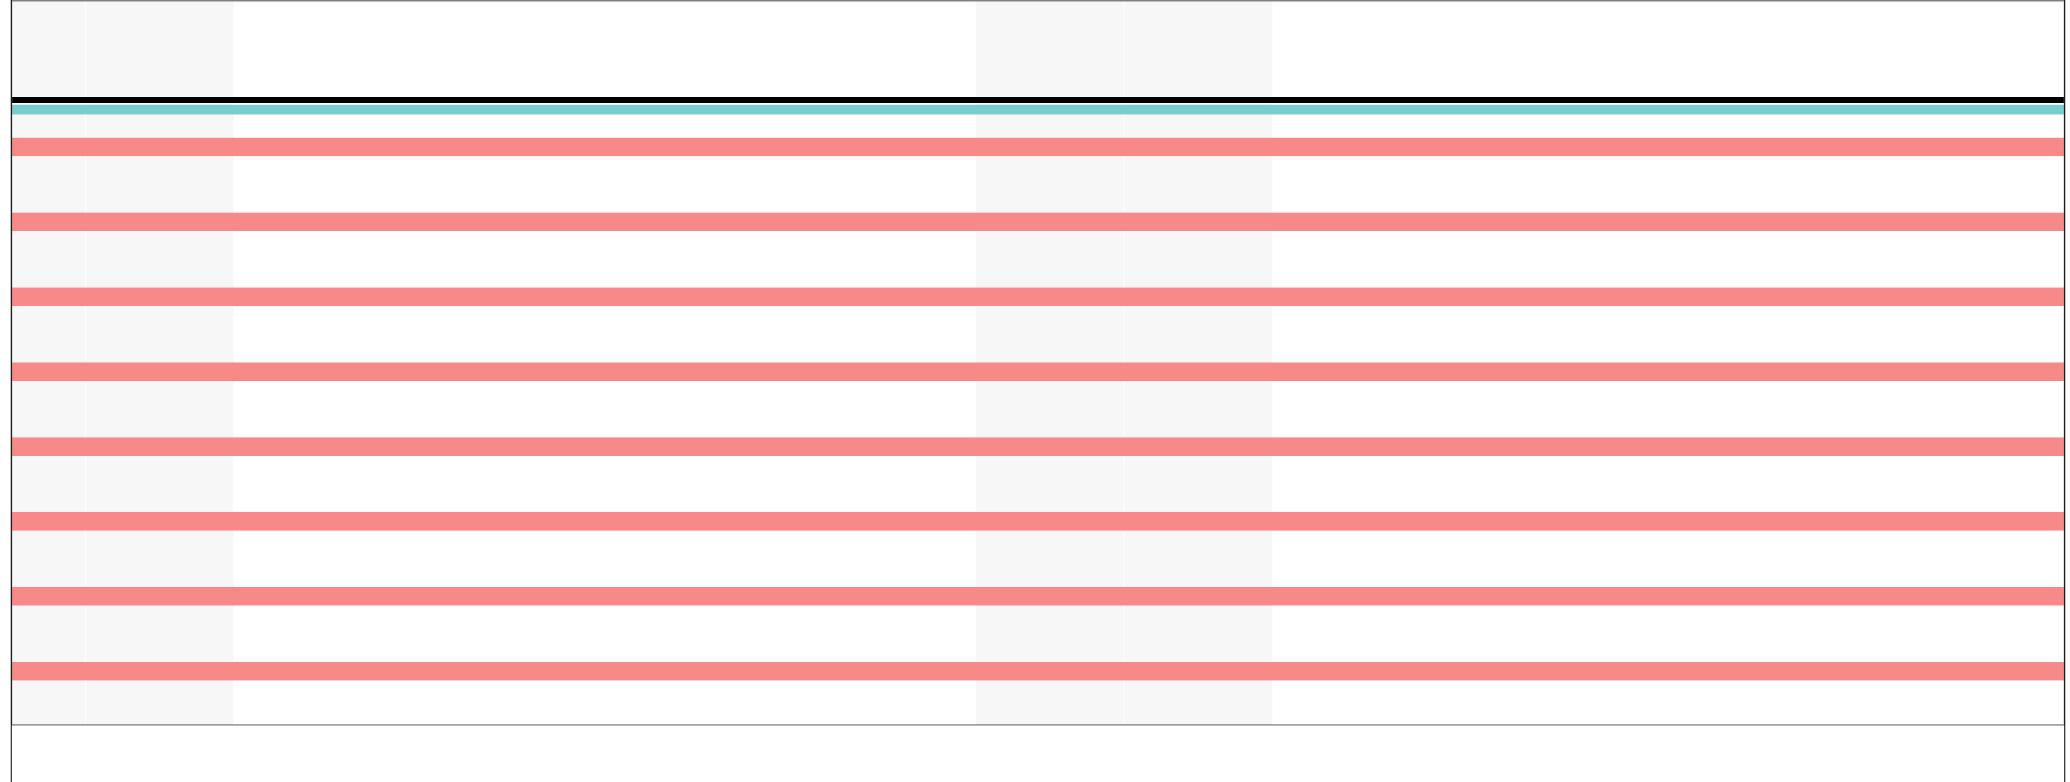


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



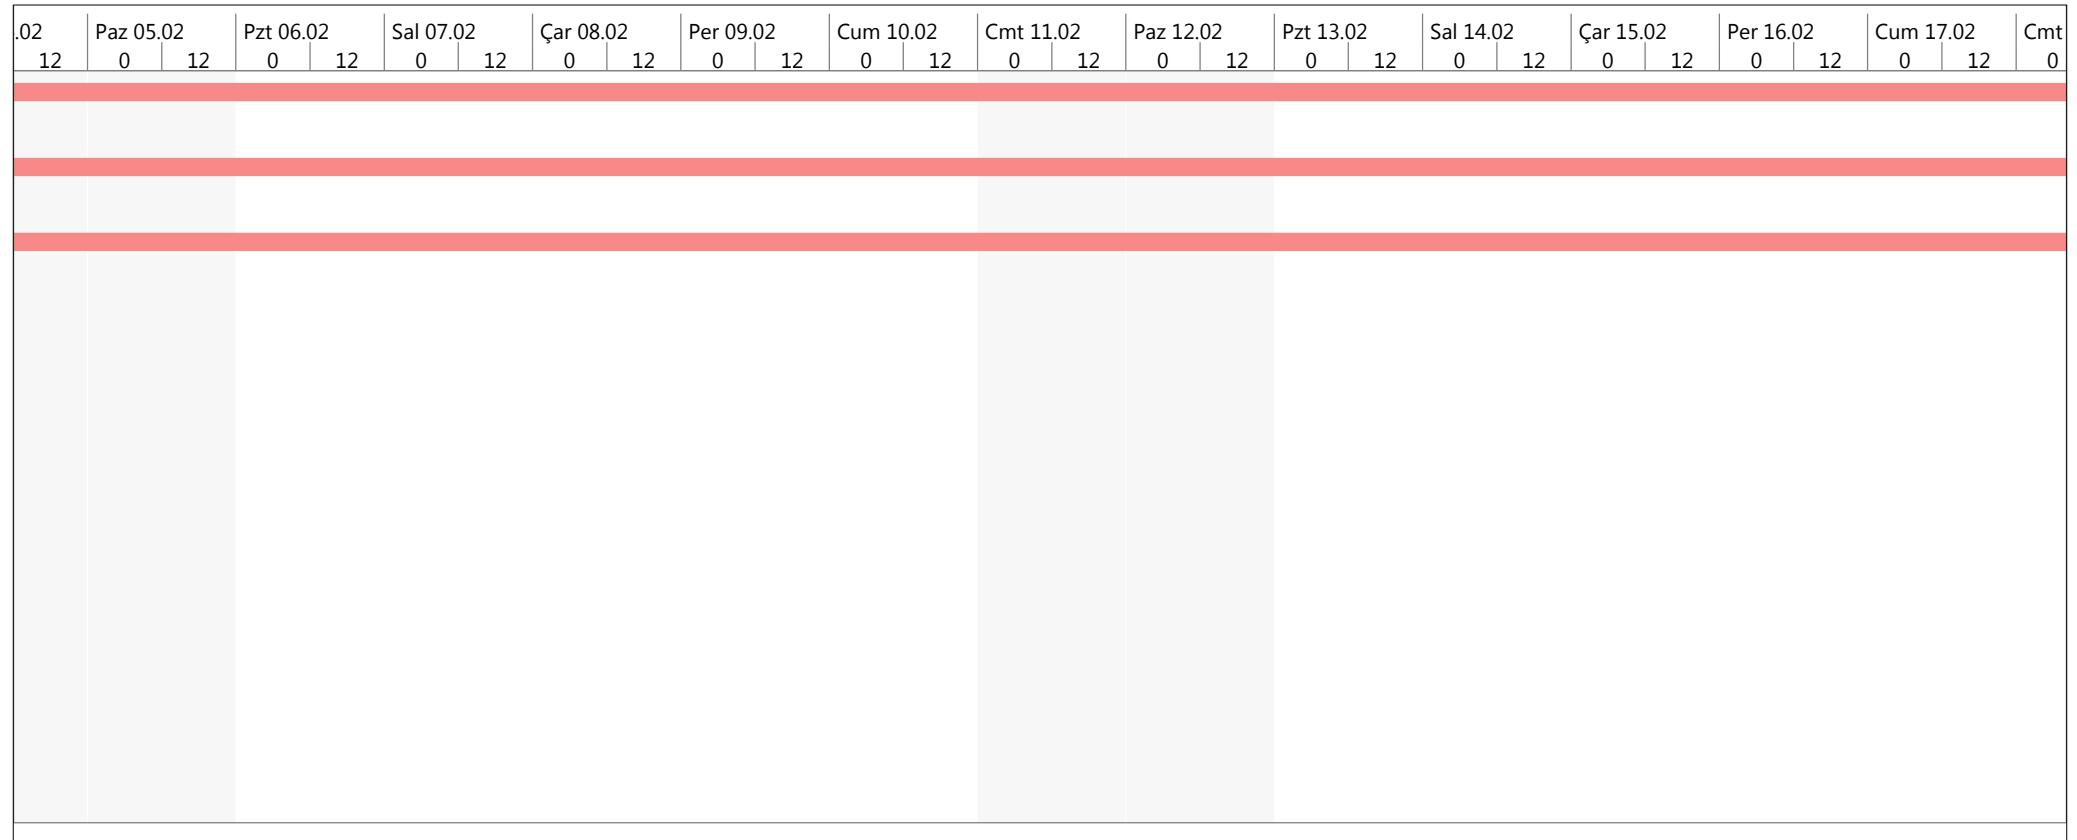

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

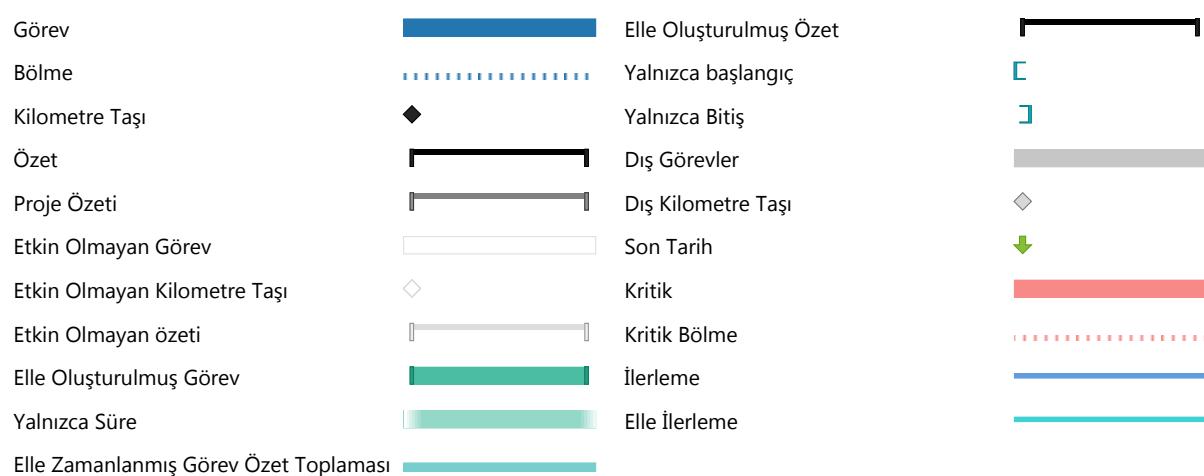

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .02 12 | Paz 05.02 0 | Pzt 06.02 0 | Sal 07.02 12 | Çar 08.02 0 | Per 09.02 12 | Cum 10.02 0 | Cmt 11.02 0 | Paz 12.02 0 | Pzt 13.02 0 | Sal 14.02 0 | Çar 15.02 0 | Per 16.02 0 | Cum 17.02 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .02 12 | Paz 05.02 0 | Pzt 06.02 0 | Sal 07.02 12 | Çar 08.02 0 | Per 09.02 12 | Cum 10.02 0 | Cmt 11.02 0 | Paz 12.02 0 | Pzt 13.02 0 | Sal 14.02 0 | Çar 15.02 0 | Per 16.02 0 | Cum 17.02 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 18.02 | 0 12 | Paz 19.02 | 0 12 | Pzt 20.02 | 0 12 | Sal 21.02 | 0 12 | Çar 22.02 | 0 12 | Per 23.02 | 0 12 | Cum 24.02 | 0 12 | Cmt 25.02 | 0 12 | Paz 26.02 | 0 12 | Pzt 27.02 | 0 12 | Sal 28.02 | 0 12 | Çar 01.03 | 0 12 | Per 02.03 | 0 12 | Cum 03.03 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 18.02 | 0 12 | Paz 19.02 | 0 12 | Pzt 20.02 | 0 12 | Sal 21.02 | 0 12 | Çar 22.02 | 0 12 | Per 23.02 | 0 12 | Cum 24.02 | 0 12 | Cmt 25.02 | 0 12 | Paz 26.02 | 0 12 | Pzt 27.02 | 0 12 | Sal 28.02 | 0 12 | Çar 01.03 | 0 12 | Per 02.03 | 0 12 | Cum 03.03 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|




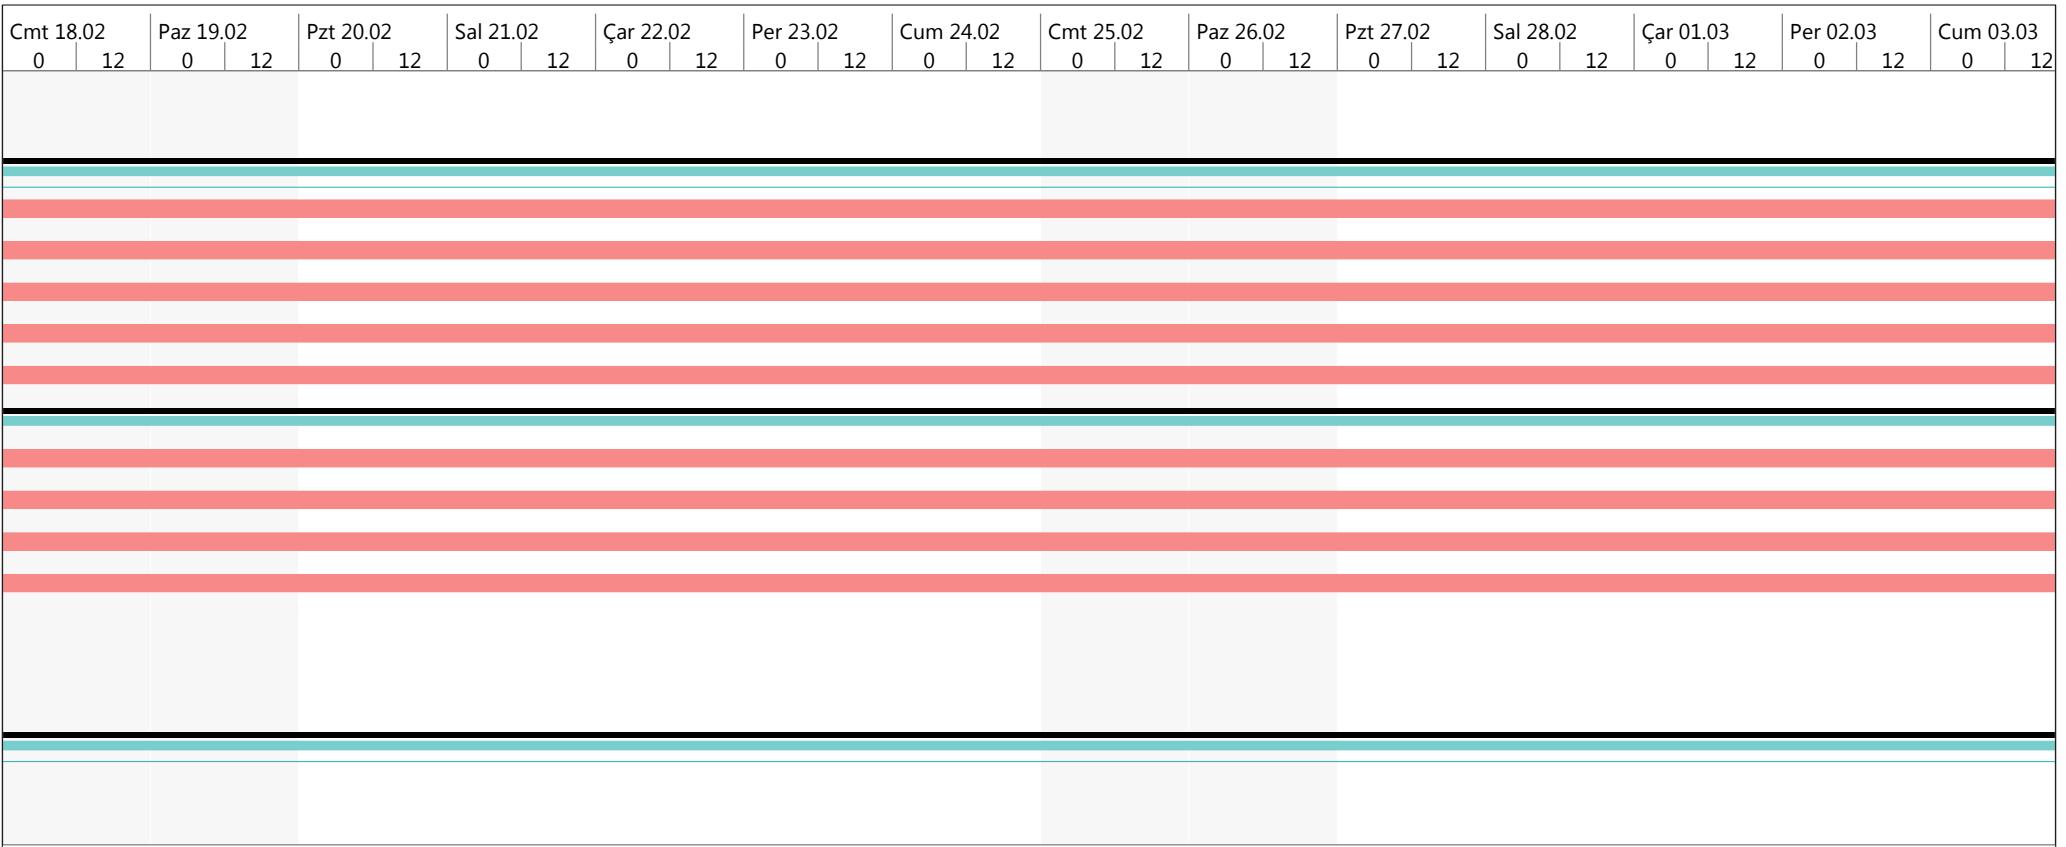

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

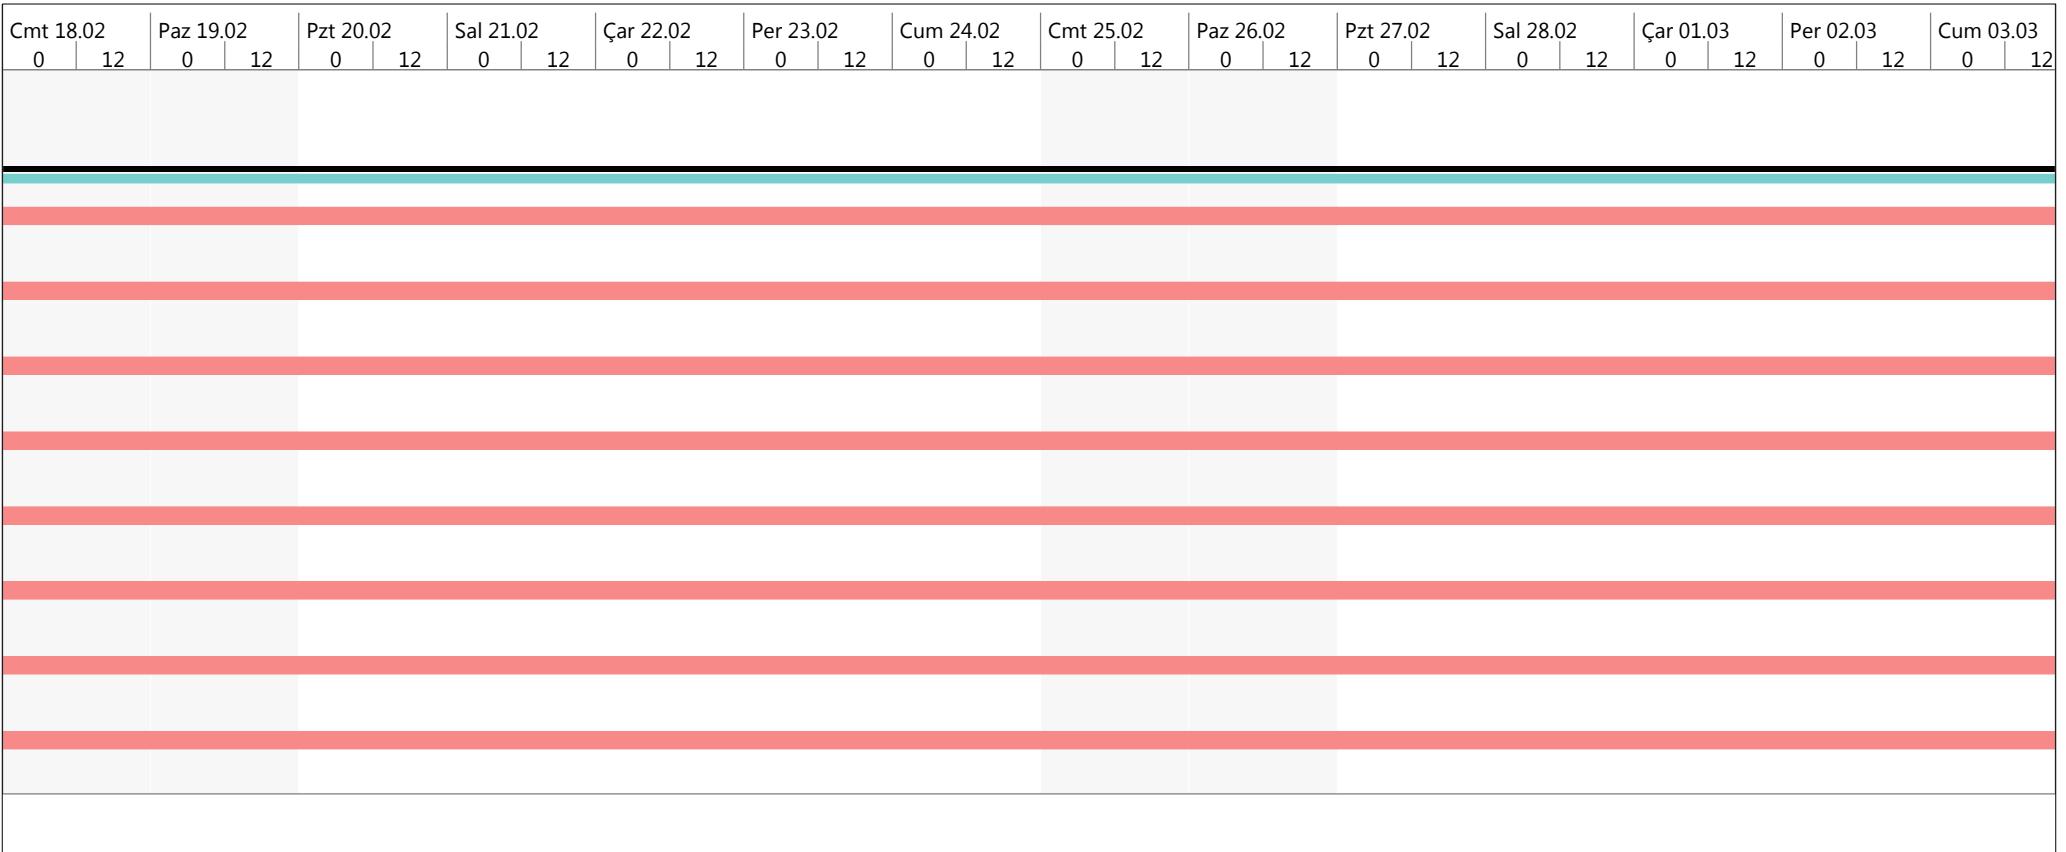

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş |
| | Özet | | Dış Görevler |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | |

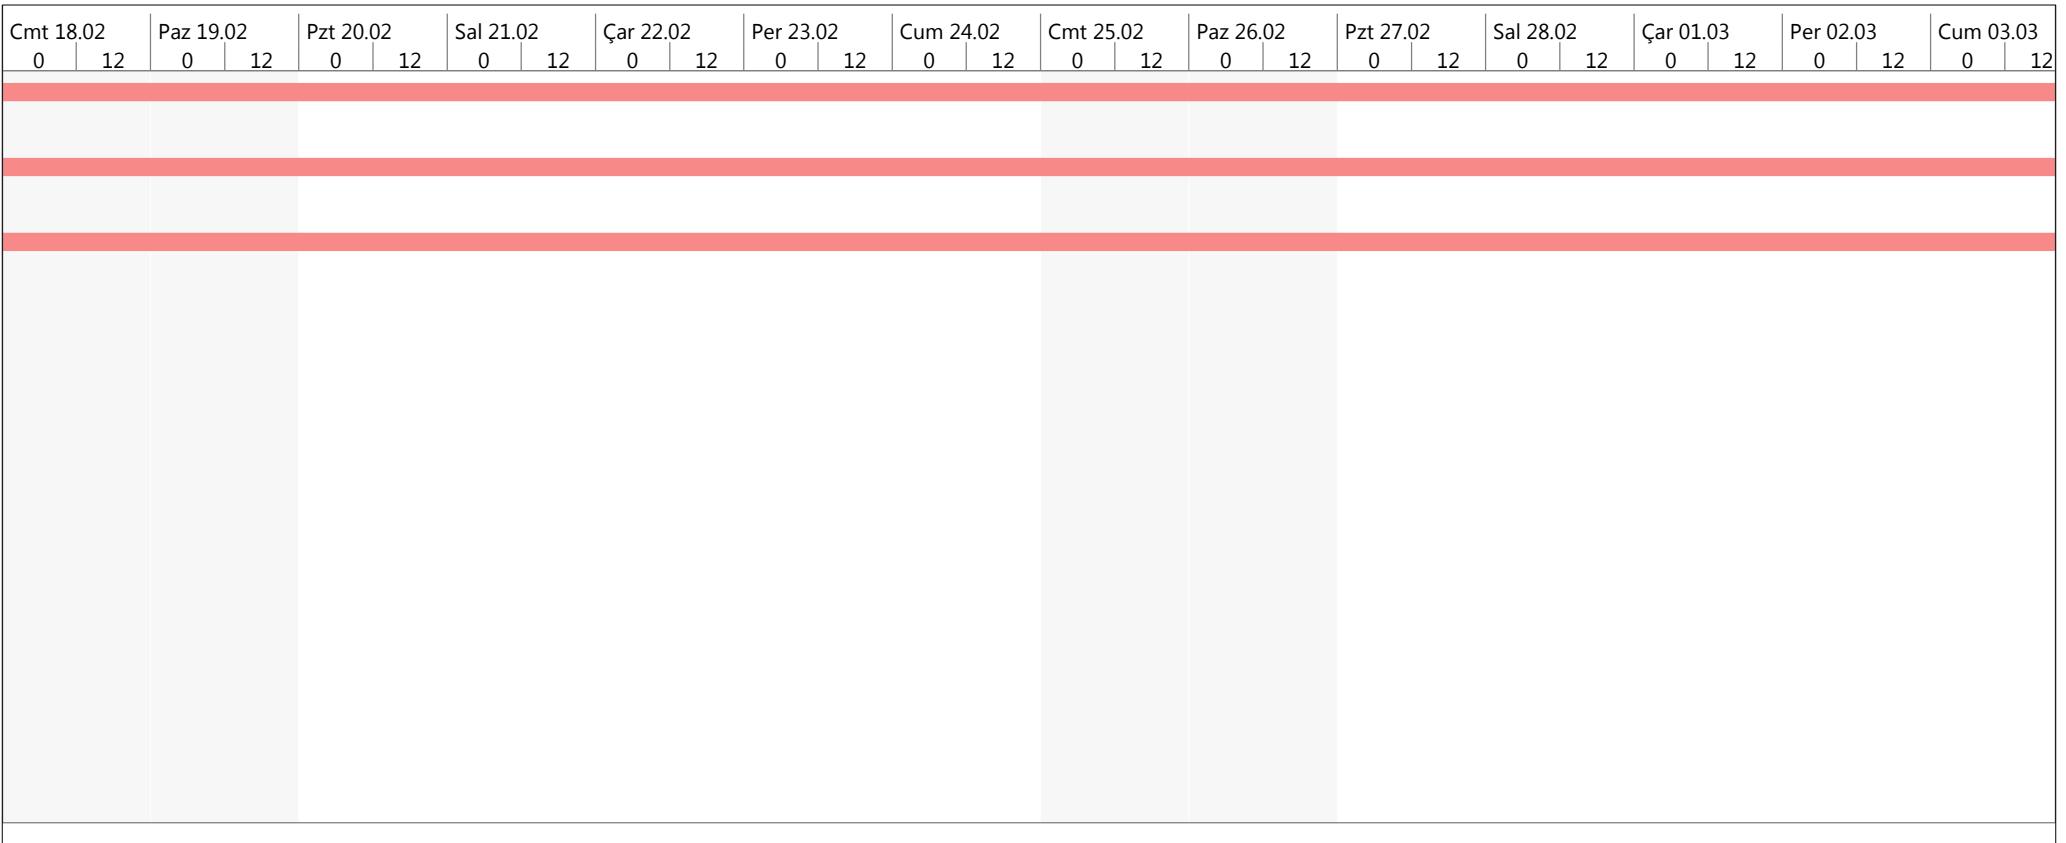

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 18.02 | 0 12 | Paz 19.02 | 0 12 | Pzt 20.02 | 0 12 | Sal 21.02 | 0 12 | Çar 22.02 | 0 12 | Per 23.02 | 0 12 | Cum 24.02 | 0 12 | Cmt 25.02 | 0 12 | Paz 26.02 | 0 12 | Pzt 27.02 | 0 12 | Sal 28.02 | 0 12 | Çar 01.03 | 0 12 | Per 02.03 | 0 12 | Cum 03.03 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cmt 18.02 | Paz 19.02 | Pzt 20.02 | Sal 21.02 | Çar 22.02 | Per 23.02 | Cum 24.02 | Cmt 25.02 | Paz 26.02 | Pzt 27.02 | Sal 28.02 | Çar 01.03 | Per 02.03 | Cum 03.03 |
| 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 12 | Cmt 04.03 0 | Paz 05.03 0 | Pzt 06.03 0 | Sal 07.03 0 | Çar 08.03 0 | Per 09.03 0 | Cum 10.03 0 | Cmt 11.03 0 | Paz 12.03 0 | Pzt 13.03 0 | Sal 14.03 0 | Çar 15.03 0 | Per 16.03 0 | Cum 16.03 0 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 03 12 | Cmt 04.03 0 | Paz 05.03 0 | Pzt 06.03 0 | Sal 07.03 0 | Çar 08.03 0 | Per 09.03 0 | Cum 10.03 0 | Cmt 11.03 0 | Paz 12.03 0 | Pzt 13.03 0 | Sal 14.03 0 | Çar 15.03 0 | Per 16.03 0 | Cum 0 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

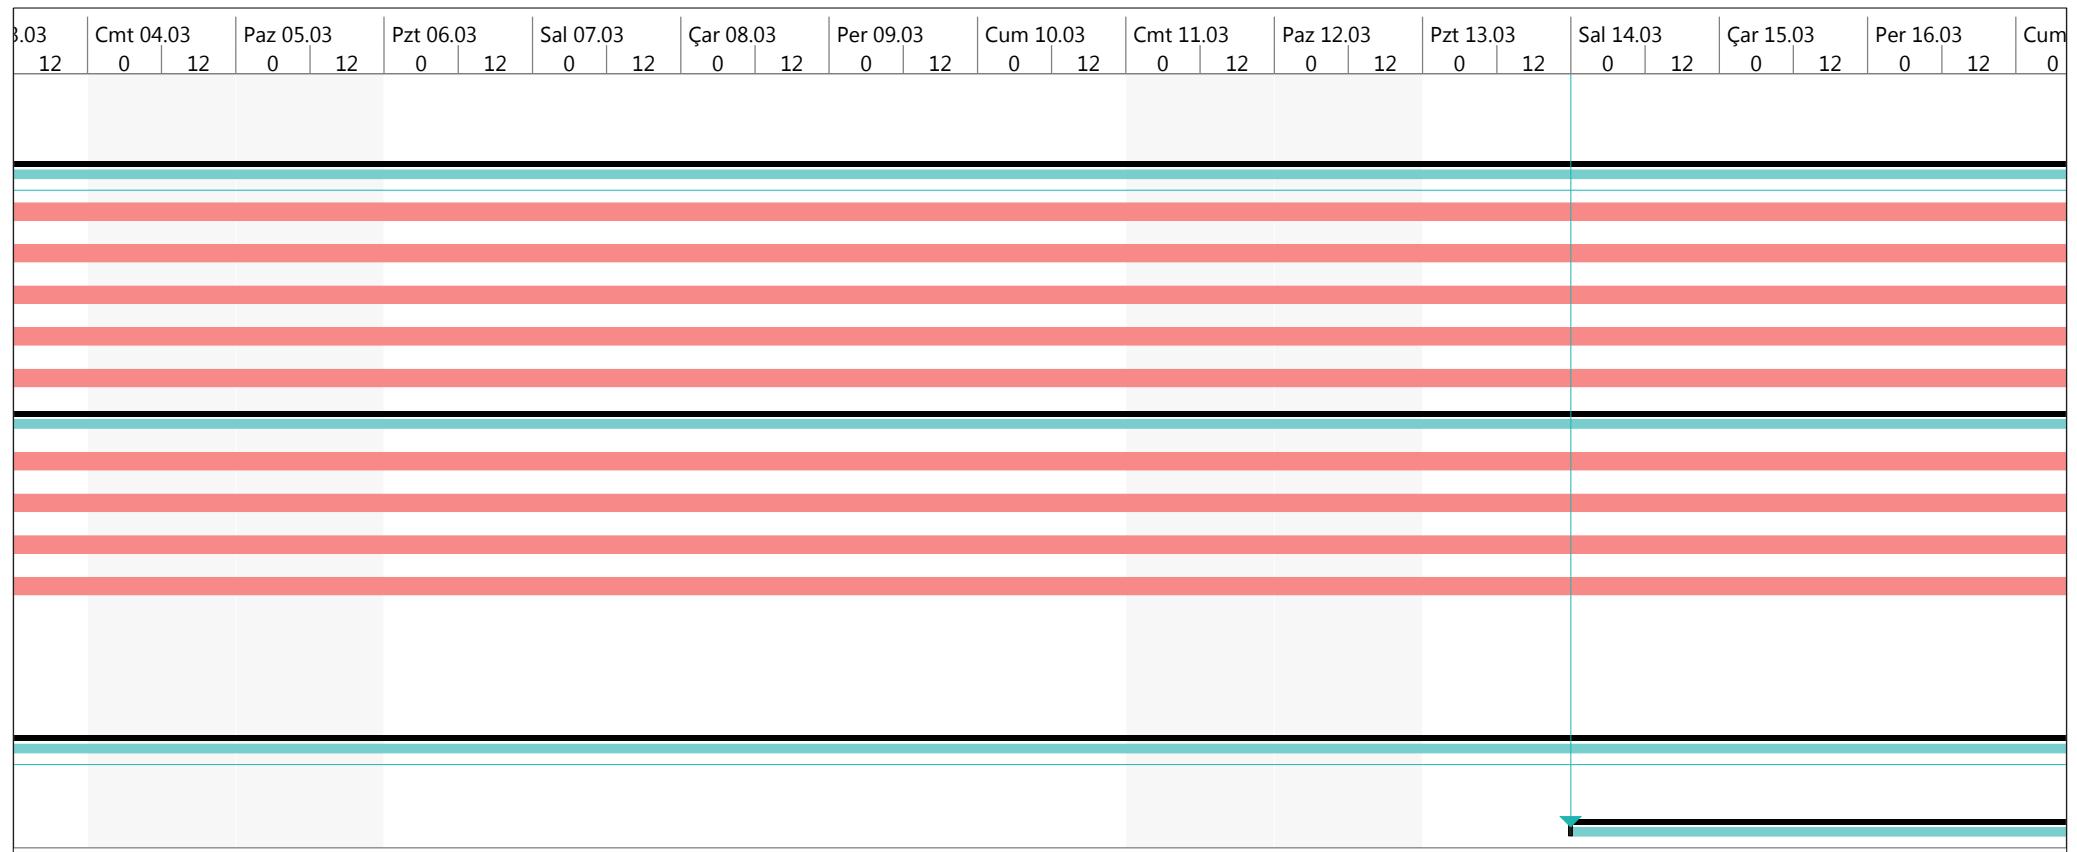


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

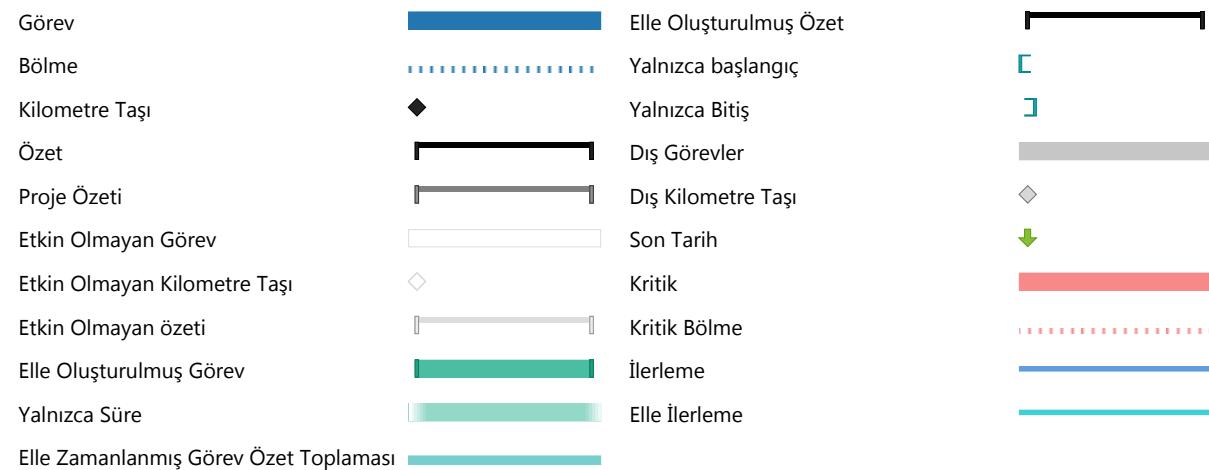


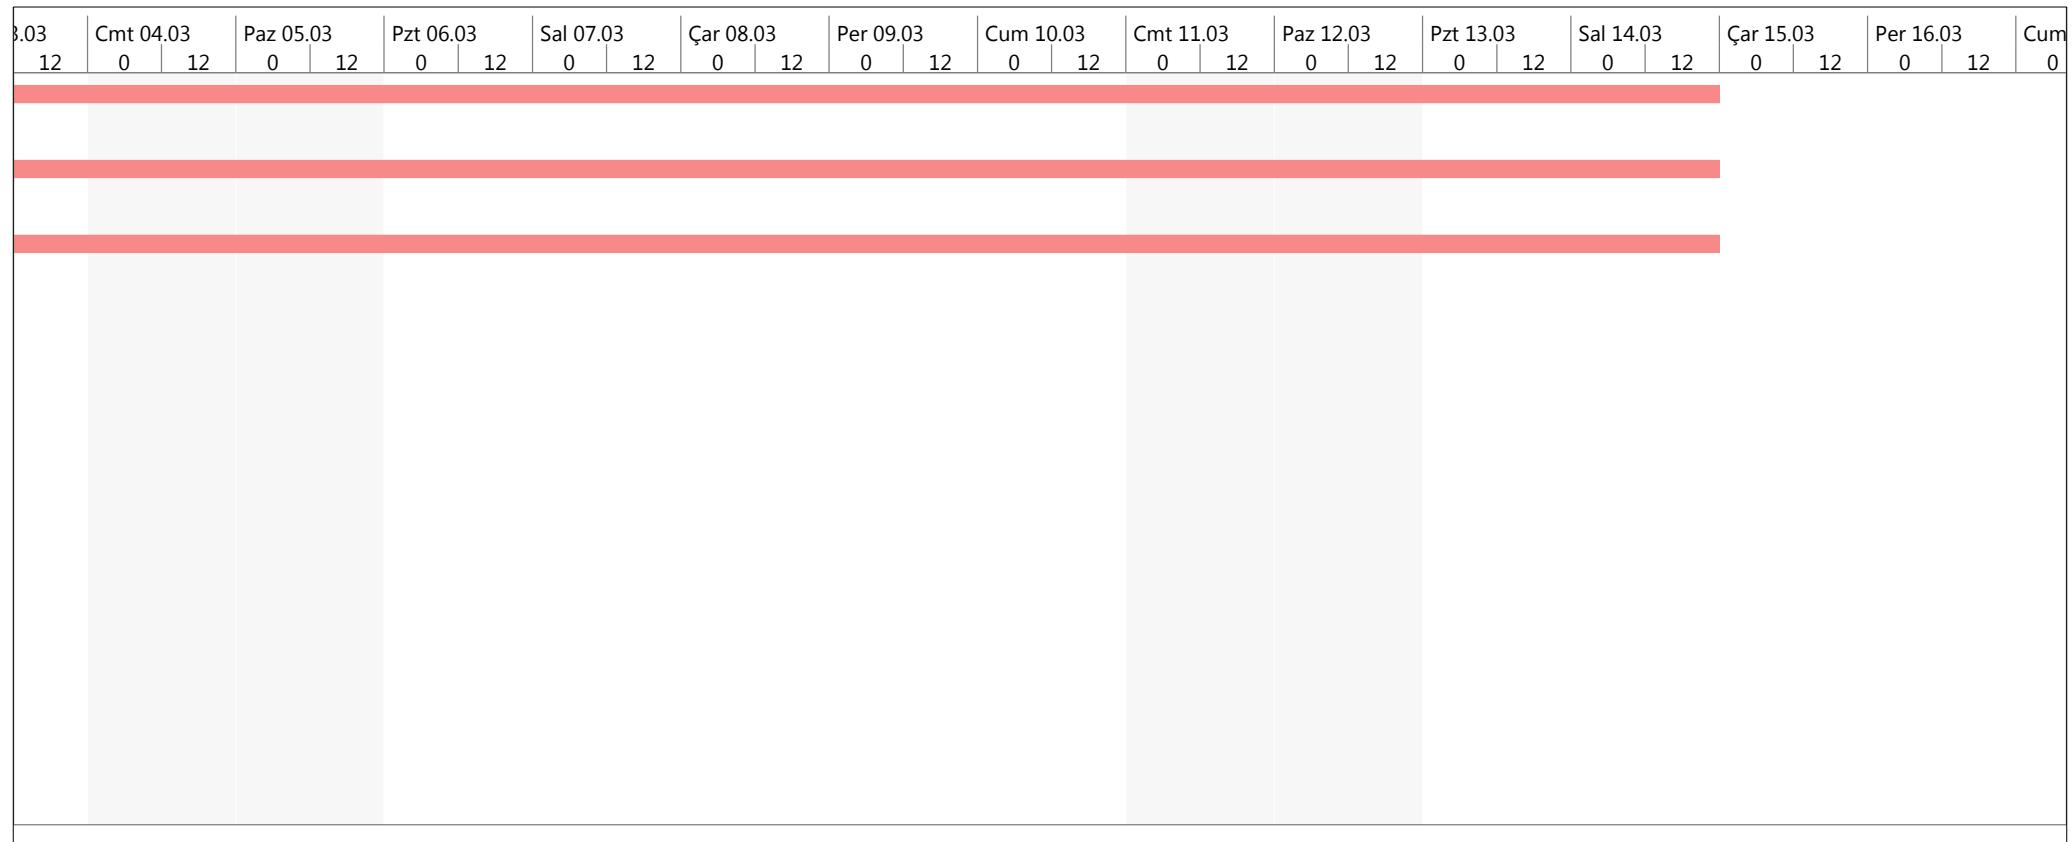

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

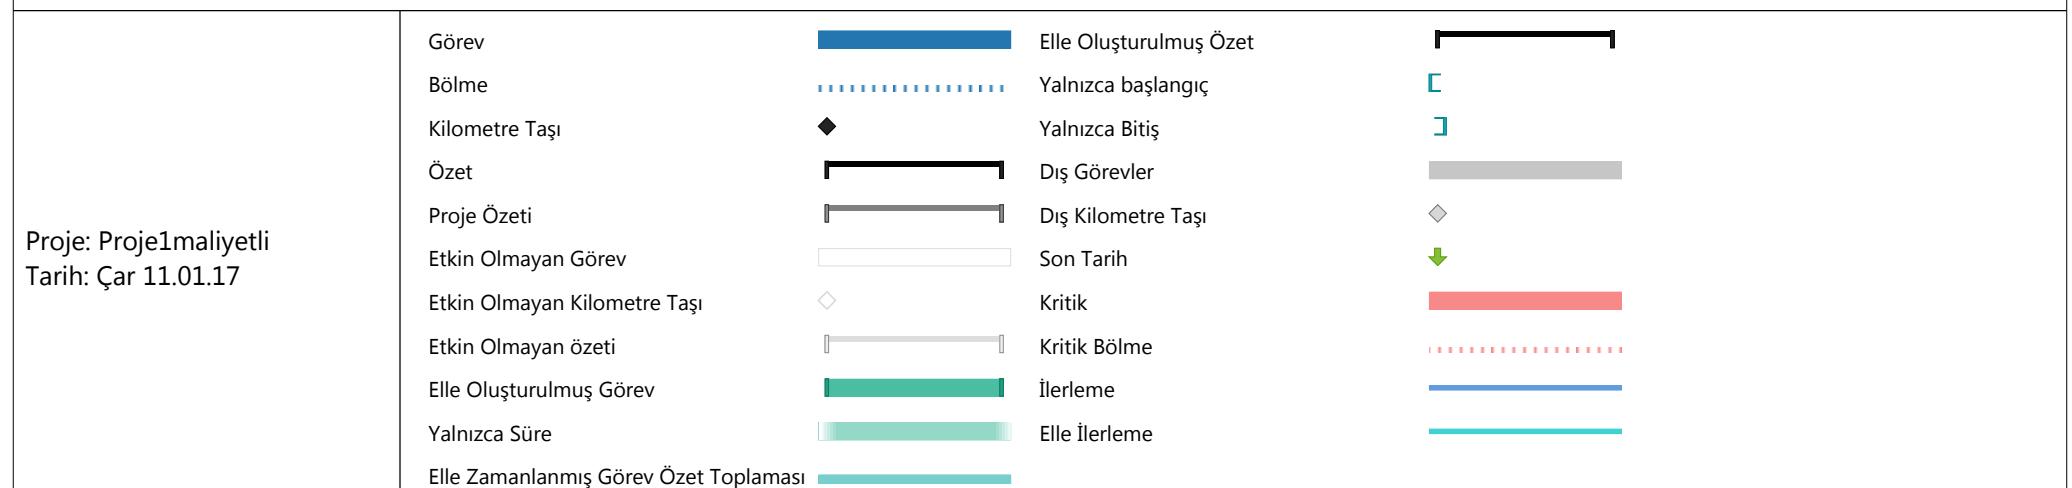


| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 03 12 | Cmt 04.03 0 | Paz 05.03 0 | Pzt 06.03 0 | Sal 07.03 0 | Çar 08.03 0 | Per 09.03 0 | Cum 10.03 0 | Cmt 11.03 0 | Paz 12.03 0 | Pzt 13.03 0 | Sal 14.03 0 | Çar 15.03 0 | Per 16.03 0 | Cum 0 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.03 12 | Cmt 04.03 0 | Paz 05.03 0 | Pzt 06.03 0 | Sal 07.03 0 | Çar 08.03 0 | Per 09.03 0 | Cum 10.03 0 | Cmt 11.03 0 | Paz 12.03 0 | Pzt 13.03 0 | Sal 14.03 0 | Çar 15.03 0 | Per 16.03 0 | Cum 16.03 0 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



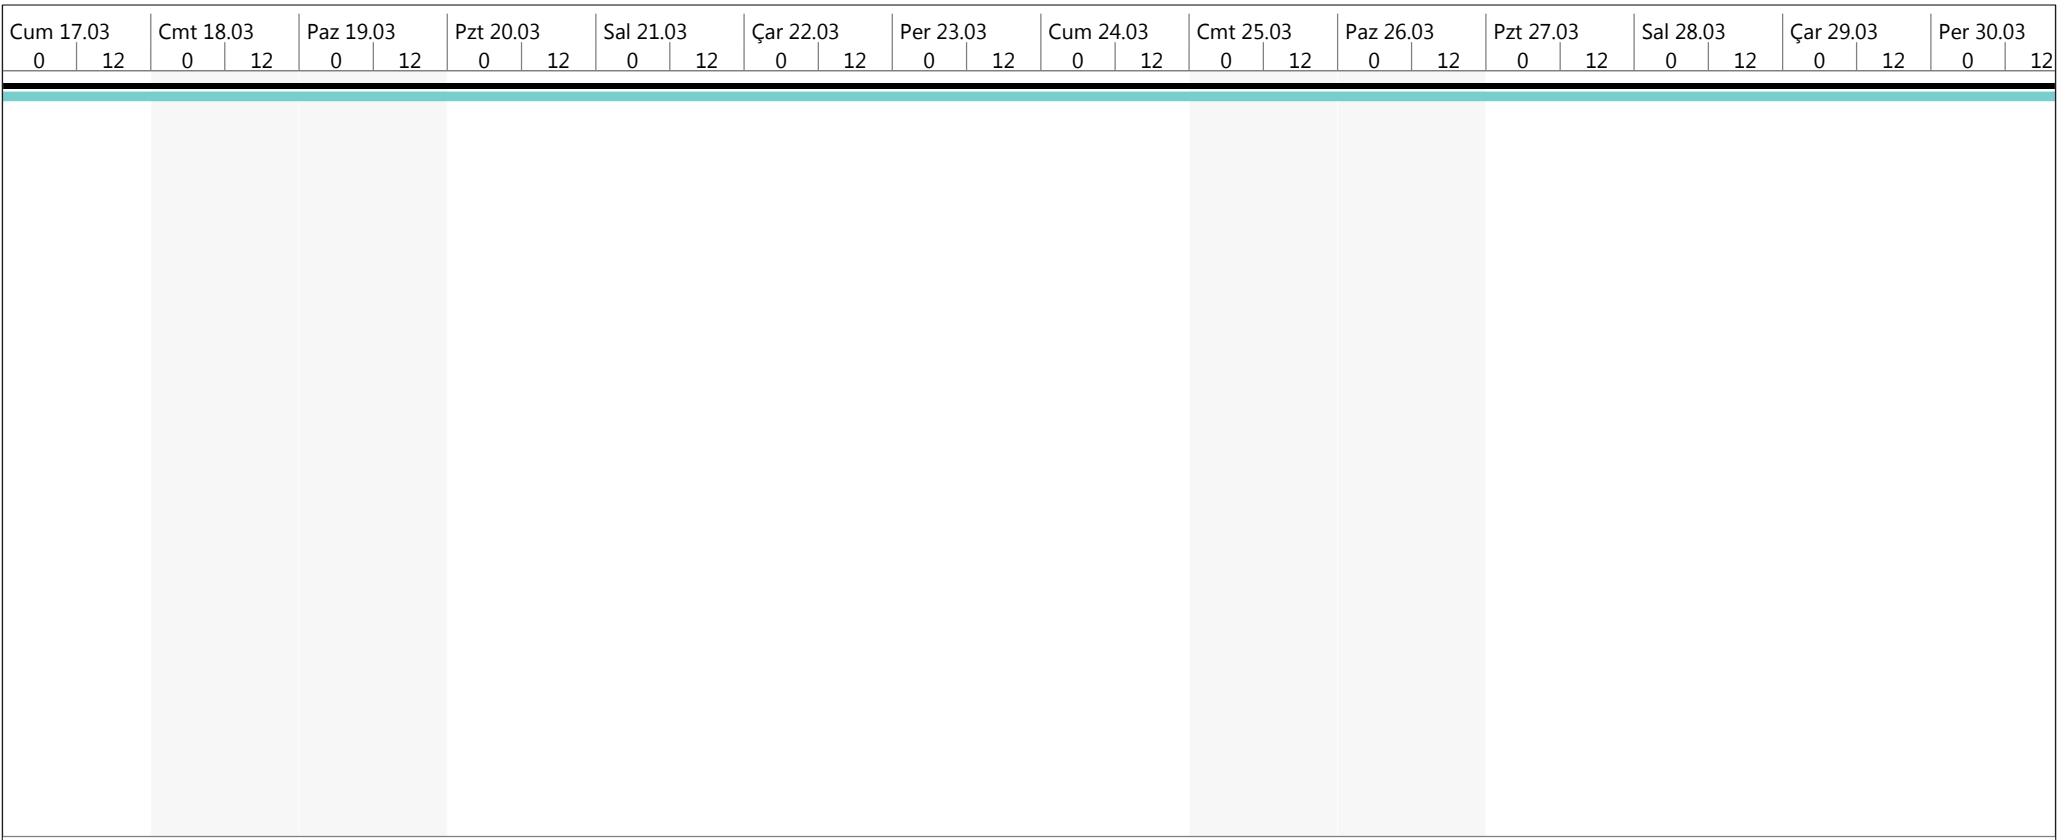

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----|
| Cum 17.03 0 | | Cmt 18.03 0 | | Paz 19.03 0 | | Pzt 20.03 0 | | Sal 21.03 0 | | Çar 22.03 0 | | Per 23.03 0 | | Cum 24.03 0 | | Cmt 25.03 0 | | Paz 26.03 0 | | Pzt 27.03 0 | | Sal 28.03 0 | | Çar 29.03 0 | | Per 30.03 0 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

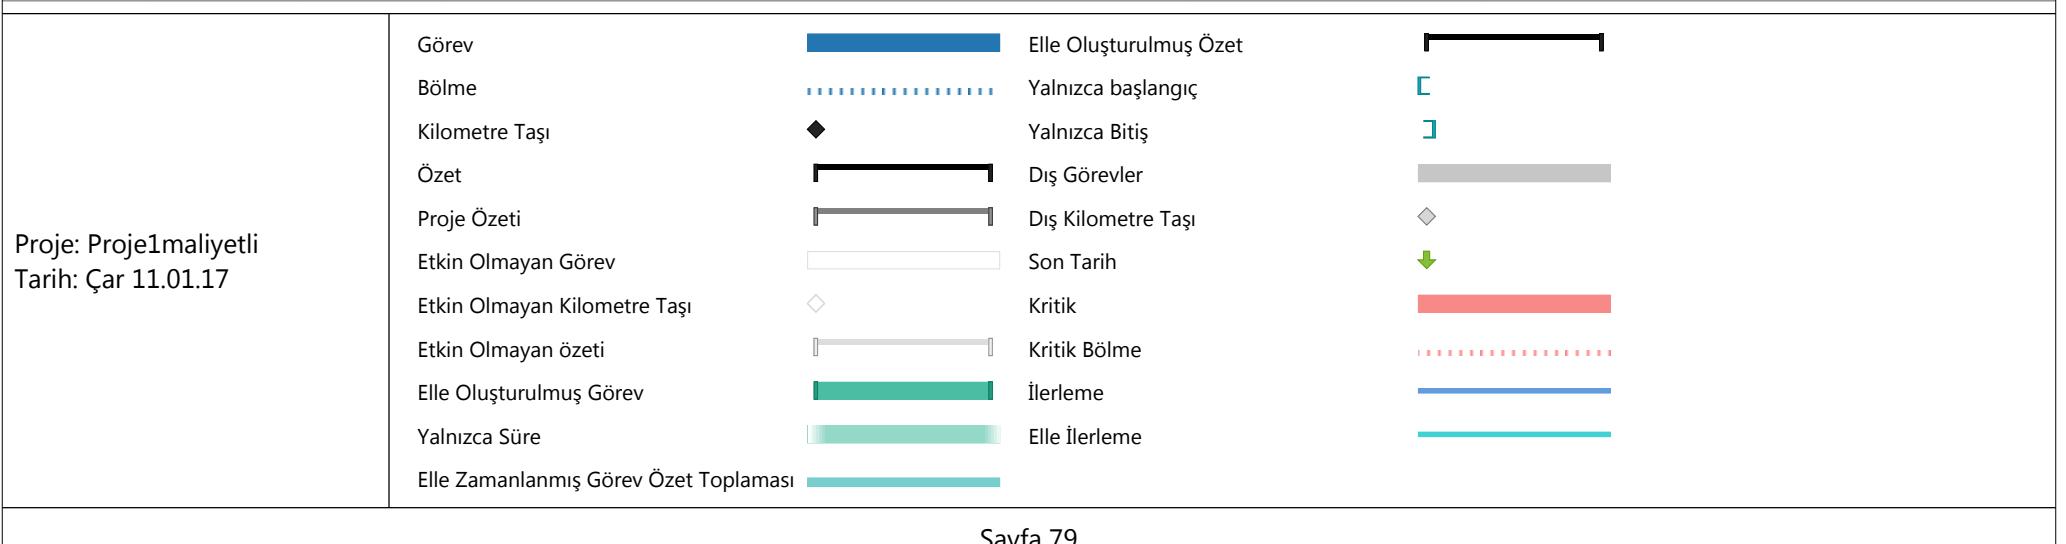

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Cum 17.03 0 | Cmt 18.03 0 | Paz 19.03 0 | Pzt 20.03 12 | Sal 21.03 0 | Çar 22.03 12 | Per 23.03 0 | Cum 24.03 12 | Cmt 25.03 0 | Paz 26.03 12 | Pzt 27.03 0 | Sal 28.03 12 | Çar 29.03 0 | Per 30.03 12 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|

iPad Pro 12.9[770]

Parmak izi okuyucu sensor/ growe[770]

HT - 163 Basınç ısı nem ölçer usb data loger[770]

iPad Pro için Apple Pencil[770]

21,5 inc retina 4k ekranlı imac[30]

Ic fiber patch kablo 3 mt[3]

MM-50/125 OM3 Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı Dahili/Harici LSZH Fiber OptikKablo[1]

Zyxel XGS-4728F SWiTCH[1]


TP-LINK ARCHER VR900 1900 MBPS WIRELESS DUVAL BANT GIGABIT VDSL2 MODEM ROUTER[6]

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| Cum 17.03 0 | | Cmt 18.03 0 | | Paz 19.03 0 | | Pzt 20.03 0 | | Sal 21.03 0 | | Çar 22.03 0 | | Per 23.03 0 | | Cum 24.03 0 | | Cmt 25.03 0 | | Paz 26.03 0 | | Pzt 27.03 0 | | Sal 28.03 0 | | Çar 29.03 0 | | Per 30.03 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 17.03 0 | Cmt 18.03 0 | Paz 19.03 0 | Pzt 20.03 0 | Sal 21.03 0 | Çar 22.03 0 | Per 23.03 0 | Cum 24.03 0 | Cmt 25.03 0 | Paz 26.03 0 | Pzt 27.03 0 | Sal 28.03 0 | Çar 29.03 0 | Per 30.03 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

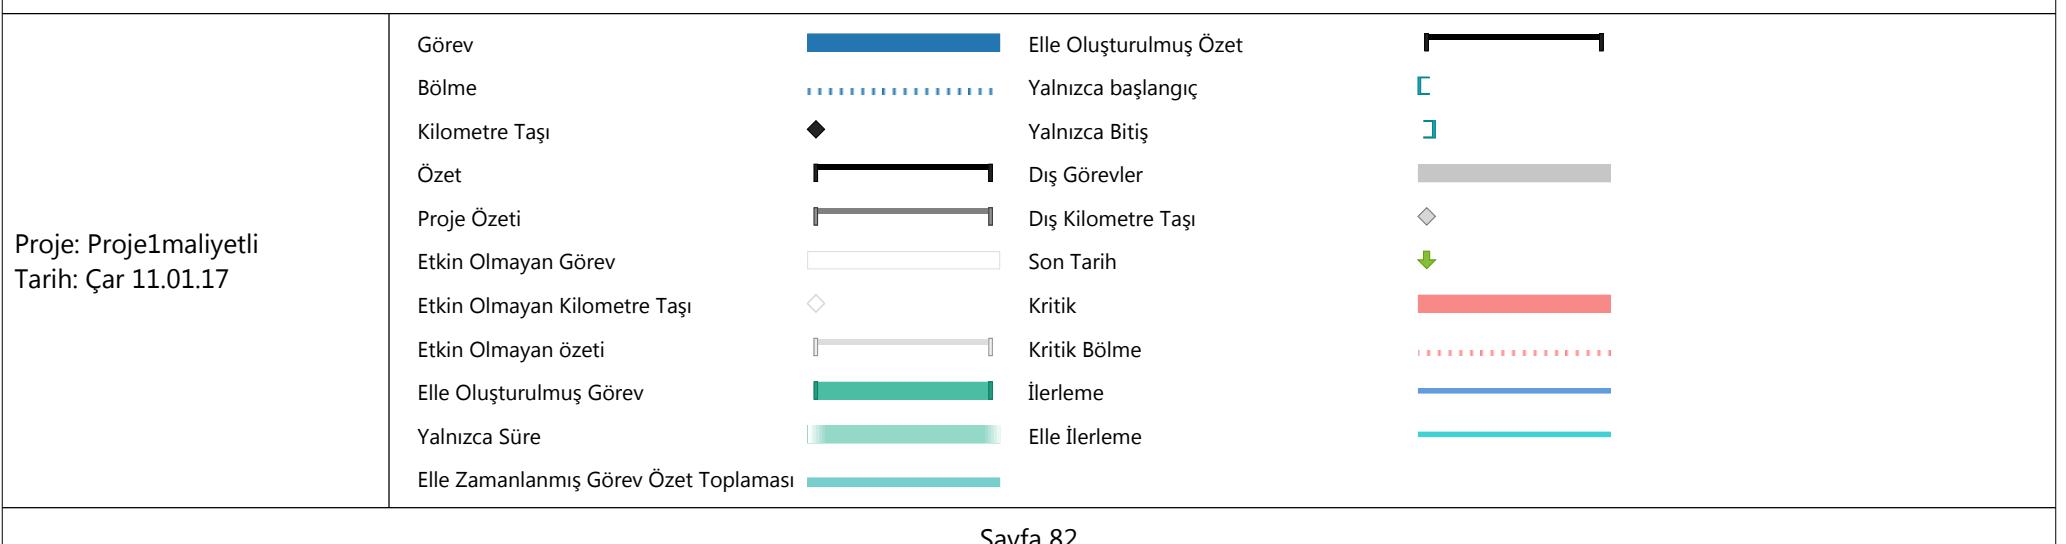

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 17.03 0 | Cmt 18.03 0 | Paz 19.03 0 | Pzt 20.03 0 | Sal 21.03 0 | Çar 22.03 0 | Per 23.03 0 | Cum 24.03 0 | Cmt 25.03 0 | Paz 26.03 0 | Pzt 27.03 0 | Sal 28.03 0 | Çar 29.03 0 | Per 30.03 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 17.03 0 | Cmt 18.03 0 | Paz 19.03 0 | Pzt 20.03 0 | Sal 21.03 0 | Çar 22.03 0 | Per 23.03 0 | Cum 24.03 0 | Cmt 25.03 0 | Paz 26.03 0 | Pzt 27.03 0 | Sal 28.03 0 | Çar 29.03 0 | Per 30.03 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 03 12 | Cum 31.03 0 12 | Cmt 01.04 0 12 | Paz 02.04 0 12 | Pzt 03.04 0 12 | Sal 04.04 0 12 | Çar 05.04 0 12 | Per 06.04 0 12 | Cum 07.04 0 12 | Cmt 08.04 0 12 | Paz 09.04 0 12 | Pzt 10.04 0 12 | Sal 11.04 0 12 | Çar 12.04 0 12 | Per 1 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 03 12 | Cum 0 | 31.03 12 | Cmt 0 | 01.04 12 | Paz 0 | 02.04 12 | Pzt 0 | 03.04 12 | Sal 0 | 04.04 12 | Çar 0 | 05.04 12 | Per 0 | 06.04 12 | Cum 0 | 07.04 12 | Cmt 0 | 08.04 12 | Paz 0 | 09.04 12 | Pzt 0 | 10.04 12 | Sal 0 | 11.04 12 | Çar 0 | 12.04 12 | Per 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

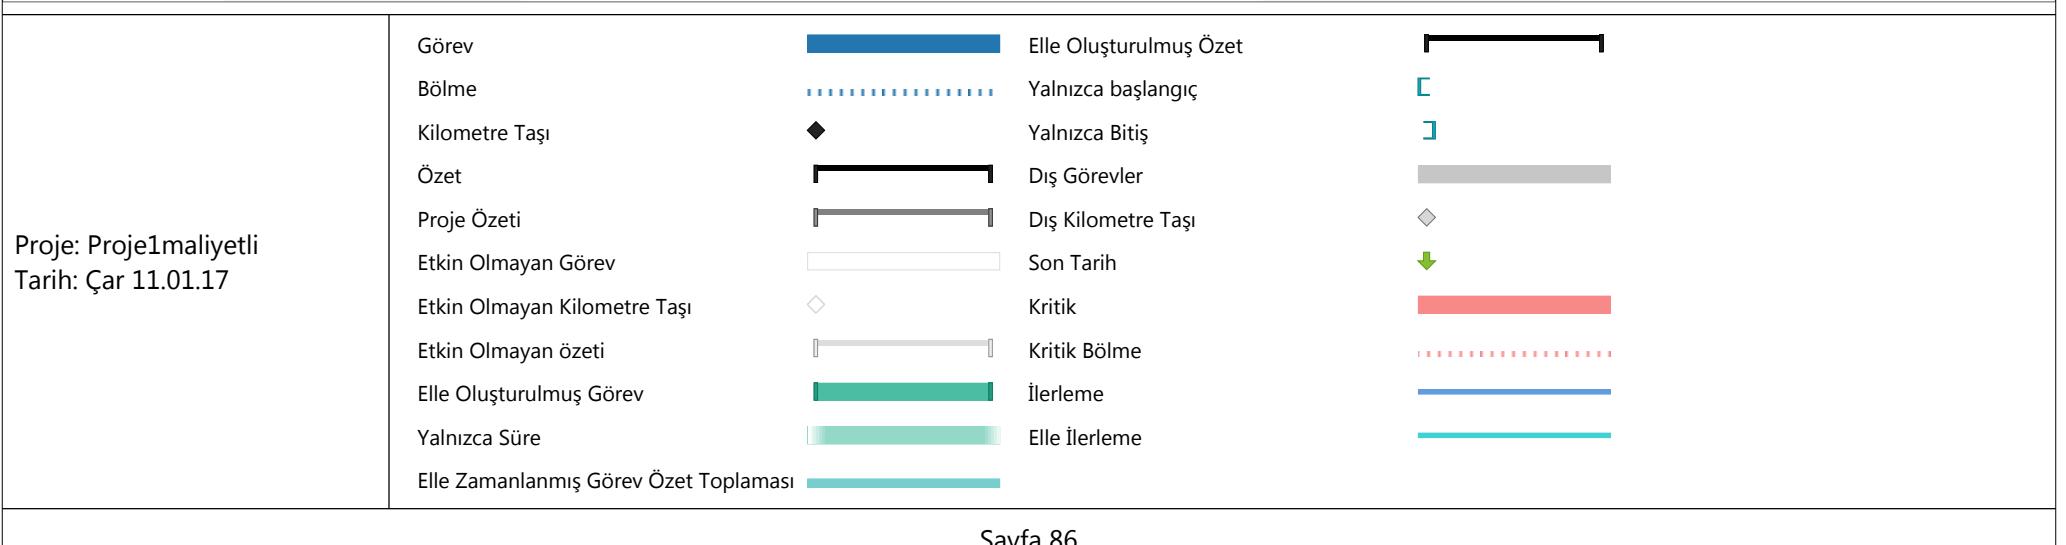

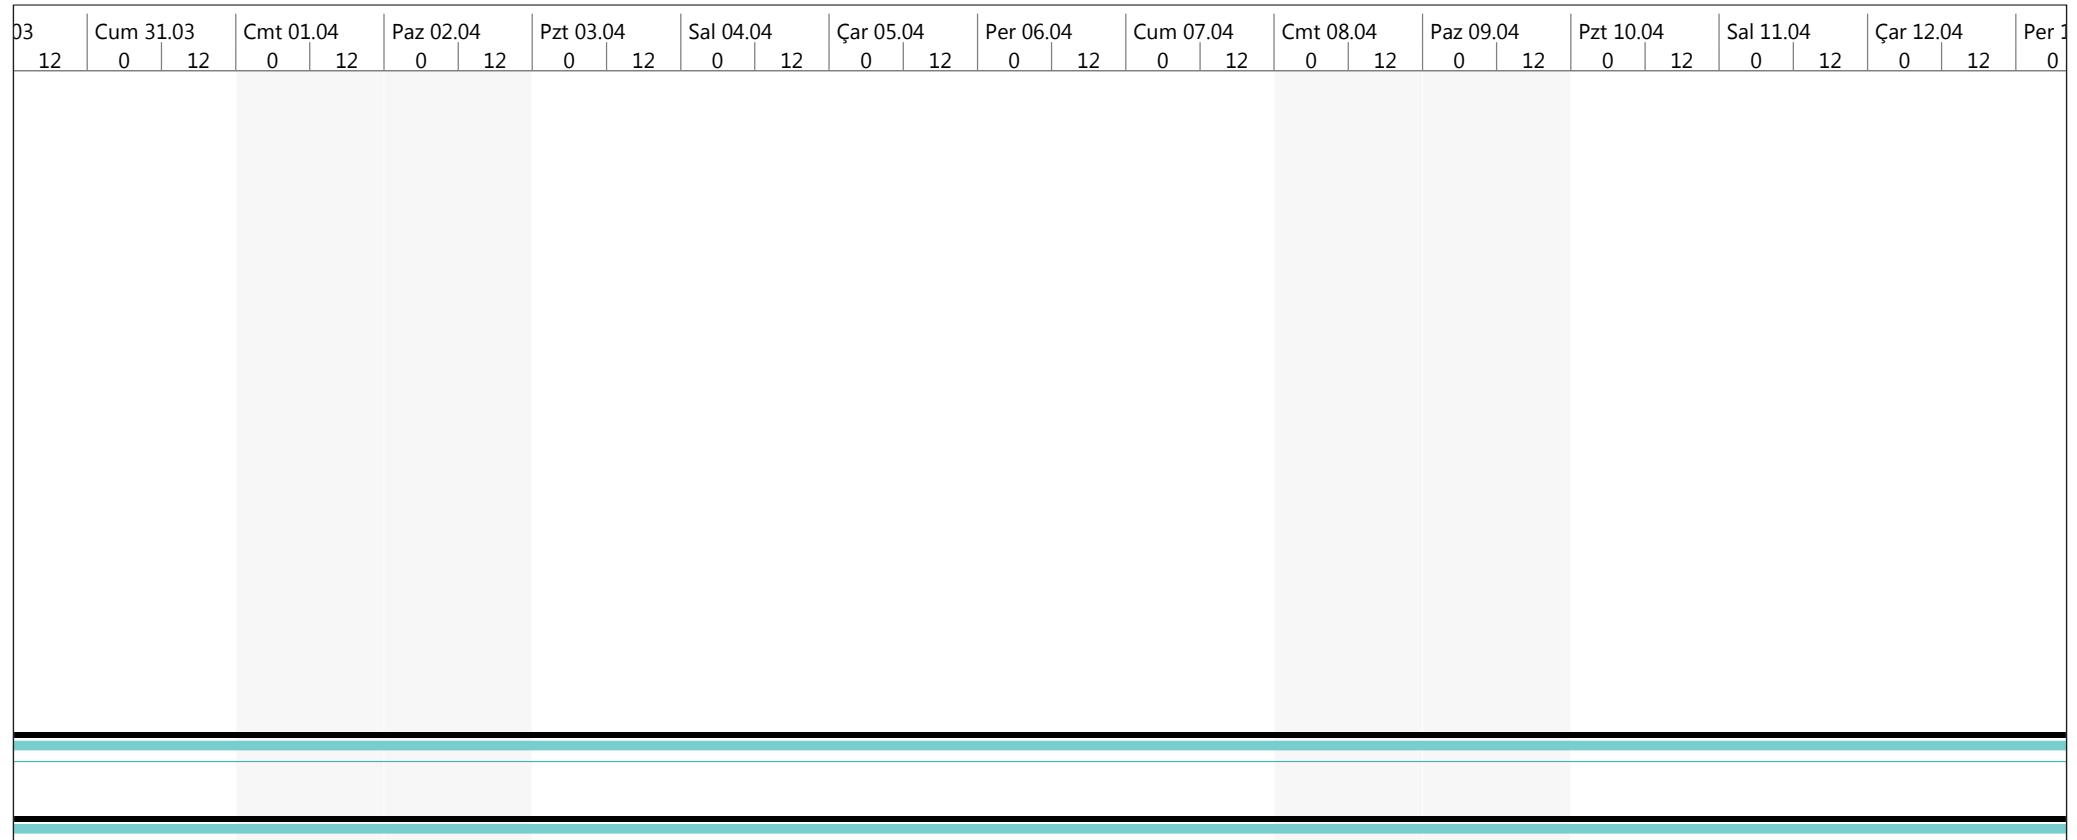


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özet | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 03 12 | Cum 0 | 31.03 12 | Cmt 0 | 01.04 12 | Paz 0 | 02.04 12 | Pzt 0 | 03.04 12 | Sal 0 | 04.04 12 | Çar 0 | 05.04 12 | Per 0 | 06.04 12 | Cum 0 | 07.04 12 | Cmt 0 | 08.04 12 | Paz 0 | 09.04 12 | Pzt 0 | 10.04 12 | Sal 0 | 11.04 12 | Çar 0 | 12.04 12 | Per 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

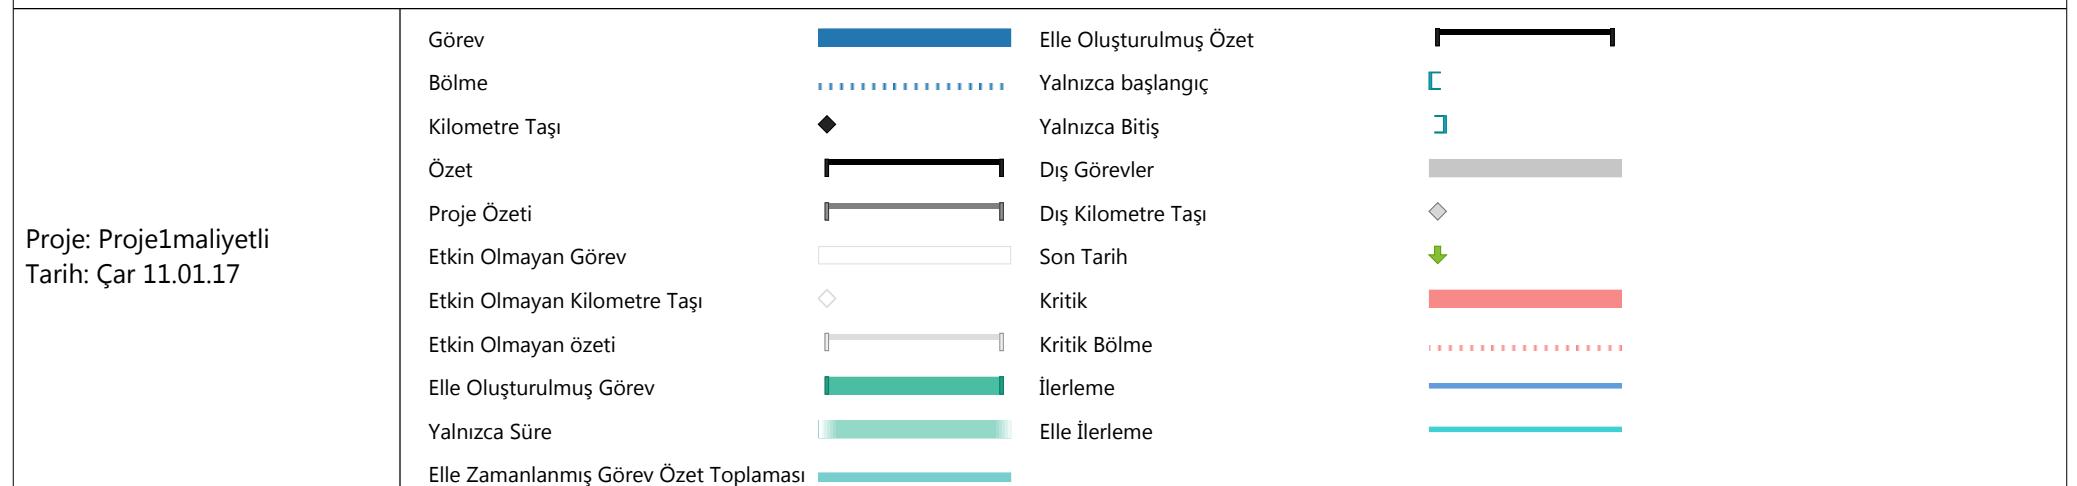

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 03 12 | Cum 0 | 31.03 12 | Cmt 0 | 01.04 12 | Paz 0 | 02.04 12 | Pzt 0 | 03.04 12 | Sal 0 | 04.04 12 | Çar 0 | 05.04 12 | Per 0 | 06.04 12 | Cum 0 | 07.04 12 | Cmt 0 | 08.04 12 | Paz 0 | 09.04 12 | Pzt 0 | 10.04 12 | Sal 0 | 11.04 12 | Çar 0 | 12.04 12 | Per 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

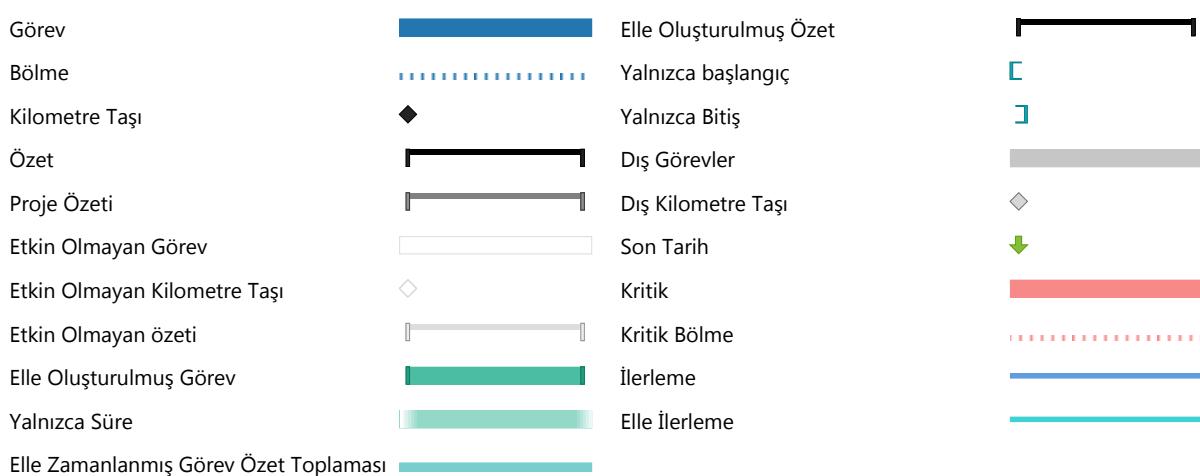

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 03 12 | Cum 0 | 31.03 12 | Cmt 0 | 01.04 12 | Paz 0 | 02.04 12 | Pzt 0 | 03.04 12 | Sal 0 | 04.04 12 | Çar 0 | 05.04 12 | Per 0 | 06.04 12 | Cum 0 | 07.04 12 | Cmt 0 | 08.04 12 | Paz 0 | 09.04 12 | Pzt 0 | 10.04 12 | Sal 0 | 11.04 12 | Çar 0 | 12.04 12 | Per 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 03 12 | Cum 0 | 31.03 12 | Cmt 0 | 01.04 12 | Paz 0 | 02.04 12 | Pzt 0 | 03.04 12 | Sal 0 | 04.04 12 | Çar 0 | 05.04 12 | Per 0 | 06.04 12 | Cum 0 | 07.04 12 | Cmt 0 | 08.04 12 | Paz 0 | 09.04 12 | Pzt 0 | 10.04 12 | Sal 0 | 11.04 12 | Çar 0 | 12.04 12 | Per 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

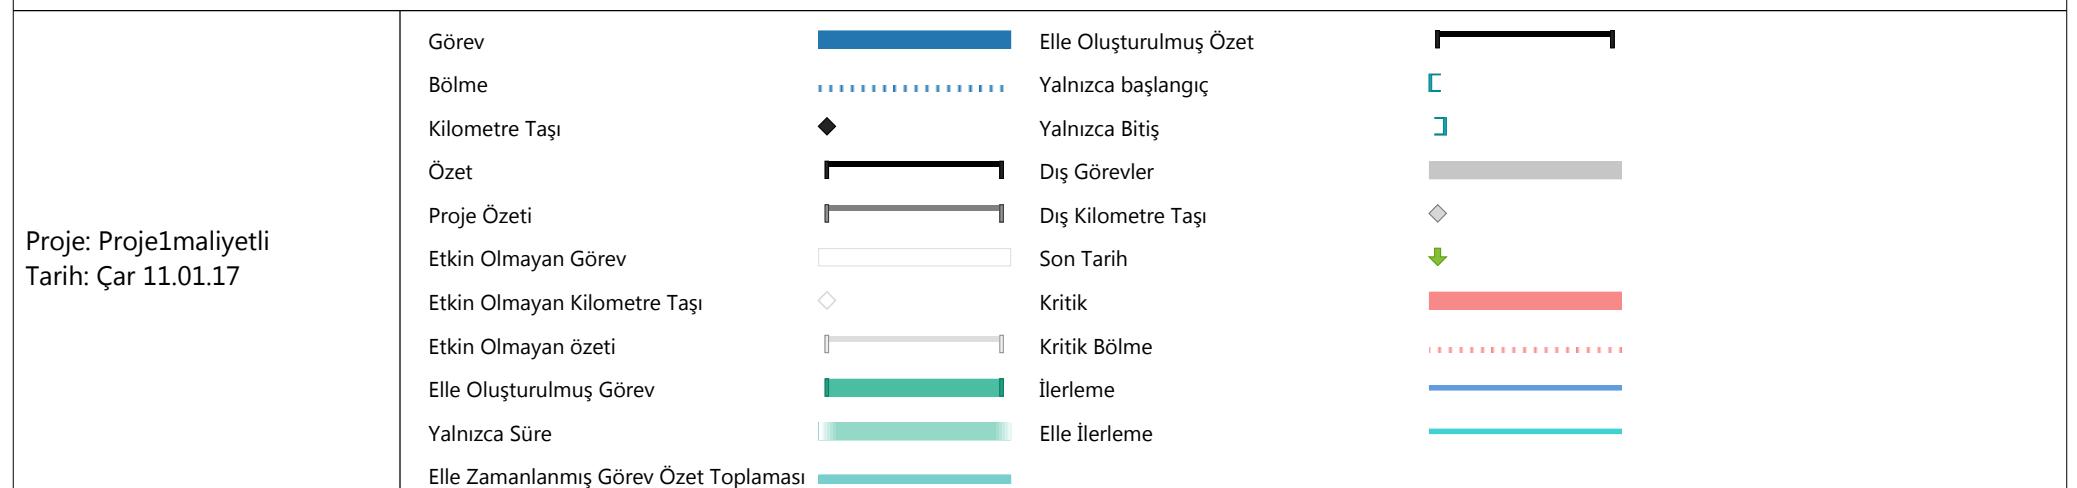

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Per 13.04 | 0 | 12 | Cum 14.04 | 0 | 12 | Cmt 15.04 | 0 | 12 | Paz 16.04 | 0 | 12 | Pzt 17.04 | 0 | 12 | Sal 18.04 | 0 | 12 | Çar 19.04 | 0 | 12 | Per 20.04 | 0 | 12 | Cum 21.04 | 0 | 12 | Cmt 22.04 | 0 | 12 | Paz 23.04 | 0 | 12 | Pzt 24.04 | 0 | 12 | Sal 25.04 | 0 | 12 | Çar 26.04 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| Per 13.04 0 | 12 | Cum 14.04 0 | 12 | Cmt 15.04 0 | 12 | Paz 16.04 0 | 12 | Pzt 17.04 0 | 12 | Sal 18.04 0 | 12 | Çar 19.04 0 | 12 | Per 20.04 0 | 12 | Cum 21.04 0 | 12 | Cmt 22.04 0 | 12 | Paz 23.04 0 | 12 | Pzt 24.04 0 | 12 | Sal 25.04 0 | 12 | Çar 26.04 0 | 12 |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| Per 13.04 0 | 12 | Cum 14.04 0 | 12 | Cmt 15.04 0 | 12 | Paz 16.04 0 | 12 | Pzt 17.04 0 | 12 | Sal 18.04 0 | 12 | Çar 19.04 0 | 12 | Per 20.04 0 | 12 | Cum 21.04 0 | 12 | Cmt 22.04 0 | 12 | Paz 23.04 0 | 12 | Pzt 24.04 0 | 12 | Sal 25.04 0 | 12 | Çar 26.04 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| Per 13.04 0 | 12 | Cum 14.04 0 | 12 | Cmt 15.04 0 | 12 | Paz 16.04 0 | 12 | Pzt 17.04 0 | 12 | Sal 18.04 0 | 12 | Çar 19.04 0 | 12 | Per 20.04 0 | 12 | Cum 21.04 0 | 12 | Cmt 22.04 0 | 12 | Paz 23.04 0 | 12 | Pzt 24.04 0 | 12 | Sal 25.04 0 | 12 | Çar 26.04 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| Per 13.04 0 | 12 | Cum 14.04 0 | 12 | Cmt 15.04 0 | 12 | Paz 16.04 0 | 12 | Pzt 17.04 0 | 12 | Sal 18.04 0 | 12 | Çar 19.04 0 | 12 | Per 20.04 0 | 12 | Cum 21.04 0 | 12 | Cmt 22.04 0 | 12 | Paz 23.04 0 | 12 | Pzt 24.04 0 | 12 | Sal 25.04 0 | 12 | Çar 26.04 0 | 12 |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|

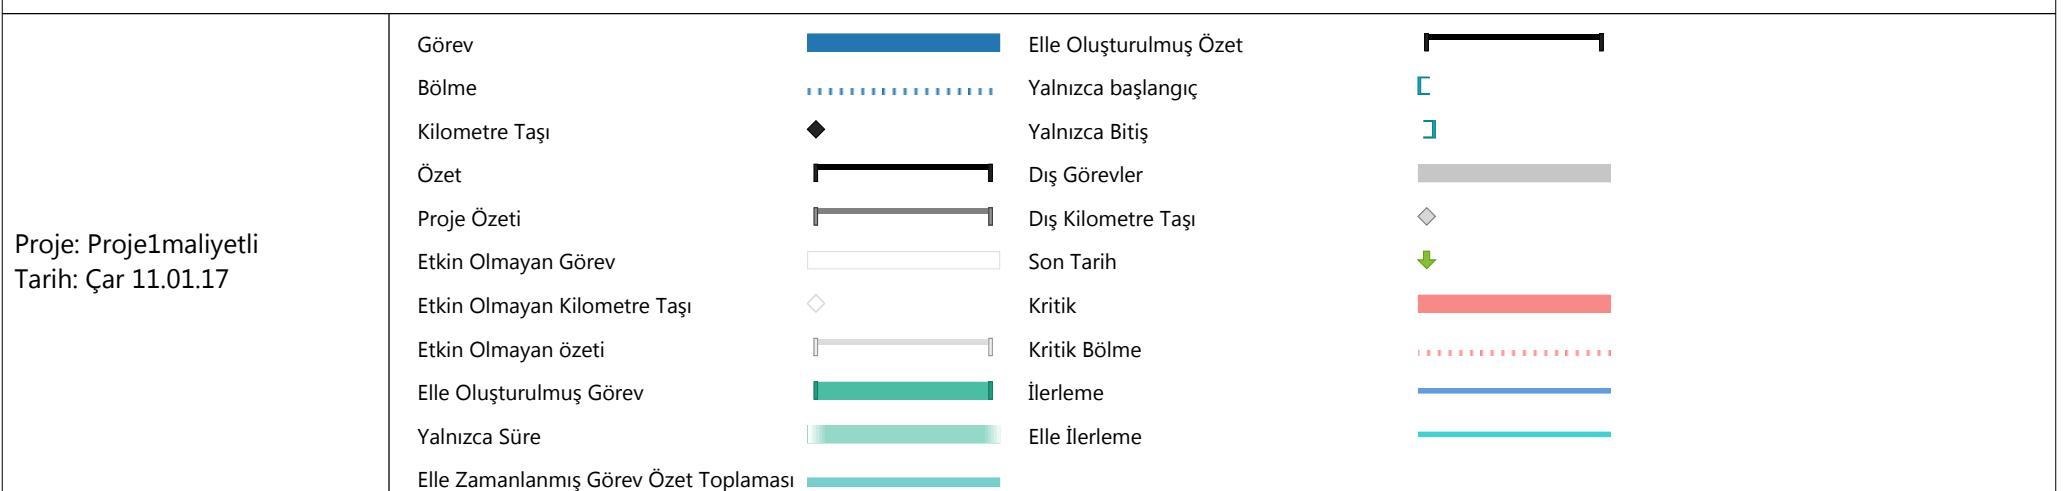

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| Per 13.04 0 | 12 | Cum 14.04 0 | 12 | Cmt 15.04 0 | 12 | Paz 16.04 0 | 12 | Pzt 17.04 0 | 12 | Sal 18.04 0 | 12 | Çar 19.04 0 | 12 | Per 20.04 0 | 12 | Cum 21.04 0 | 12 | Cmt 22.04 0 | 12 | Paz 23.04 0 | 12 | Pzt 24.04 0 | 12 | Sal 25.04 0 | 12 | Çar 26.04 0 | 12 |
|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Per 13.04 0 | Cum 14.04 12 | Cmt 15.04 0 | Paz 16.04 12 | Pzt 17.04 0 | Sal 18.04 12 | Çar 19.04 0 | Per 20.04 12 | Cum 21.04 0 | Cmt 22.04 12 | Paz 23.04 0 | Pzt 24.04 12 | Sal 25.04 0 | Çar 26.04 12 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

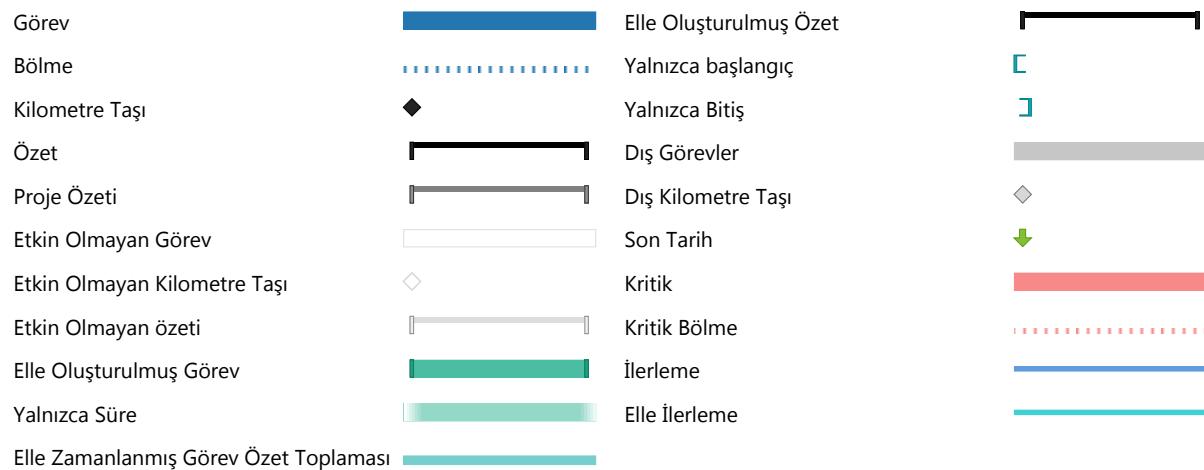

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 0 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 0 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 0 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 04 12 | Per 27.04 0 | Cum 28.04 12 | Cmt 29.04 0 | Paz 30.04 0 | Pzt 01.05 0 | Sal 02.05 12 | Çar 03.05 0 | Per 04.05 12 | Cum 05.05 0 | Cmt 06.05 0 | Paz 07.05 0 | Pzt 08.05 0 | Sal 09.05 0 | Çar 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

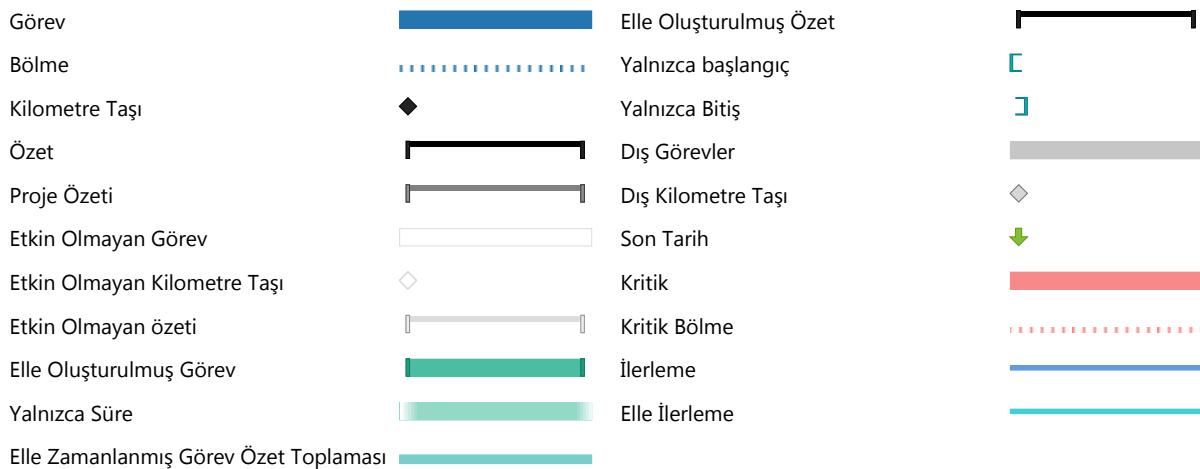

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Çar 10.05 0 12 | Per 11.05 0 12 | Cum 12.05 0 12 | Cmt 13.05 0 12 | Paz 14.05 0 12 | Pzt 15.05 0 12 | Sal 16.05 0 12 | Çar 17.05 0 12 | Per 18.05 0 12 | Cum 19.05 0 12 | Cmt 20.05 0 12 | Paz 21.05 0 12 | Pzt 22.05 0 12 | Sal 23.05 0 12 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Çar 10.05 0 12 | Per 11.05 0 12 | Cum 12.05 0 12 | Cmt 13.05 0 12 | Paz 14.05 0 12 | Pzt 15.05 0 12 | Sal 16.05 0 12 | Çar 17.05 0 12 | Per 18.05 0 12 | Cum 19.05 0 12 | Cmt 20.05 0 12 | Paz 21.05 0 12 | Pzt 22.05 0 12 | Sal 23.05 0 12 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Çar 10.05 0 | Per 11.05 0 | Cum 12.05 0 | Cmt 13.05 0 | Paz 14.05 0 | Pzt 15.05 0 | Sal 16.05 0 | Çar 17.05 0 | Per 18.05 0 | Cum 19.05 0 | Cmt 20.05 0 | Paz 21.05 0 | Pzt 22.05 0 | Sal 23.05 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Çar 10.05 0 | Per 11.05 0 | Cum 12.05 0 | Cmt 13.05 0 | Paz 14.05 0 | Pzt 15.05 0 | Sal 16.05 0 | Çar 17.05 0 | Per 18.05 0 | Cum 19.05 0 | Cmt 20.05 0 | Paz 21.05 0 | Pzt 22.05 0 | Sal 23.05 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Çar 10.05 0 | Per 11.05 12 | Cum 12.05 0 | Cmt 13.05 12 | Paz 14.05 0 | Pzt 15.05 12 | Sal 16.05 0 | Çar 17.05 12 | Per 18.05 0 | Cum 19.05 12 | Cmt 20.05 0 | Paz 21.05 12 | Pzt 22.05 0 | Sal 23.05 12 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Çar 10.05 0 | Per 11.05 0 | Cum 12.05 0 | Cmt 13.05 0 | Paz 14.05 0 | Pzt 15.05 0 | Sal 16.05 0 | Çar 17.05 0 | Per 18.05 0 | Cum 19.05 0 | Cmt 20.05 0 | Paz 21.05 0 | Pzt 22.05 0 | Sal 23.05 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 05 12 | Çar 24.05 0 | Per 25.05 12 | Cum 26.05 0 | Cmt 27.05 0 | Paz 28.05 12 | Pzt 29.05 0 | Sal 30.05 0 | Çar 31.05 12 | Per 01.06 0 | Cum 02.06 0 | Cmt 03.06 0 | Paz 04.06 0 | Pzt 05.06 0 | Sal 0 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 05 12 | Çar 24.05 0 | Per 25.05 12 | Cum 26.05 0 | Cmt 27.05 0 | Paz 28.05 12 | Pzt 29.05 0 | Sal 30.05 12 | Çar 31.05 0 | Per 01.06 12 | Cum 02.06 0 | Cmt 03.06 0 | Paz 04.06 12 | Pzt 05.06 0 | Sal 0 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 05 12 | Çar 0 | 24.05 12 | Per 0 | 25.05 12 | Cum 0 | 26.05 12 | Cmt 0 | 27.05 12 | Paz 0 | 28.05 12 | Pzt 0 | 29.05 12 | Sal 0 | 30.05 12 | Çar 0 | 31.05 12 | Per 0 | 01.06 12 | Cum 0 | 02.06 12 | Cmt 0 | 03.06 12 | Paz 0 | 04.06 12 | Pzt 0 | 05.06 12 | Sal 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

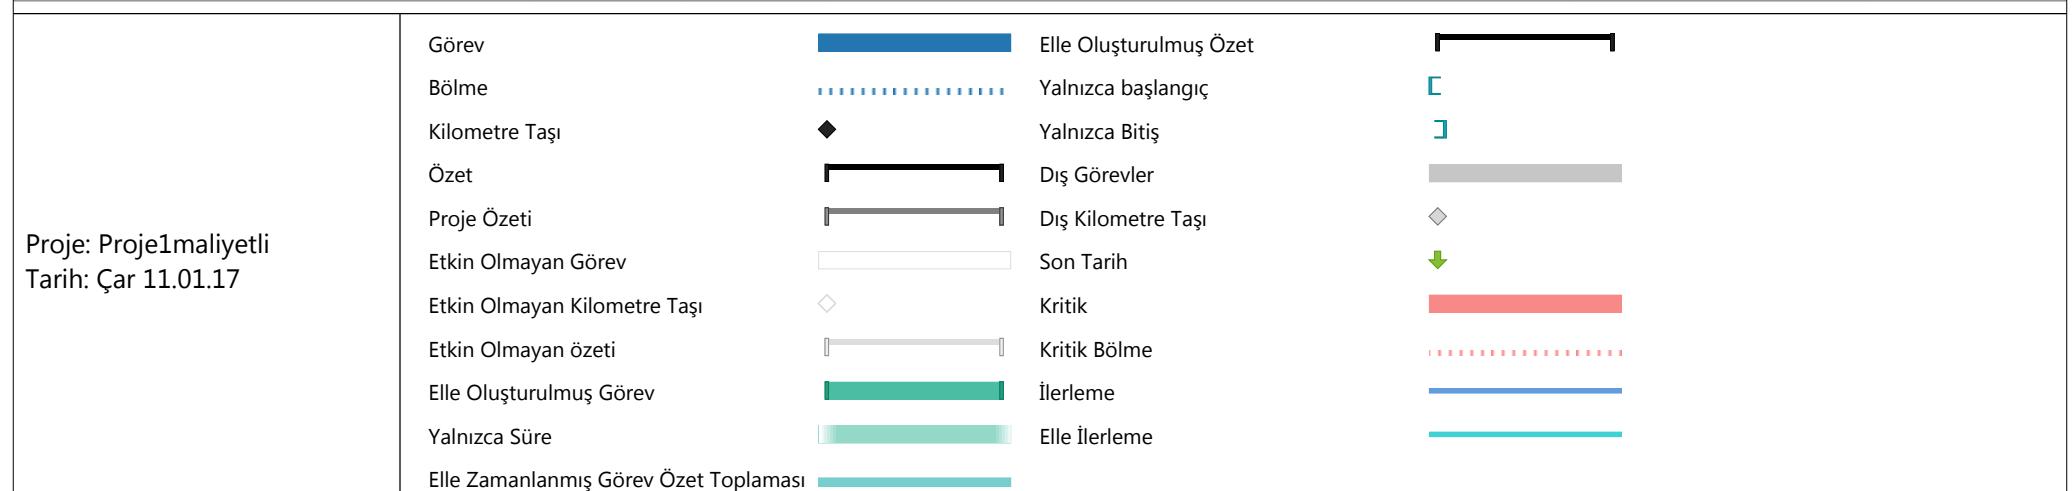


| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 05 12 | Çar 24.05 0 | Per 25.05 12 | Cum 26.05 0 | Cmt 27.05 0 | Paz 28.05 12 | Pzt 29.05 0 | Sal 30.05 12 | Çar 31.05 0 | Per 01.06 12 | Cum 02.06 0 | Cmt 03.06 0 | Paz 04.06 12 | Pzt 05.06 0 | Sal 0 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

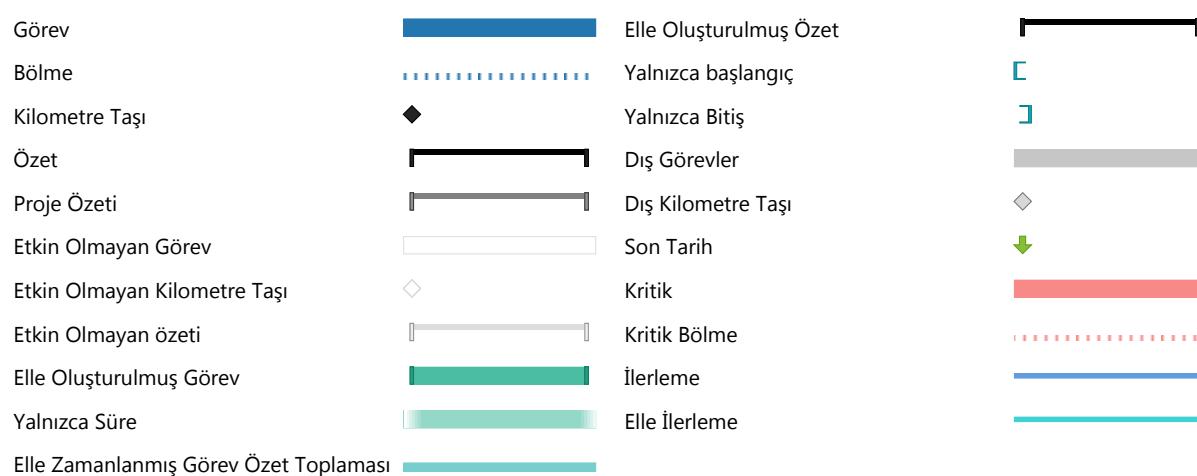

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 05 12 | Çar 0 | 24.05 12 | Per 0 | 25.05 12 | Cum 0 | 26.05 12 | Cmt 0 | 27.05 12 | Paz 0 | 28.05 12 | Pzt 0 | 29.05 12 | Sal 0 | 30.05 12 | Çar 0 | 31.05 12 | Per 0 | 01.06 12 | Cum 0 | 02.06 12 | Cmt 0 | 03.06 12 | Paz 0 | 04.06 12 | Pzt 0 | 05.06 12 | Sal 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

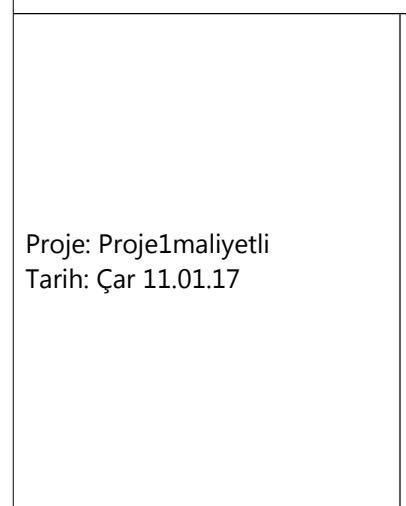

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 05 12 | Çar 0 | 24.05 12 | Per 0 | 25.05 12 | Cum 0 | 26.05 12 | Cmt 0 | 27.05 12 | Paz 0 | 28.05 12 | Pzt 0 | 29.05 12 | Sal 0 | 30.05 12 | Çar 0 | 31.05 12 | Per 0 | 01.06 12 | Cum 0 | 02.06 12 | Cmt 0 | 03.06 12 | Paz 0 | 04.06 12 | Pzt 0 | 05.06 12 | Sal 0 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 05 12 | Çar 0 | 24.05 12 | Per 0 | 25.05 12 | Cum 0 | 26.05 12 | Cmt 0 | 27.05 12 | Paz 0 | 28.05 12 | Pzt 0 | 29.05 12 | Sal 0 | 30.05 12 | Çar 0 | 31.05 12 | Per 0 | 01.06 12 | Cum 0 | 02.06 12 | Cmt 0 | 03.06 12 | Paz 0 | 04.06 12 | Pzt 0 | 05.06 12 | Sal 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|
| Sal 06.06 | 0 | 12 | | Çar 07.06 | 0 | 12 | | Per 08.06 | 0 | 12 | | Cum 09.06 | 0 | 12 | | Cmt 10.06 | 0 | 12 | | Paz 11.06 | 0 | 12 | | Pzt 12.06 | 0 | 12 | | Sal 13.06 | 0 | 12 | | Çar 14.06 | 0 | 12 | | Per 15.06 | 0 | 12 | | Cum 16.06 | 0 | 12 | | Cmt 17.06 | 0 | 12 | | Paz 18.06 | 0 | 12 | | Pzt 19.06 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|--|-----------|---|----|




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|
| Sal 06.06 0 | 12 | | Çar 07.06 0 | 12 | | Per 08.06 0 | 12 | | Cum 09.06 0 | 12 | | Cmt 10.06 0 | 12 | | Paz 11.06 0 | 12 | | Pzt 12.06 0 | 12 | | Sal 13.06 0 | 12 | | Çar 14.06 0 | 12 | | Per 15.06 0 | 12 | | Cum 16.06 0 | 12 | | Cmt 17.06 0 | 12 | | Paz 18.06 0 | 12 | | Pzt 19.06 0 | 12 |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|
| Sal 06.06 0 | 12 | | Çar 07.06 0 | 12 | | Per 08.06 0 | 12 | | Cum 09.06 0 | 12 | | Cmt 10.06 0 | 12 | | Paz 11.06 0 | 12 | | Pzt 12.06 0 | 12 | | Sal 13.06 0 | 12 | | Çar 14.06 0 | 12 | | Per 15.06 0 | 12 | | Cum 16.06 0 | 12 | | Cmt 17.06 0 | 12 | | Paz 18.06 0 | 12 | | Pzt 19.06 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

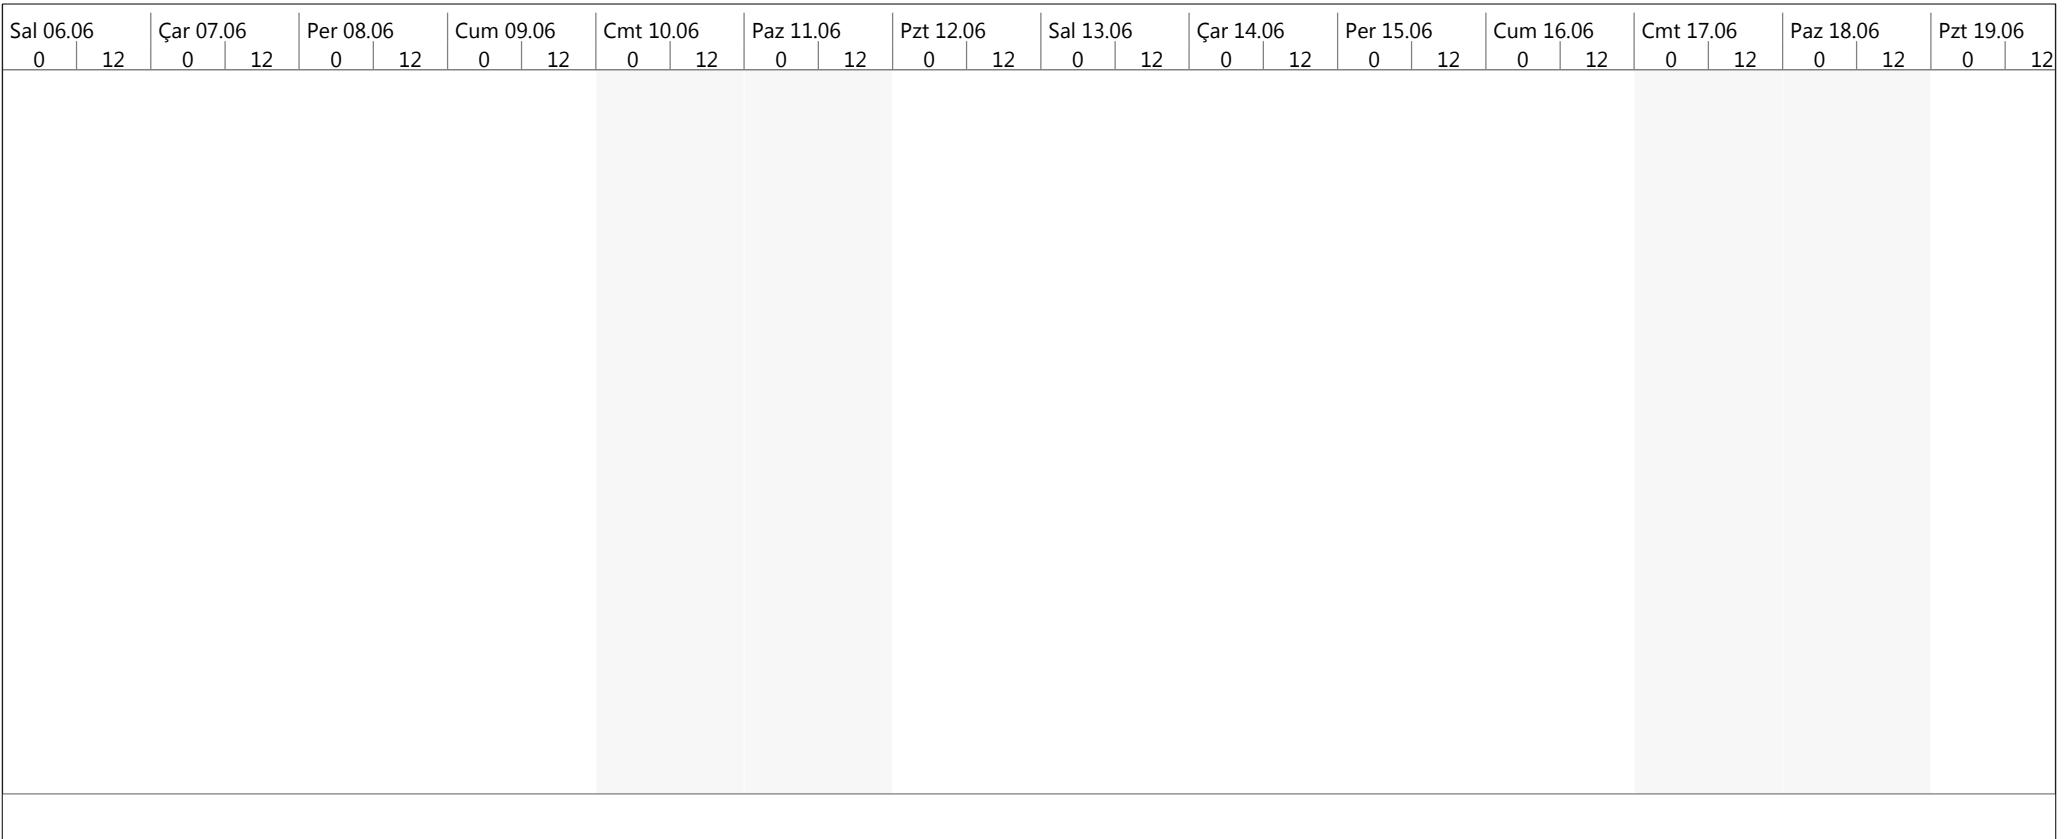

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|
| Sal 06.06 0 | 12 | | Çar 07.06 0 | 12 | | Per 08.06 0 | 12 | | Cum 09.06 0 | 12 | | Cmt 10.06 0 | 12 | | Paz 11.06 0 | 12 | | Pzt 12.06 0 | 12 | | Sal 13.06 0 | 12 | | Çar 14.06 0 | 12 | | Per 15.06 0 | 12 | | Cum 16.06 0 | 12 | | Cmt 17.06 0 | 12 | | Paz 18.06 0 | 12 | | Pzt 19.06 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|
| Sal 06.06 0 | 12 | | Çar 07.06 0 | 12 | | Per 08.06 0 | 12 | | Cum 09.06 0 | 12 | | Cmt 10.06 0 | 12 | | Paz 11.06 0 | 12 | | Pzt 12.06 0 | 12 | | Sal 13.06 0 | 12 | | Çar 14.06 0 | 12 | | Per 15.06 0 | 12 | | Cum 16.06 0 | 12 | | Cmt 17.06 0 | 12 | | Paz 18.06 0 | 12 | | Pzt 19.06 0 | 12 |
|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|--|----------------|----|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sal 06.06 0 | Çar 07.06 12 | Per 08.06 0 | Cum 09.06 12 | Cmt 10.06 0 | Paz 11.06 12 | Pzt 12.06 0 | Sal 13.06 12 | Çar 14.06 0 | Per 15.06 12 | Cum 16.06 0 | Cmt 17.06 0 | Paz 18.06 0 | Pzt 19.06 12 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 06 12 | Sal 20.06 0 | Çar 21.06 0 | Per 22.06 0 | Cum 23.06 0 | Cmt 24.06 0 | Paz 25.06 0 | Pzt 26.06 0 | Sal 27.06 0 | Çar 28.06 0 | Per 29.06 0 | Cum 30.06 0 | Cmt 01.07 0 | Paz 02.07 0 | Pzt 0 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|
| 06.12 | Sal 20.06 | 0 | 12 | Çar 21.06 | 0 | 12 | Per 22.06 | 0 | 12 | Cum 23.06 | 0 | 12 | Cmt 24.06 | 0 | 12 | Paz 25.06 | 0 | 12 | Pzt 26.06 | 0 | 12 | Sal 27.06 | 0 | 12 | Çar 28.06 | 0 | 12 | Per 29.06 | 0 | 12 | Cum 30.06 | 0 | 12 | Cmt 01.07 | 0 | 12 | Paz 02.07 | 0 | 12 | Pzt 03.07 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

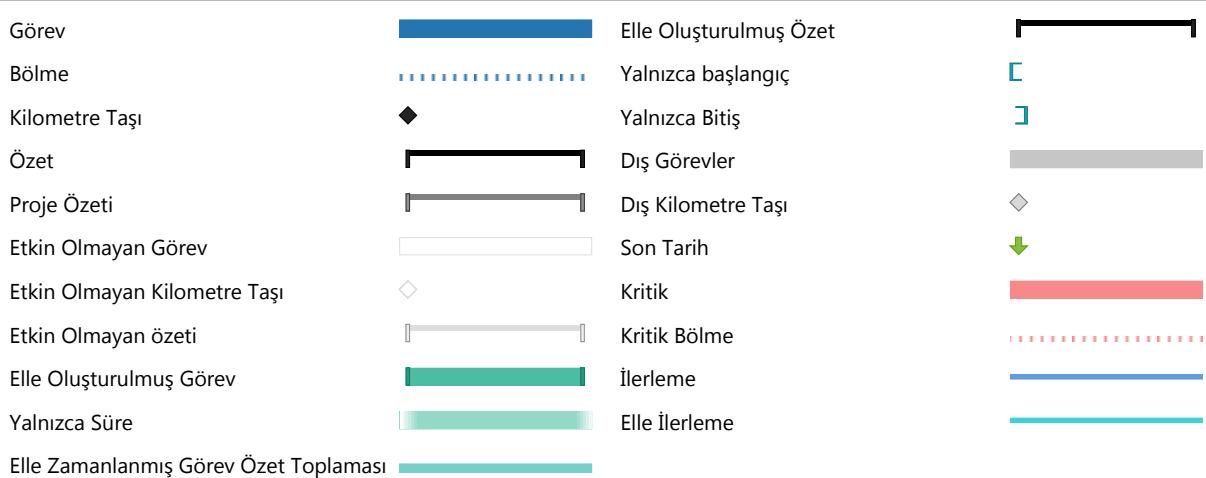


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|
| 06.12 | Sal 20.06 | 0 | 12 | Çar 21.06 | 0 | 12 | Per 22.06 | 0 | 12 | Cum 23.06 | 0 | 12 | Cmt 24.06 | 0 | 12 | Paz 25.06 | 0 | 12 | Pzt 26.06 | 0 | 12 | Sal 27.06 | 0 | 12 | Çar 28.06 | 0 | 12 | Per 29.06 | 0 | 12 | Cum 30.06 | 0 | 12 | Cmt 01.07 | 0 | 12 | Paz 02.07 | 0 | 12 | Pzt 03.07 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

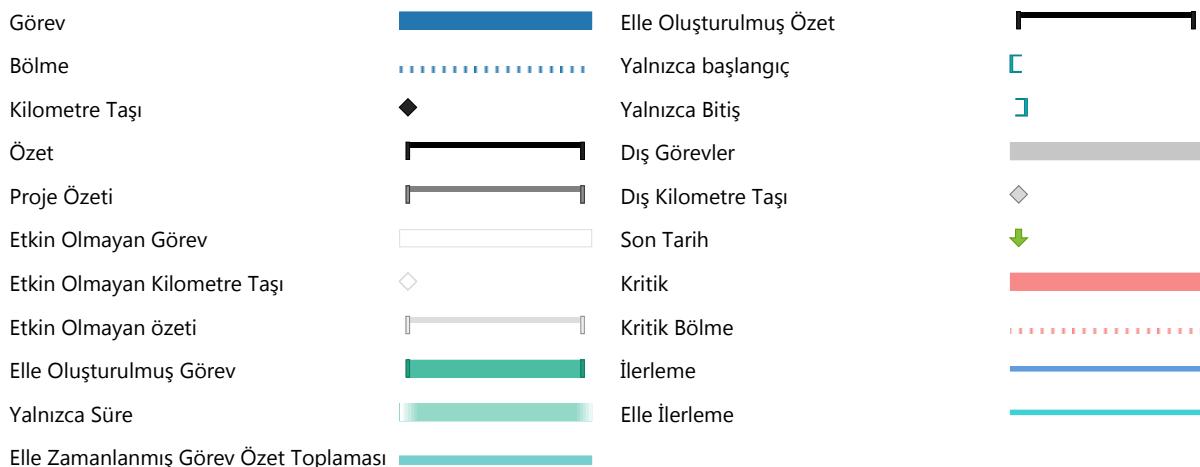


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|
| 06.12 | Sal 20.06 | 0 | 12 | Çar 21.06 | 0 | 12 | Per 22.06 | 0 | 12 | Cum 23.06 | 0 | 12 | Cmt 24.06 | 0 | 12 | Paz 25.06 | 0 | 12 | Pzt 26.06 | 0 | 12 | Sal 27.06 | 0 | 12 | Çar 28.06 | 0 | 12 | Per 29.06 | 0 | 12 | Cum 30.06 | 0 | 12 | Cmt 01.07 | 0 | 12 | Paz 02.07 | 0 | 12 | Pzt 03.07 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

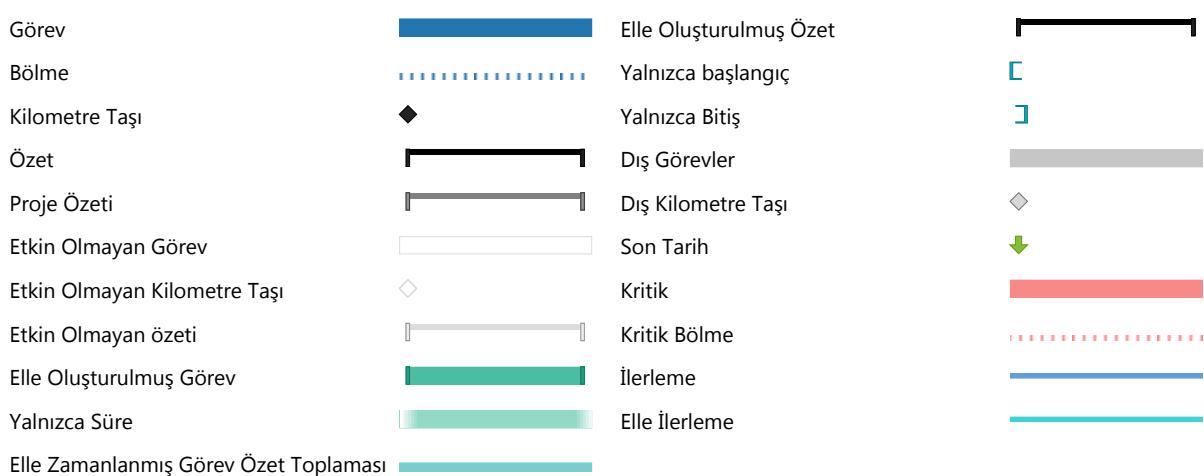

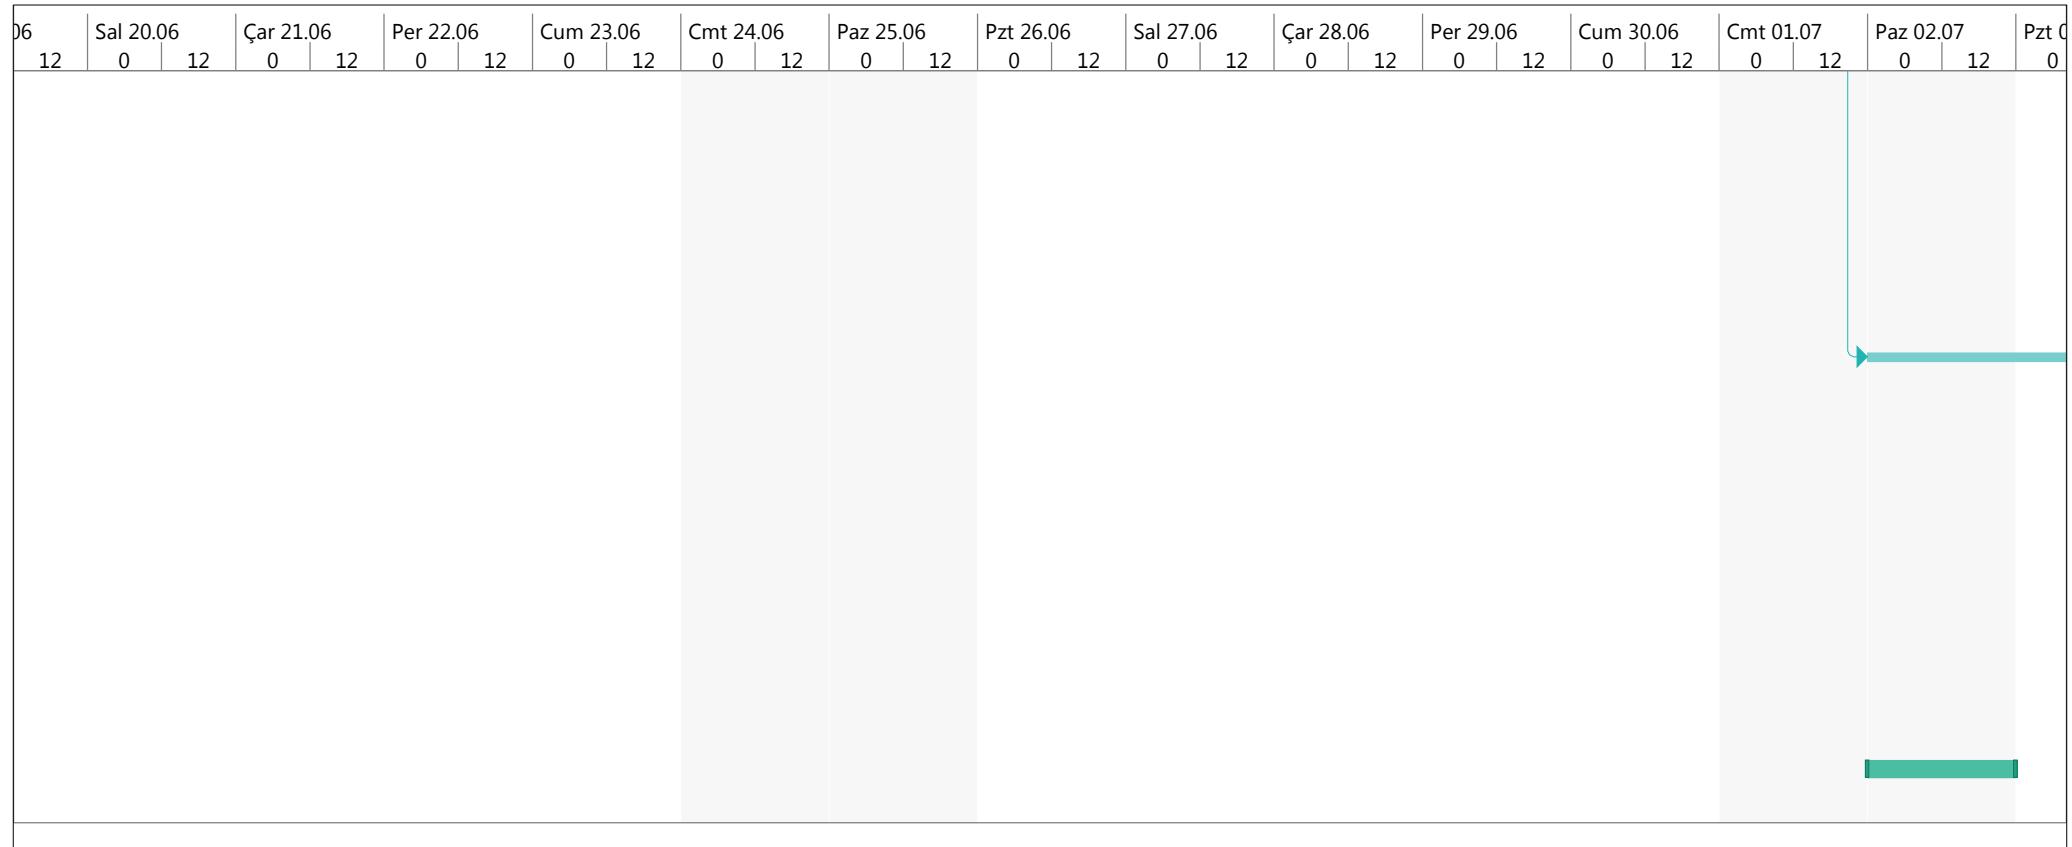

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

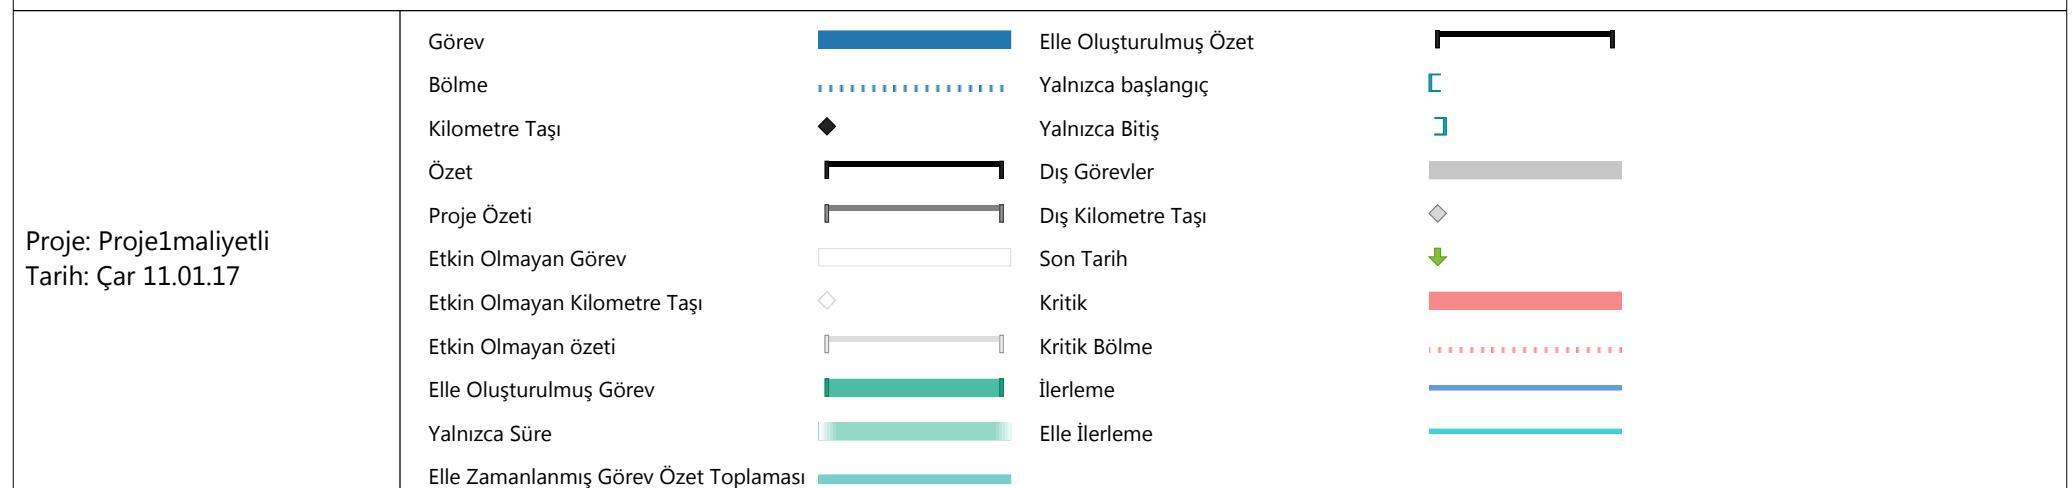

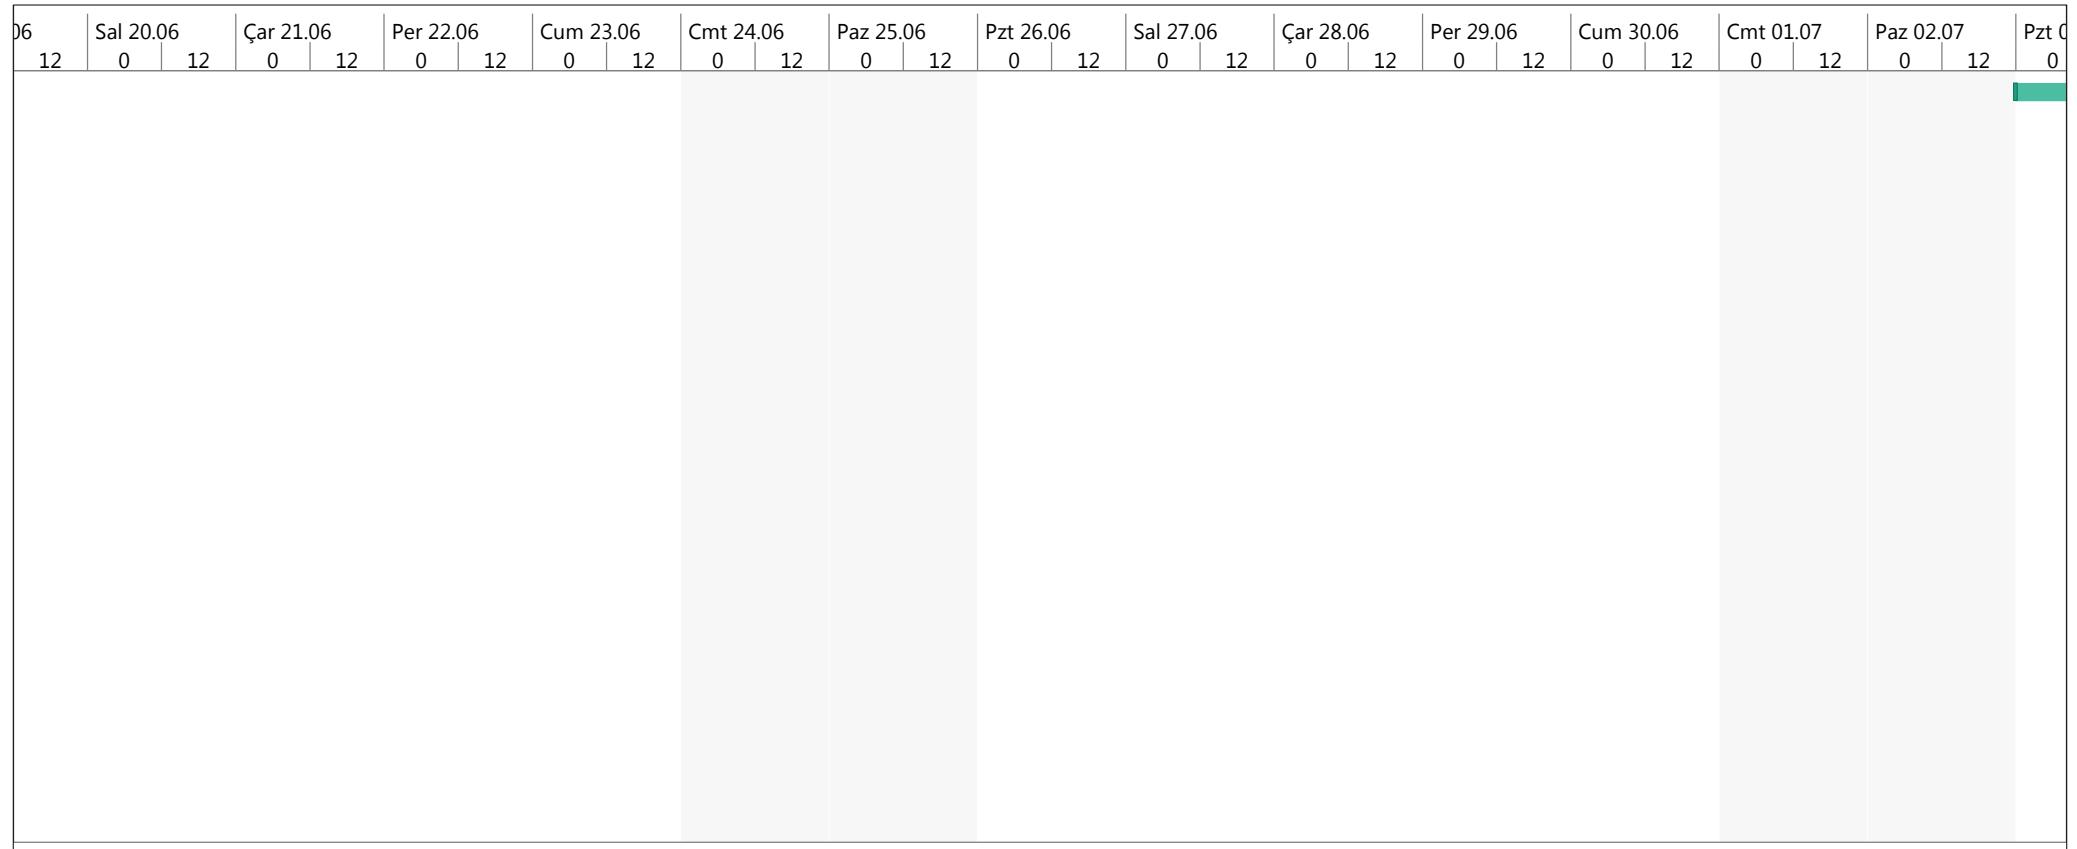


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|
| 06.12 | Sal 20.06 | 0 | 12 | Çar 21.06 | 0 | 12 | Per 22.06 | 0 | 12 | Cum 23.06 | 0 | 12 | Cmt 24.06 | 0 | 12 | Paz 25.06 | 0 | 12 | Pzt 26.06 | 0 | 12 | Sal 27.06 | 0 | 12 | Çar 28.06 | 0 | 12 | Per 29.06 | 0 | 12 | Cum 30.06 | 0 | 12 | Cmt 01.07 | 0 | 12 | Paz 02.07 | 0 | 12 | Pzt 03.07 | 0 |
|-------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

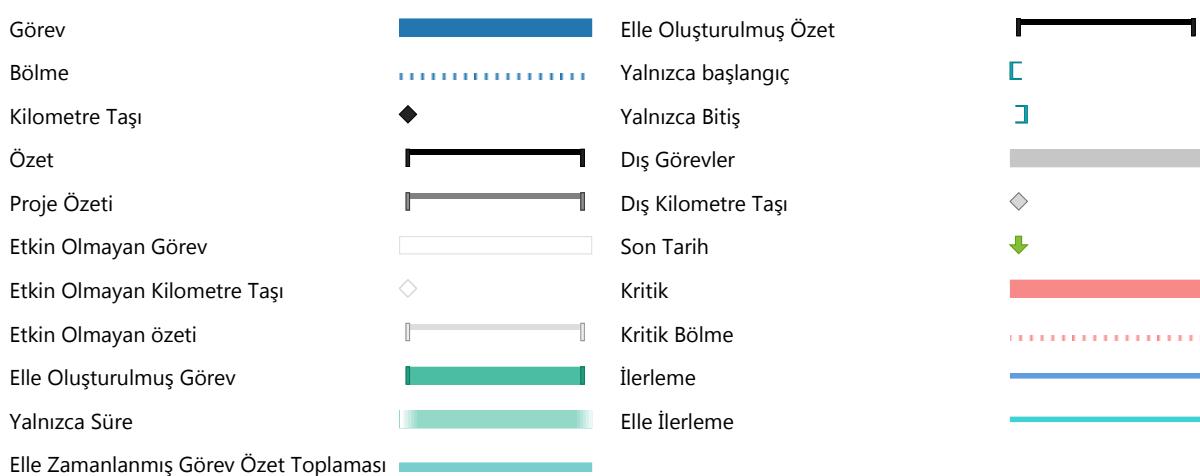

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Pzt 03.07 | 0 | 12 | Sal 04.07 | 0 | 12 | Çar 05.07 | 0 | 12 | Per 06.07 | 0 | 12 | Cum 07.07 | 0 | 12 | Cmt 08.07 | 0 | 12 | Paz 09.07 | 0 | 12 | Pzt 10.07 | 0 | 12 | Sal 11.07 | 0 | 12 | Çar 12.07 | 0 | 12 | Per 13.07 | 0 | 12 | Cum 14.07 | 0 | 12 | Cmt 15.07 | 0 | 12 | Paz 16.07 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pzt 03.07 0 | Sal 04.07 12 | Çar 05.07 0 | Per 06.07 12 | Cum 07.07 0 | Cmt 08.07 12 | Paz 09.07 0 | Pzt 10.07 12 | Sal 11.07 0 | Çar 12.07 12 | Per 13.07 0 | Cum 14.07 0 | Cmt 15.07 12 | Paz 16.07 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Pzt 03.07 0 | Sal 04.07 12 | Çar 05.07 0 | Per 06.07 12 | Cum 07.07 0 | Cmt 08.07 12 | Paz 09.07 0 | Pzt 10.07 12 | Sal 11.07 0 | Çar 12.07 12 | Per 13.07 0 | Cum 14.07 12 | Cmt 15.07 0 | Paz 16.07 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pzt 03.07 0 | Sal 04.07 12 | Çar 05.07 0 | Per 06.07 12 | Cum 07.07 0 | Cmt 08.07 12 | Paz 09.07 0 | Pzt 10.07 12 | Sal 11.07 0 | Çar 12.07 12 | Per 13.07 0 | Cum 14.07 0 | Cmt 15.07 12 | Paz 16.07 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pzt 03.07 0 | Sal 04.07 12 | Çar 05.07 0 | Per 06.07 12 | Cum 07.07 0 | Cmt 08.07 12 | Paz 09.07 0 | Pzt 10.07 12 | Sal 11.07 0 | Çar 12.07 12 | Per 13.07 0 | Cum 14.07 0 | Cmt 15.07 12 | Paz 16.07 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |



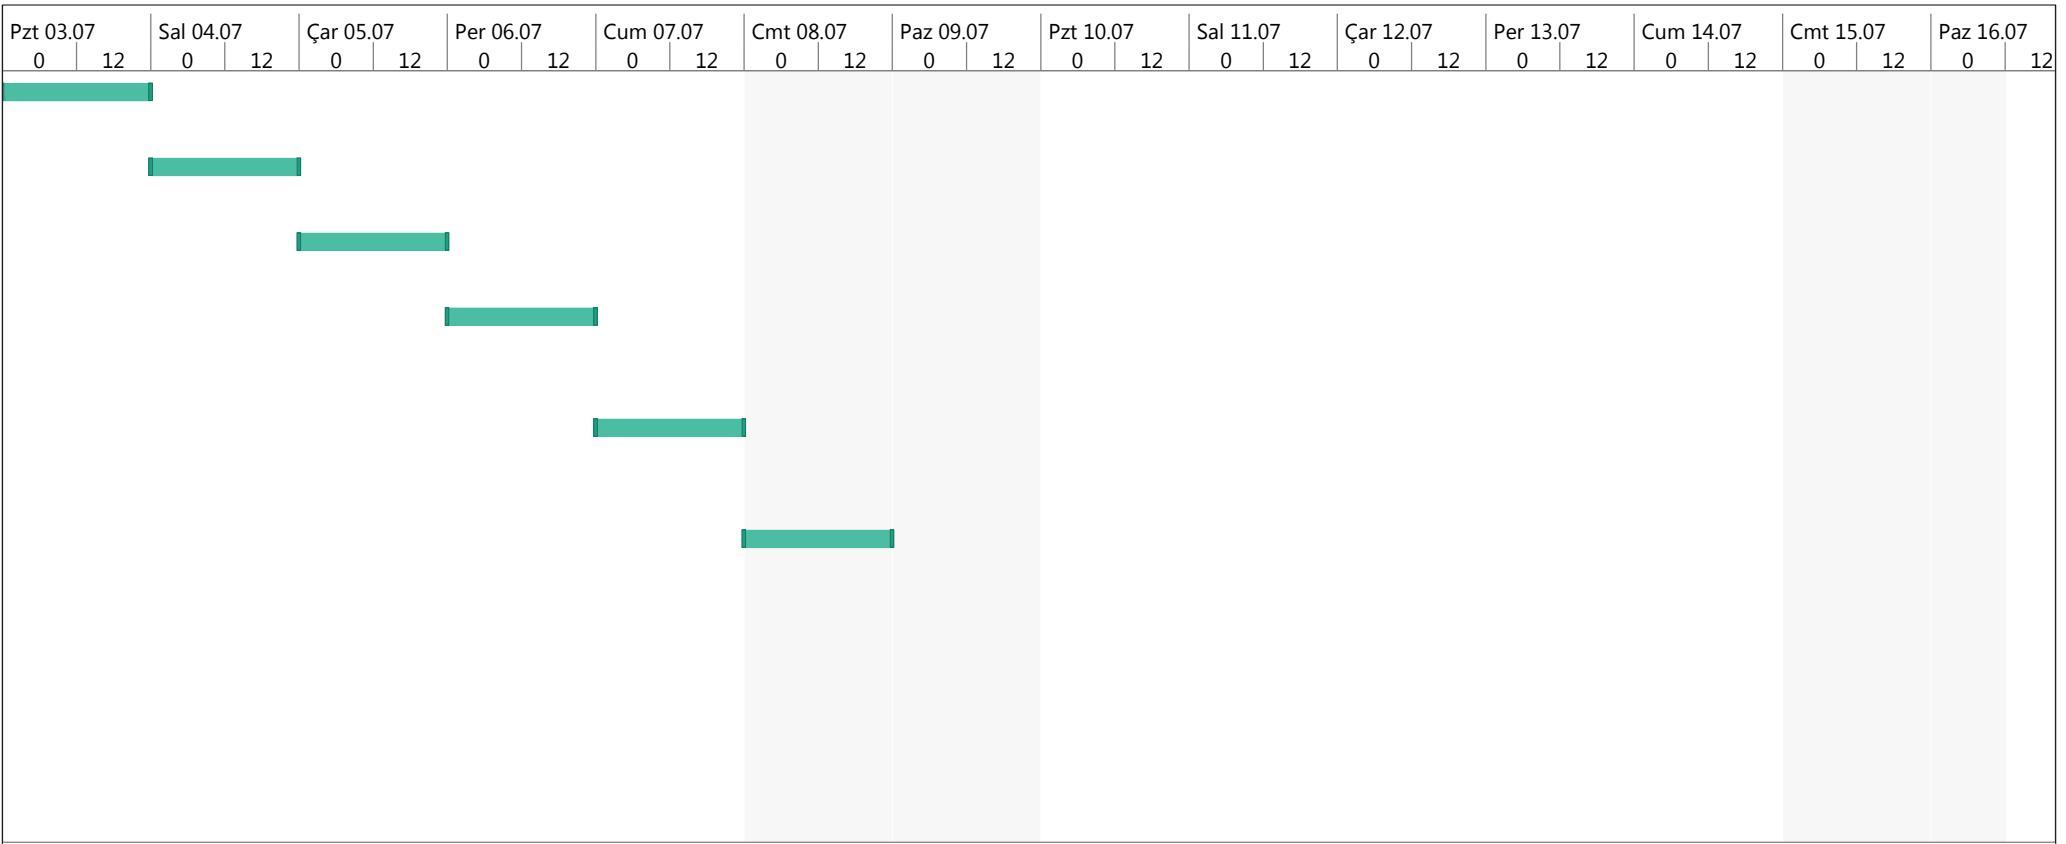

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pzt 03.07 0 | Sal 04.07 12 | Çar 05.07 0 | Per 06.07 12 | Cum 07.07 0 | Cmt 08.07 12 | Paz 09.07 0 | Pzt 10.07 12 | Sal 11.07 0 | Çar 12.07 12 | Per 13.07 0 | Cum 14.07 0 | Cmt 15.07 12 | Paz 16.07 0 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|





| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 07 12 | Pzt 17.07 0 | Sal 18.07 12 | Çar 19.07 0 | Per 20.07 12 | Cum 21.07 0 | Cmt 22.07 12 | Paz 23.07 0 | Pzt 24.07 12 | Sal 25.07 0 | Çar 26.07 12 | Per 27.07 0 | Cum 28.07 12 | Cmt 29.07 0 | Paz 30.07 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 07 12 | Pzt 17.07 0 | Sal 18.07 12 | Çar 19.07 0 | Per 20.07 12 | Cum 21.07 0 | Cmt 22.07 12 | Paz 23.07 0 | Pzt 24.07 12 | Sal 25.07 0 | Çar 26.07 12 | Per 27.07 0 | Cum 28.07 12 | Cmt 29.07 0 | Paz 30.07 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

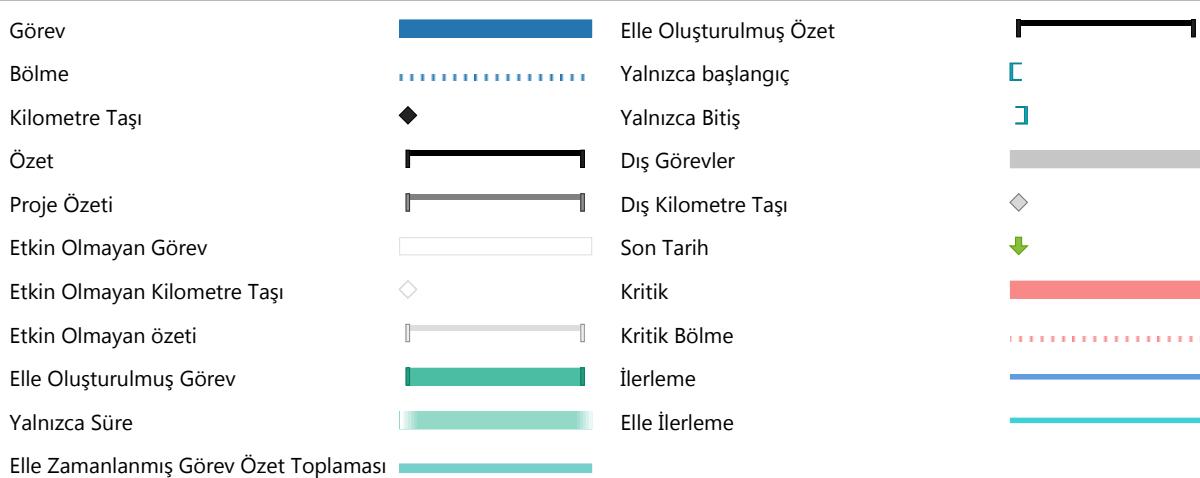

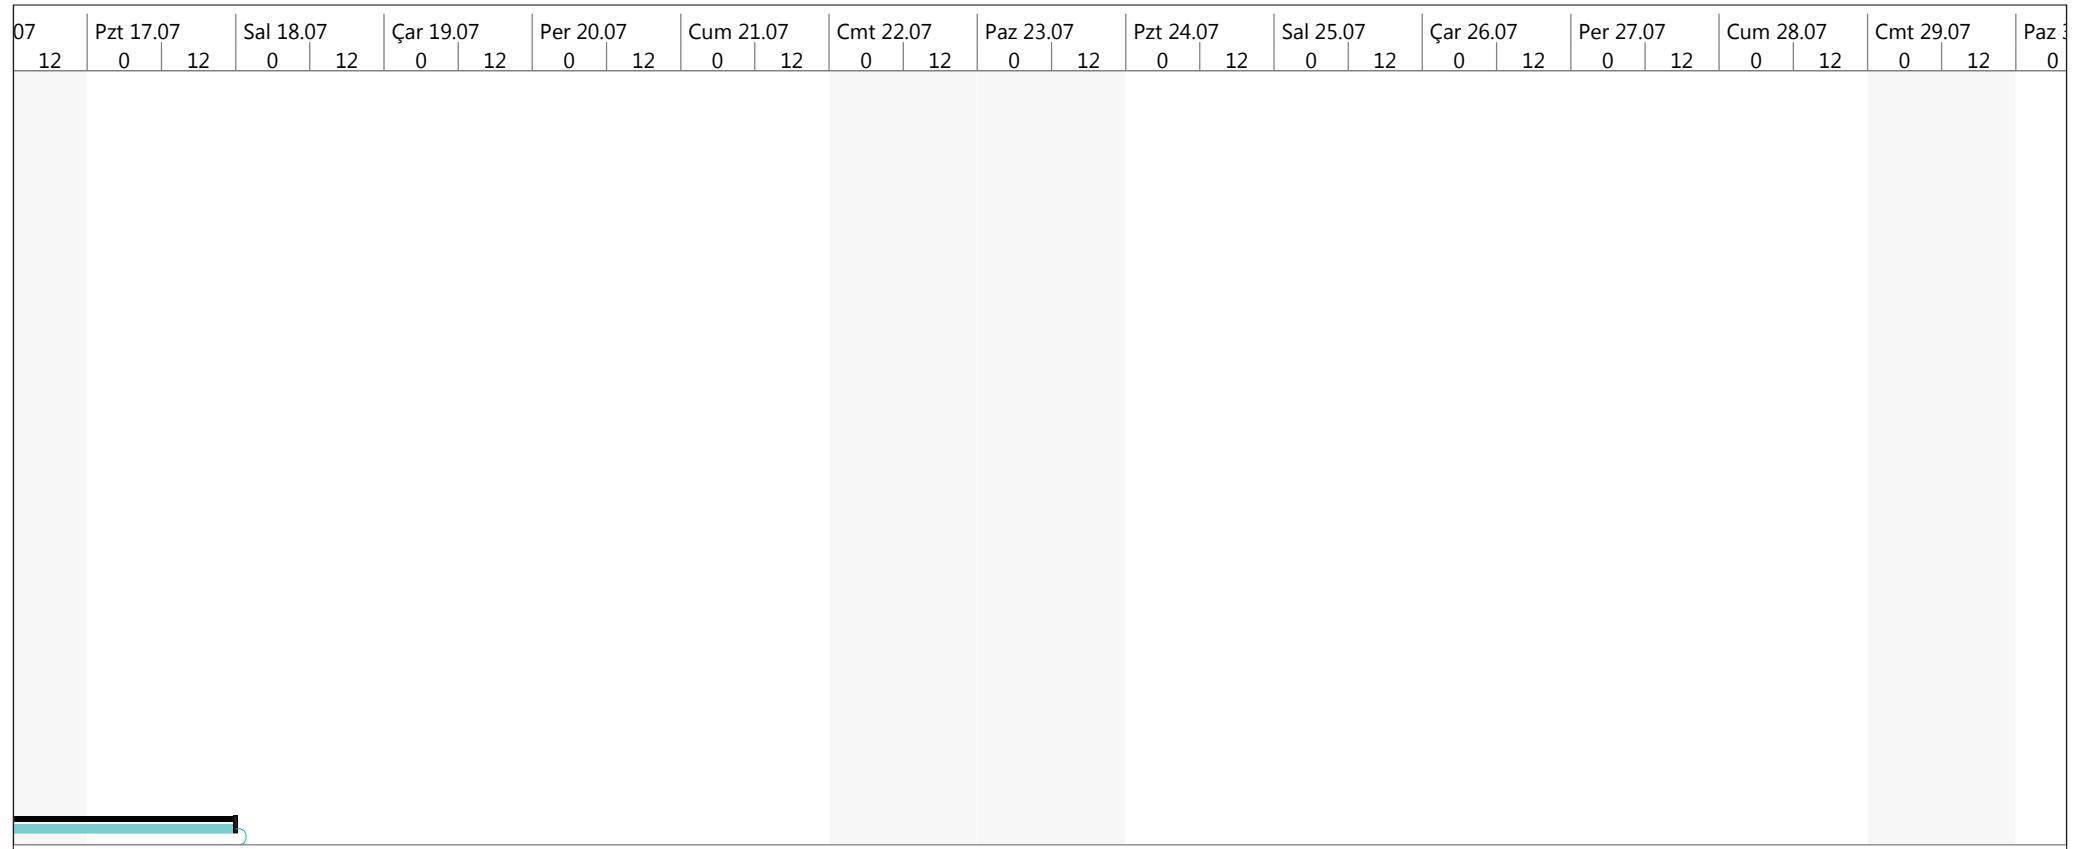


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

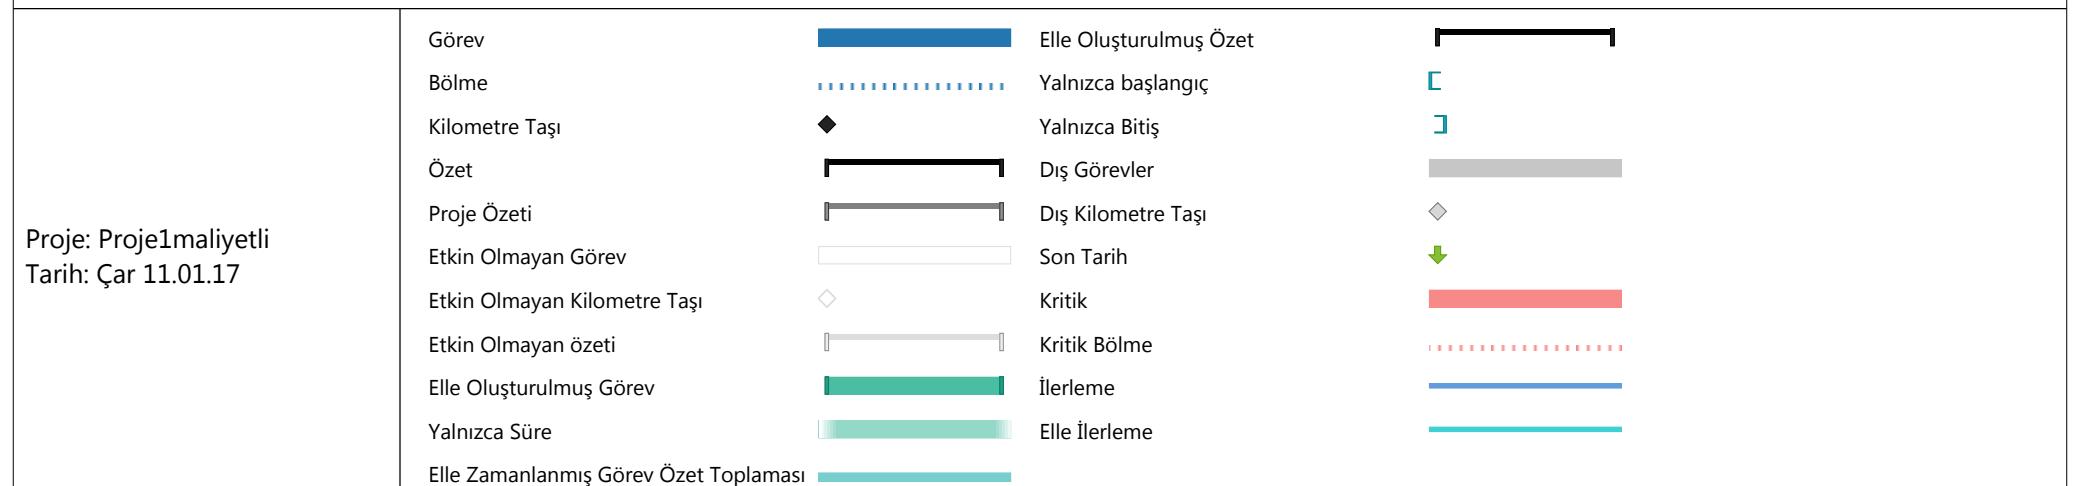


| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 12 | Pzt 17.07 0 | Sal 18.07 12 | Çar 19.07 0 | Per 20.07 0 | Cum 21.07 12 | Cmt 22.07 0 | Paz 23.07 0 | Pzt 24.07 0 | Sal 25.07 0 | Çar 26.07 0 | Per 27.07 0 | Cum 28.07 0 | Cmt 29.07 0 | Paz 30.07 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |





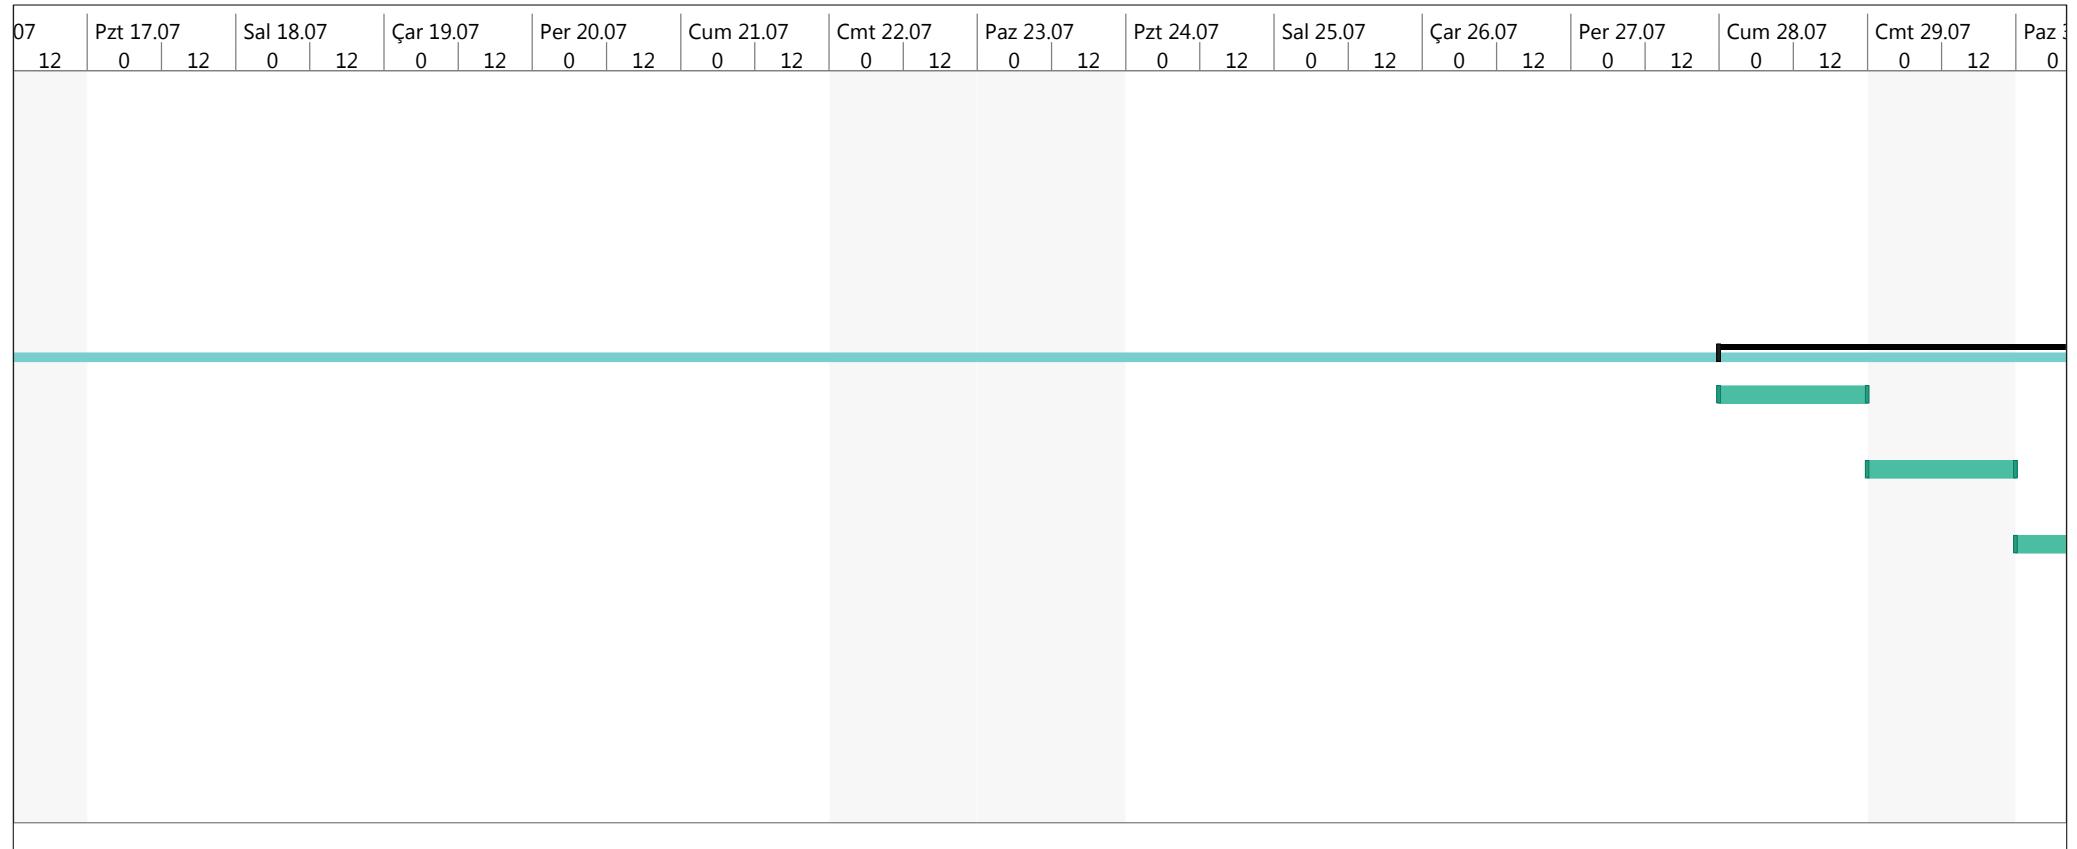

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

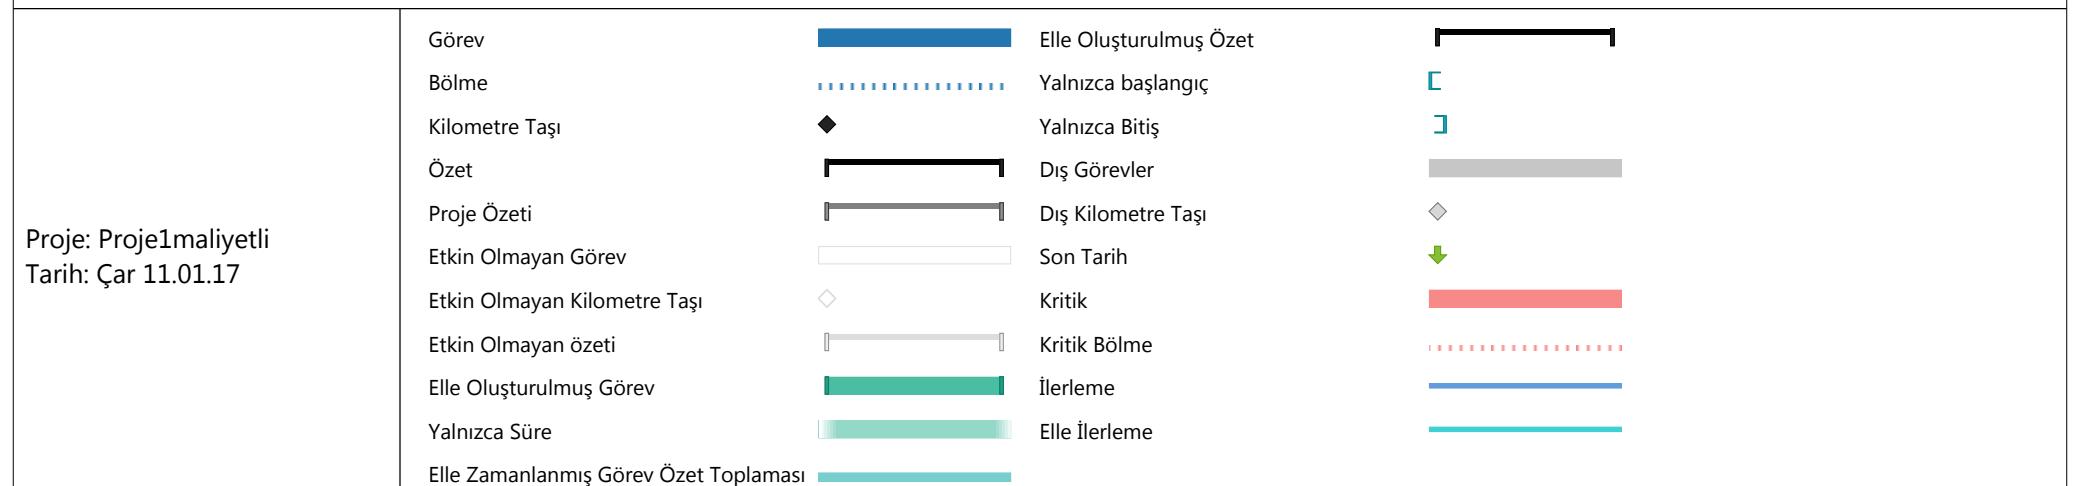

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 07 12 | Pzt 17.07 0 | Sal 18.07 12 | Çar 19.07 0 | Per 20.07 0 | Cum 21.07 12 | Cmt 22.07 0 | Paz 23.07 0 | Pzt 24.07 0 | Sal 25.07 12 | Çar 26.07 0 | Per 27.07 0 | Cum 28.07 12 | Cmt 29.07 0 | Paz 30.07 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|

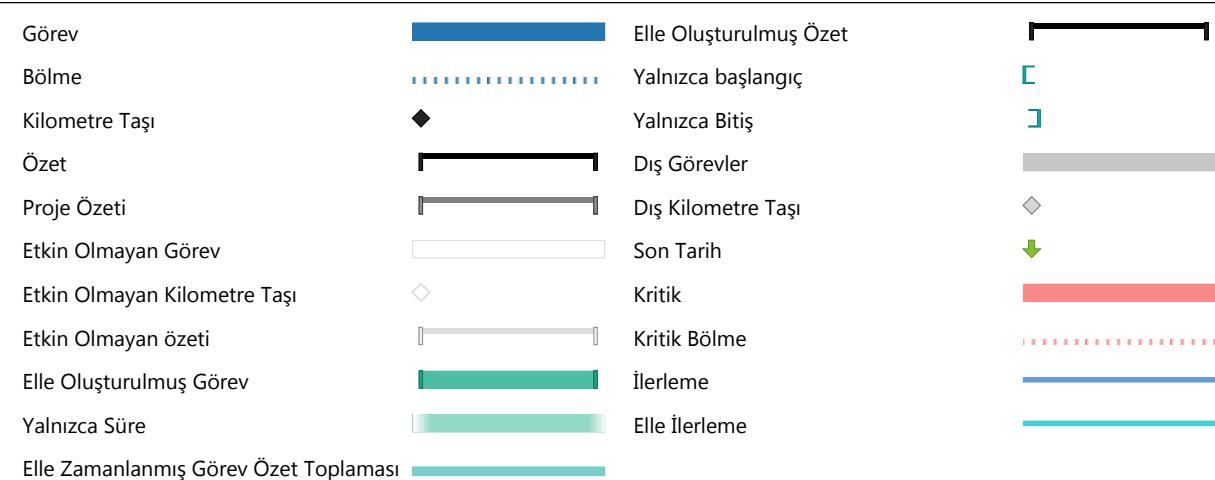


| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 07 12 | Pzt 17.07 0 | Sal 18.07 12 | Çar 19.07 0 | Per 20.07 0 | Cum 21.07 12 | Cmt 22.07 0 | Paz 23.07 0 | Pzt 24.07 0 | Sal 25.07 12 | Çar 26.07 0 | Per 27.07 0 | Cum 28.07 12 | Cmt 29.07 0 | Paz 30.07 0 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Paz 30.07 0 12 | Pzt 31.07 0 12 | Sal 01.08 0 12 | Çar 02.08 0 12 | Per 03.08 0 12 | Cum 04.08 0 12 | Cmt 05.08 0 12 | Paz 06.08 0 12 | Pzt 07.08 0 12 | Sal 08.08 0 12 | Çar 09.08 0 12 | Per 10.08 0 12 | Cum 11.08 0 12 | Cmt 12.08 0 12 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

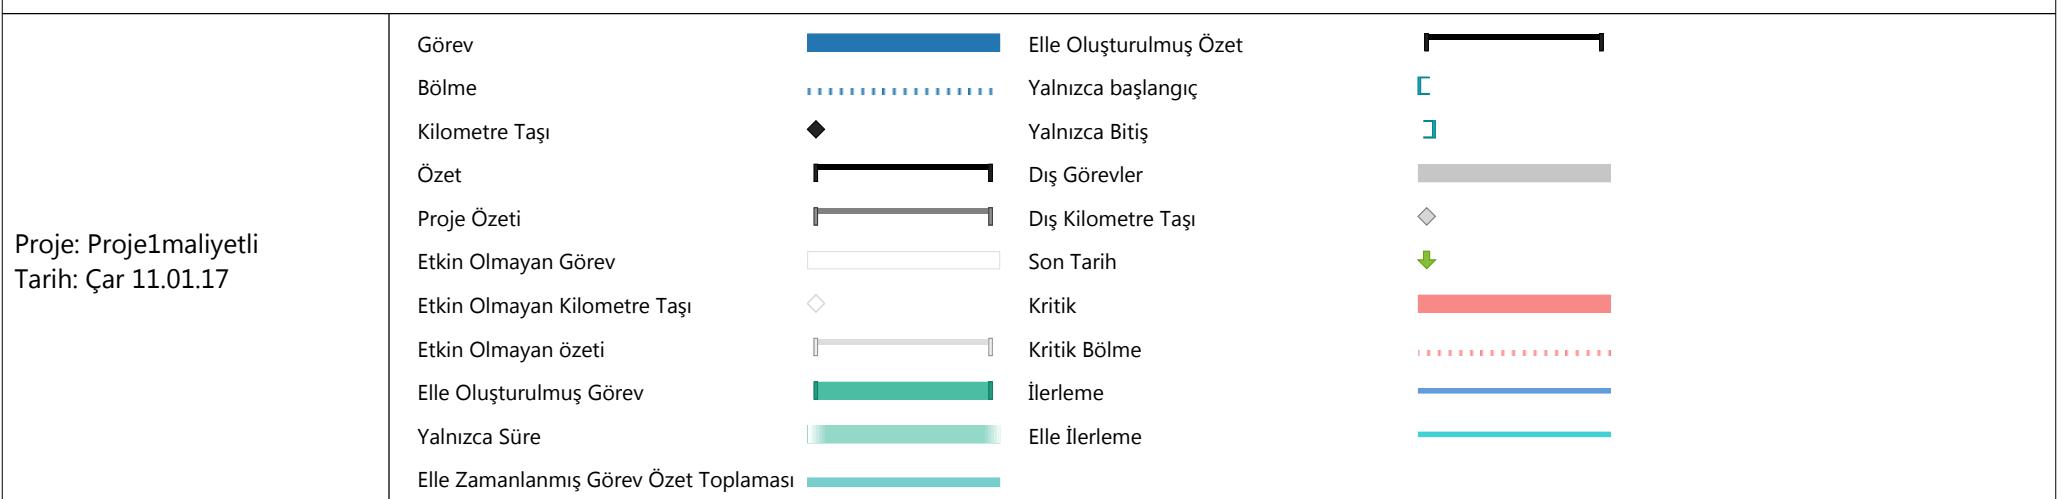

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 30.07 0 | Pzt 31.07 0 | Sal 01.08 0 | Çar 02.08 0 | Per 03.08 0 | Cum 04.08 0 | Cmt 05.08 0 | Paz 06.08 0 | Pzt 07.08 0 | Sal 08.08 0 | Çar 09.08 0 | Per 10.08 0 | Cum 11.08 0 | Çmt 12.08 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 30.07 0 | Pzt 31.07 0 | Sal 01.08 0 | Çar 02.08 0 | Per 03.08 0 | Cum 04.08 0 | Cmt 05.08 0 | Paz 06.08 0 | Pzt 07.08 0 | Sal 08.08 0 | Çar 09.08 0 | Per 10.08 0 | Cum 11.08 0 | Çmt 12.08 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 30.07 0 | Pzt 31.07 0 | Sal 01.08 0 | Çar 02.08 0 | Per 03.08 0 | Cum 04.08 0 | Cmt 05.08 0 | Paz 06.08 0 | Pzt 07.08 0 | Sal 08.08 0 | Çar 09.08 0 | Per 10.08 0 | Cum 11.08 0 | Cmt 12.08 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 30.07 0 | Pzt 31.07 0 | Sal 01.08 0 | Çar 02.08 0 | Per 03.08 0 | Cum 04.08 0 | Cmt 05.08 0 | Paz 06.08 0 | Pzt 07.08 0 | Sal 08.08 0 | Çar 09.08 0 | Per 10.08 0 | Cum 11.08 0 | Cmt 12.08 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

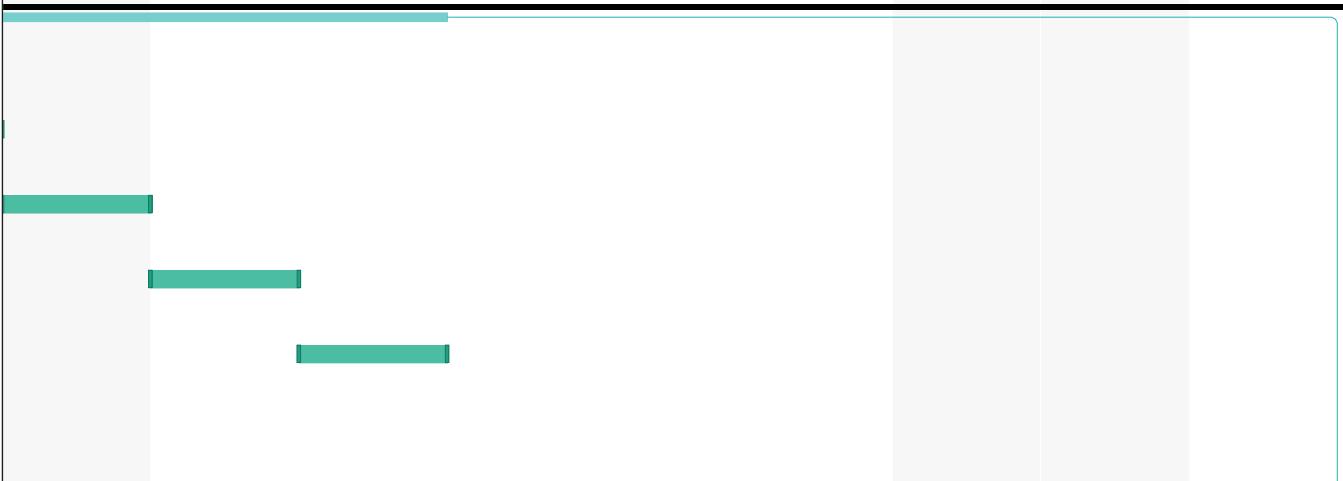

| |
|---|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 |
|---|

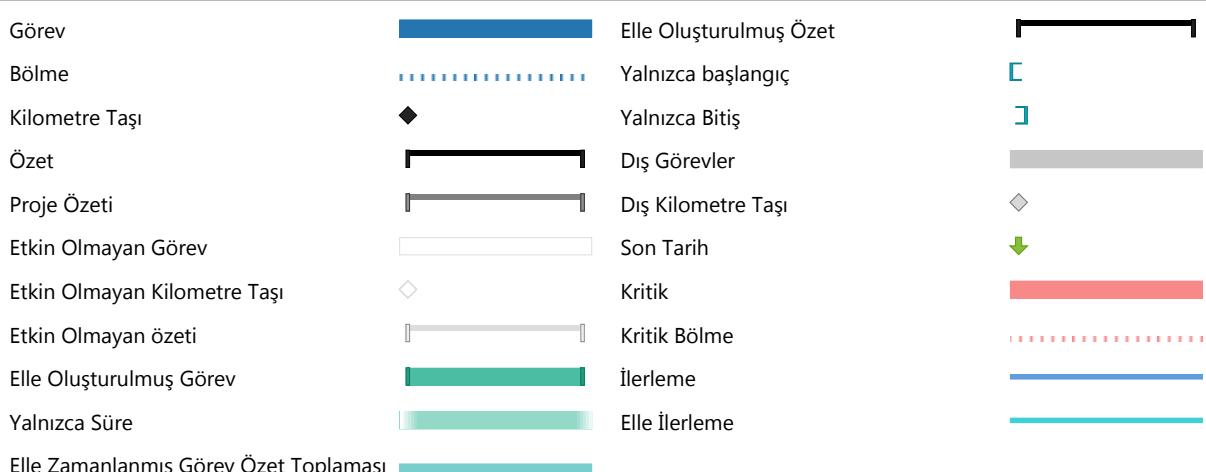

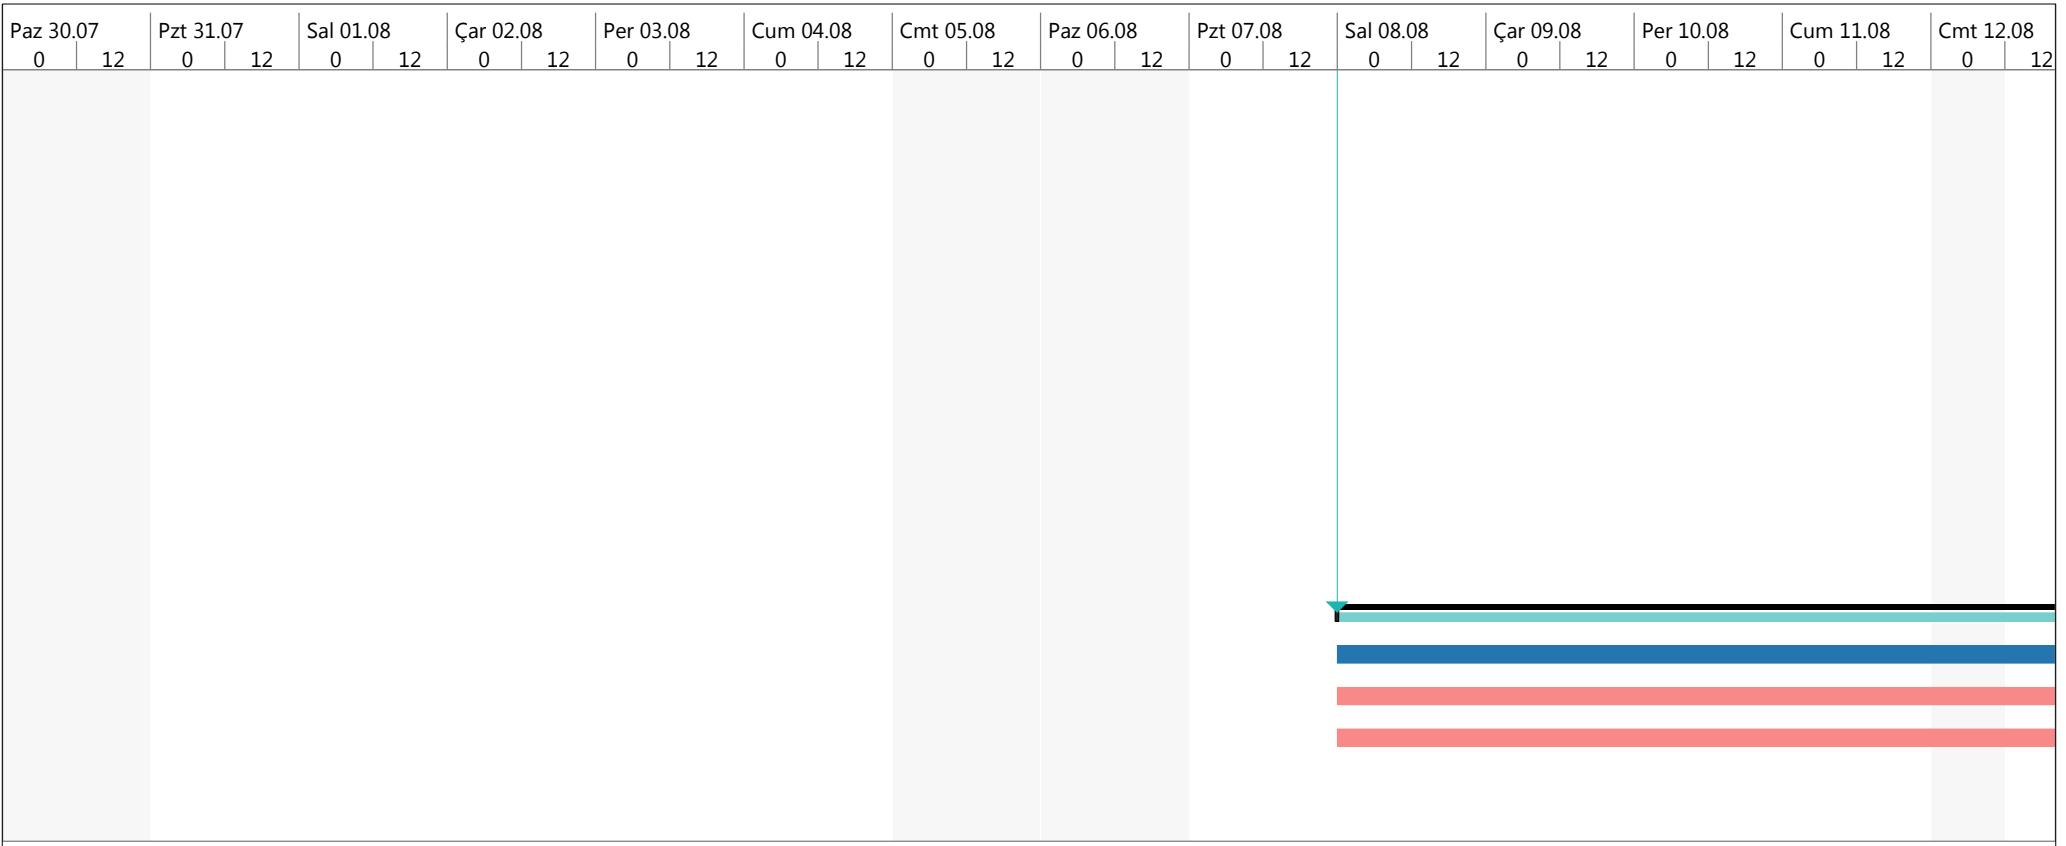


| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paz 30.07 0 | Pzt 31.07 0 | Sal 01.08 0 | Çar 02.08 0 | Per 03.08 0 | Cum 04.08 0 | Cmt 05.08 0 | Paz 06.08 0 | Pzt 07.08 0 | Sal 08.08 0 | Çar 09.08 0 | Per 10.08 0 | Cum 11.08 0 | Cmt 12.08 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

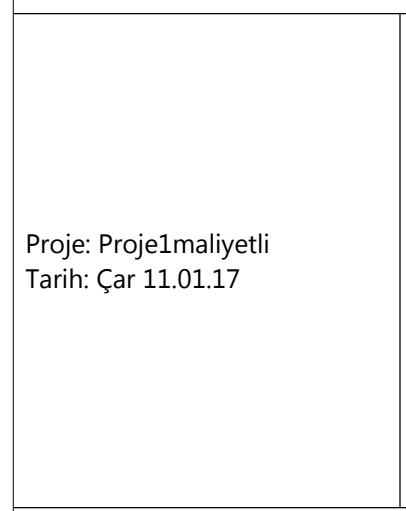

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

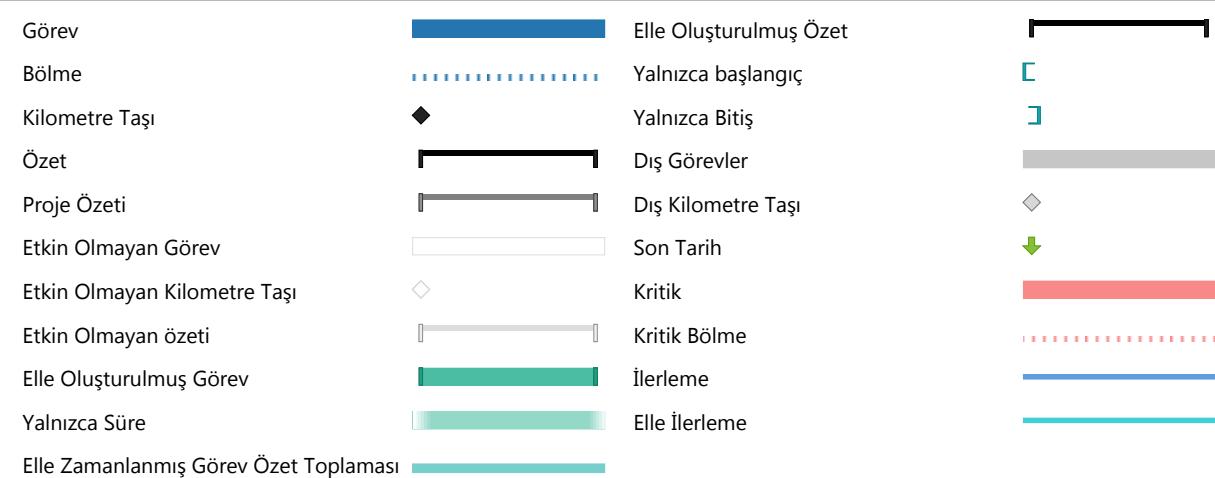

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17



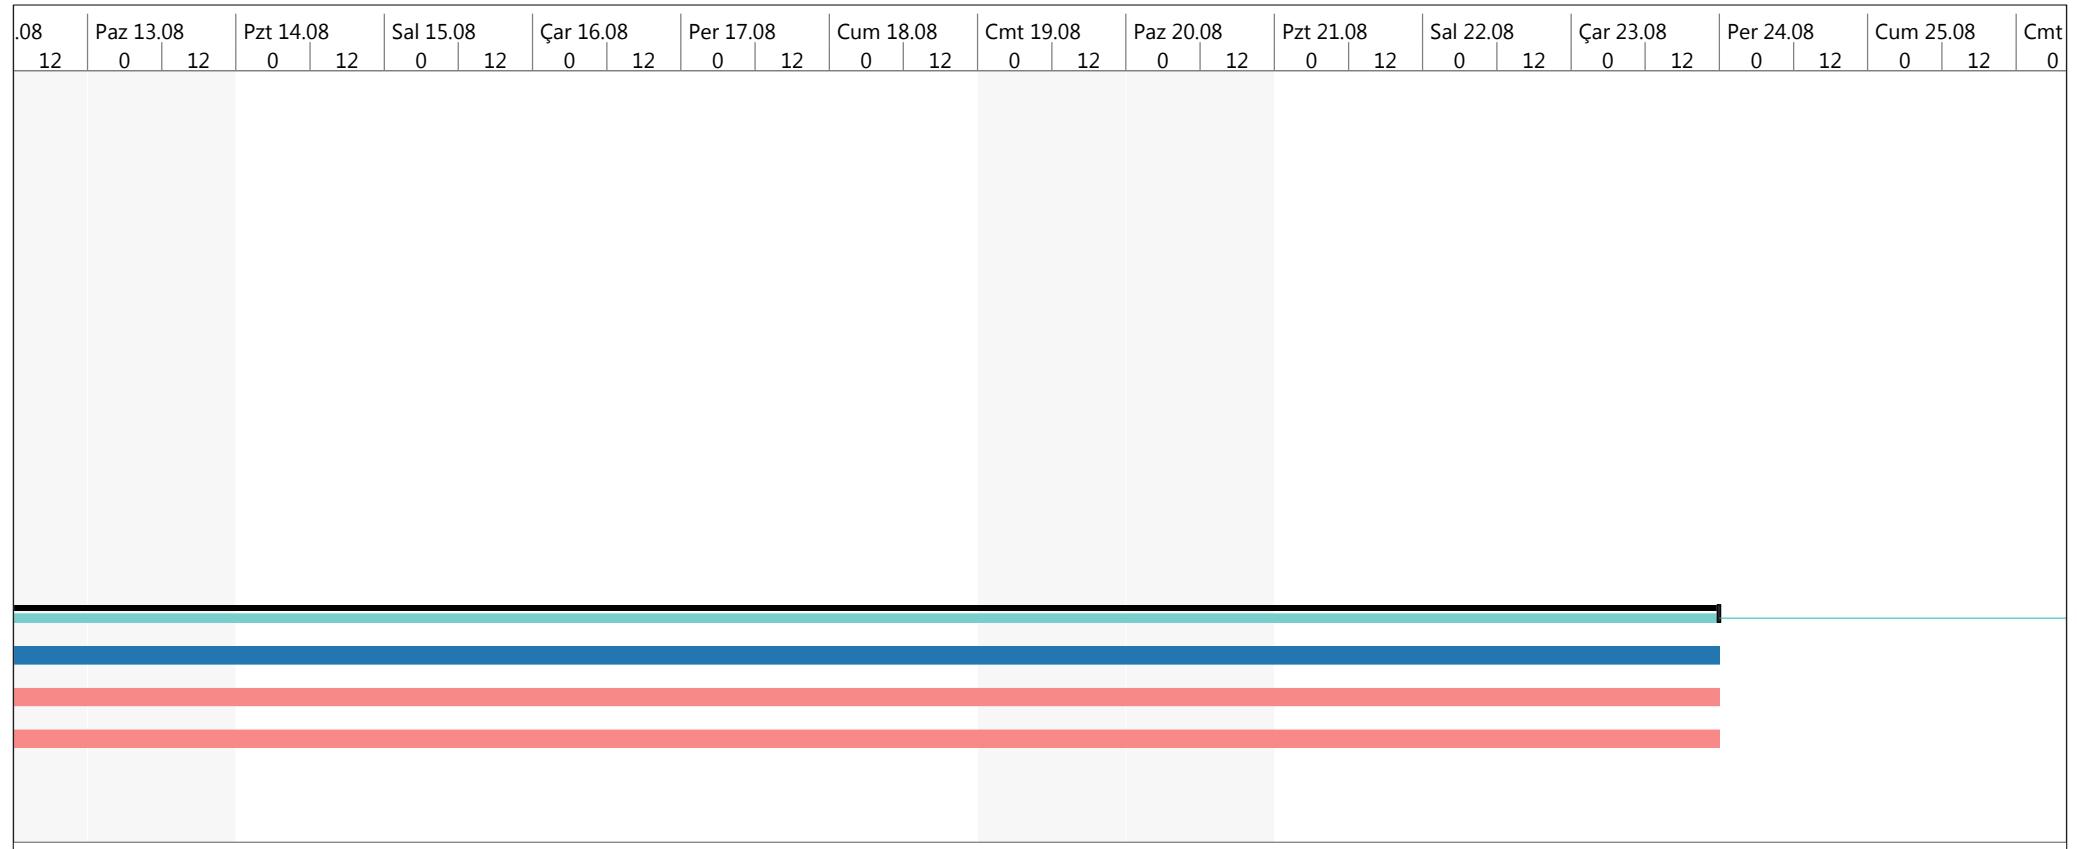


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| Bölme | | Yalnızca Başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| .08 12 | Paz 13.08 0 | Pzt 14.08 0 | Sal 15.08 0 | Çar 16.08 0 | Per 17.08 0 | Cum 18.08 0 | Cmt 19.08 0 | Paz 20.08 0 | Pzt 21.08 0 | Sal 22.08 0 | Çar 23.08 0 | Per 24.08 0 | Cum 25.08 0 | Cmt 0 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

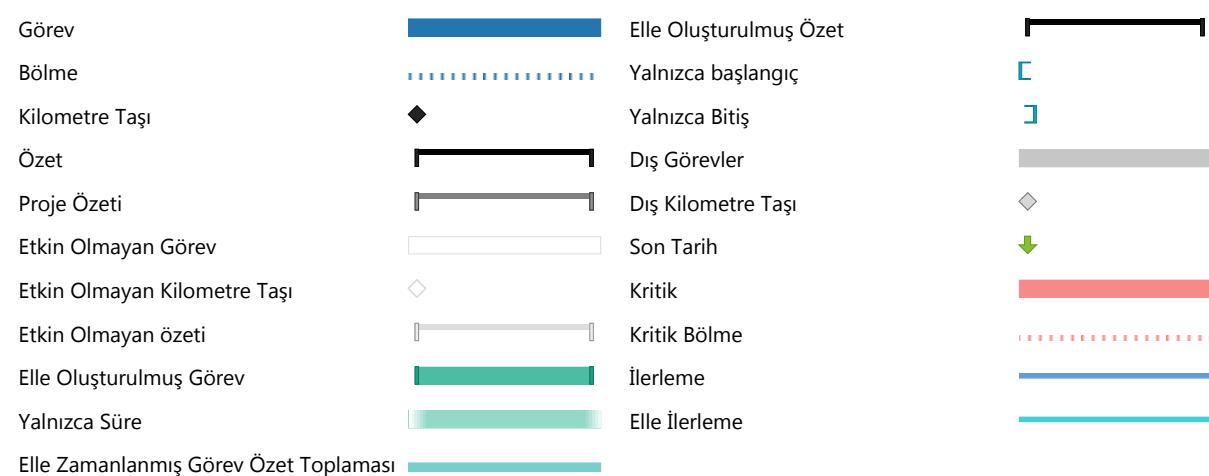

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 26.08 | 0 12 | Paz 27.08 | 0 12 | Pzt 28.08 | 0 12 | Sal 29.08 | 0 12 | Çar 30.08 | 0 12 | Per 31.08 | 0 12 | Cum 01.09 | 0 12 | Cmt 02.09 | 0 12 | Paz 03.09 | 0 12 | Pzt 04.09 | 0 12 | Sal 05.09 | 0 12 | Çar 06.09 | 0 12 | Per 07.09 | 0 12 | Cum 08.09 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

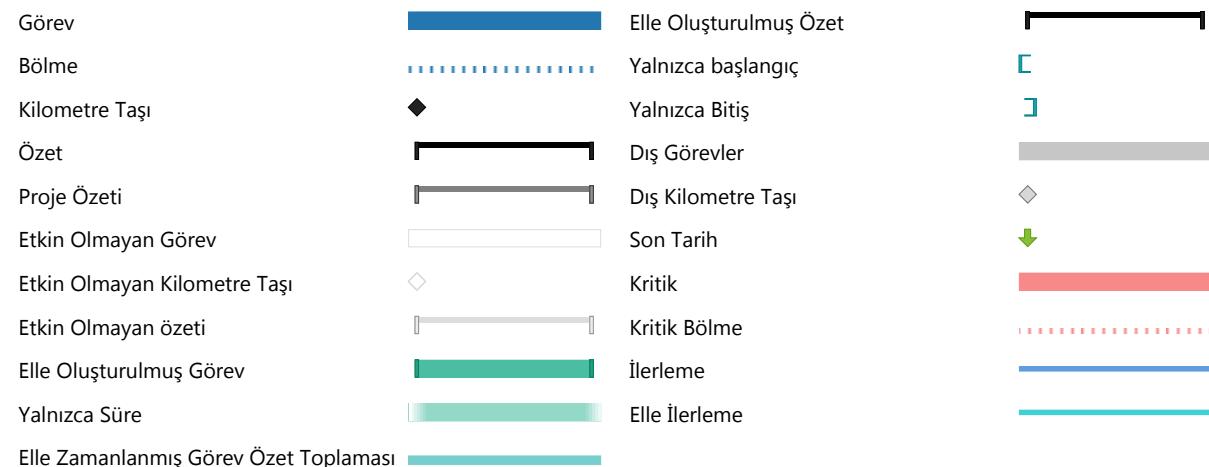


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 26.08 | 0 12 | Paz 27.08 | 0 12 | Pzt 28.08 | 0 12 | Sal 29.08 | 0 12 | Çar 30.08 | 0 12 | Per 31.08 | 0 12 | Cum 01.09 | 0 12 | Cmt 02.09 | 0 12 | Paz 03.09 | 0 12 | Pzt 04.09 | 0 12 | Sal 05.09 | 0 12 | Çar 06.09 | 0 12 | Per 07.09 | 0 12 | Cum 08.09 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Cmt 26.08 | 0 | 12 | Paz 27.08 | 0 | 12 | Pzt 28.08 | 0 | 12 | Sal 29.08 | 0 | 12 | Çar 30.08 | 0 | 12 | Per 31.08 | 0 | 12 | Cum 01.09 | 0 | 12 | Cmt 02.09 | 0 | 12 | Paz 03.09 | 0 | 12 | Pzt 04.09 | 0 | 12 | Sal 05.09 | 0 | 12 | Çar 06.09 | 0 | 12 | Per 07.09 | 0 | 12 | Cum 08.09 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

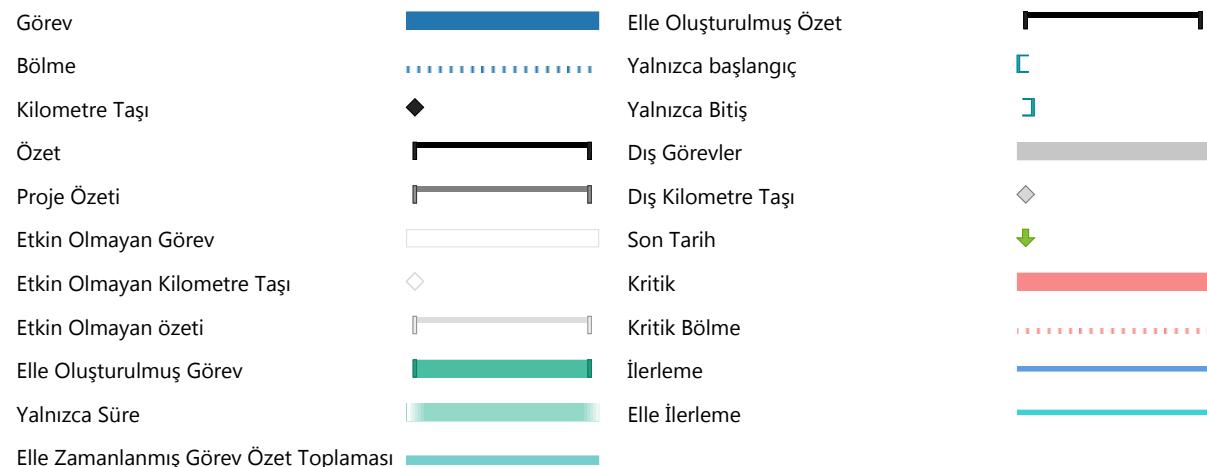


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Cmt 26.08 0 | 26.08 12 | Paz 27.08 0 | 27.08 12 | Pzt 28.08 0 | 28.08 12 | Sal 29.08 0 | 29.08 12 | Çar 30.08 0 | 30.08 12 | Per 31.08 0 | 31.08 12 | Cum 01.09 0 | 01.09 12 | Cmt 02.09 0 | 02.09 12 | Paz 03.09 0 | 03.09 12 | Pzt 04.09 0 | 04.09 12 | Sal 05.09 0 | 05.09 12 | Çar 06.09 0 | 06.09 12 | Per 07.09 0 | 07.09 12 | Cum 08.09 0 | 08.09 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Cmt 26.08 | 0 12 | Paz 27.08 | 0 12 | Pzt 28.08 | 0 12 | Sal 29.08 | 0 12 | Çar 30.08 | 0 12 | Per 31.08 | 0 12 | Cum 01.09 | 0 12 | Cmt 02.09 | 0 12 | Paz 03.09 | 0 12 | Pzt 04.09 | 0 12 | Sal 05.09 | 0 12 | Çar 06.09 | 0 12 | Per 07.09 | 0 12 | Cum 08.09 | 0 12 |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Cmt 26.08 | 0 | 12 | Paz 27.08 | 0 | 12 | Pzt 28.08 | 0 | 12 | Sal 29.08 | 0 | 12 | Çar 30.08 | 0 | 12 | Per 31.08 | 0 | 12 | Cum 01.09 | 0 | 12 | Cmt 02.09 | 0 | 12 | Paz 03.09 | 0 | 12 | Pzt 04.09 | 0 | 12 | Sal 05.09 | 0 | 12 | Çar 06.09 | 0 | 12 | Per 07.09 | 0 | 12 | Cum 08.09 | 0 | 12 |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|



| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
| Cmt 26.08 | 0 | 12 | Paz 27.08 | 0 | 12 | Pzt 28.08 | 0 | 12 | Sal 29.08 | 0 | 12 | Çar 30.08 | 0 | 12 | Per 31.08 | 0 | 12 | Cum 01.09 | 0 | 12 | Cmt 02.09 | 0 | 12 | Paz 03.09 | 0 | 12 | Pzt 04.09 | 0 | 12 | Sal 05.09 | 0 | 12 | Çar 06.09 | 0 | 12 | Per 07.09 | 0 | 12 | Cum 08.09 | 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.09 12 | Cmt 09.09 0 | Paz 10.09 0 | Pzt 11.09 0 | Sal 12.09 0 | Çar 13.09 0 | Per 14.09 0 | Cum 15.09 0 | Cmt 16.09 0 | Paz 17.09 0 | Pzt 18.09 0 | Sal 19.09 0 | Çar 20.09 0 | Per 21.09 0 | Cum 0 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.09 12 | Cmt 09.09 0 | Paz 10.09 0 | Pzt 11.09 0 | Sal 12.09 0 | Çar 13.09 0 | Per 14.09 0 | Cum 15.09 0 | Cmt 16.09 0 | Paz 17.09 0 | Pzt 18.09 0 | Sal 19.09 0 | Çar 20.09 0 | Per 21.09 0 | Cum 0 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.09 12 | Cmt 09.09 0 | Paz 10.09 0 | Pzt 11.09 0 | Sal 12.09 0 | Çar 13.09 0 | Per 14.09 0 | Cum 15.09 0 | Cmt 16.09 0 | Paz 17.09 0 | Pzt 18.09 0 | Sal 19.09 0 | Çar 20.09 0 | Per 21.09 0 | Cum 0 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|





| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.09 12 | Cmt 09.09 0 | Paz 10.09 0 | Pzt 11.09 0 | Sal 12.09 0 | Çar 13.09 0 | Per 14.09 0 | Cum 15.09 0 | Cmt 16.09 0 | Paz 17.09 0 | Pzt 18.09 0 | Sal 19.09 0 | Çar 20.09 0 | Per 21.09 0 | Cum 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.09 12 | Cmt 09.09 0 | Paz 10.09 0 | Pzt 11.09 0 | Sal 12.09 0 | Çar 13.09 0 | Per 14.09 0 | Cum 15.09 0 | Cmt 16.09 0 | Paz 17.09 0 | Pzt 18.09 0 | Sal 19.09 0 | Çar 20.09 0 | Per 21.09 0 | Cum 0 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

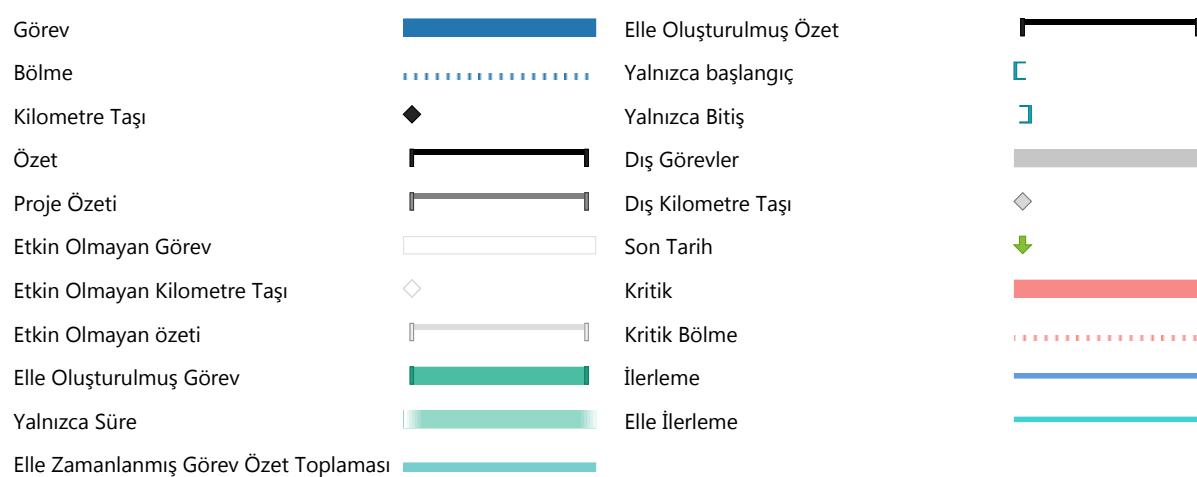

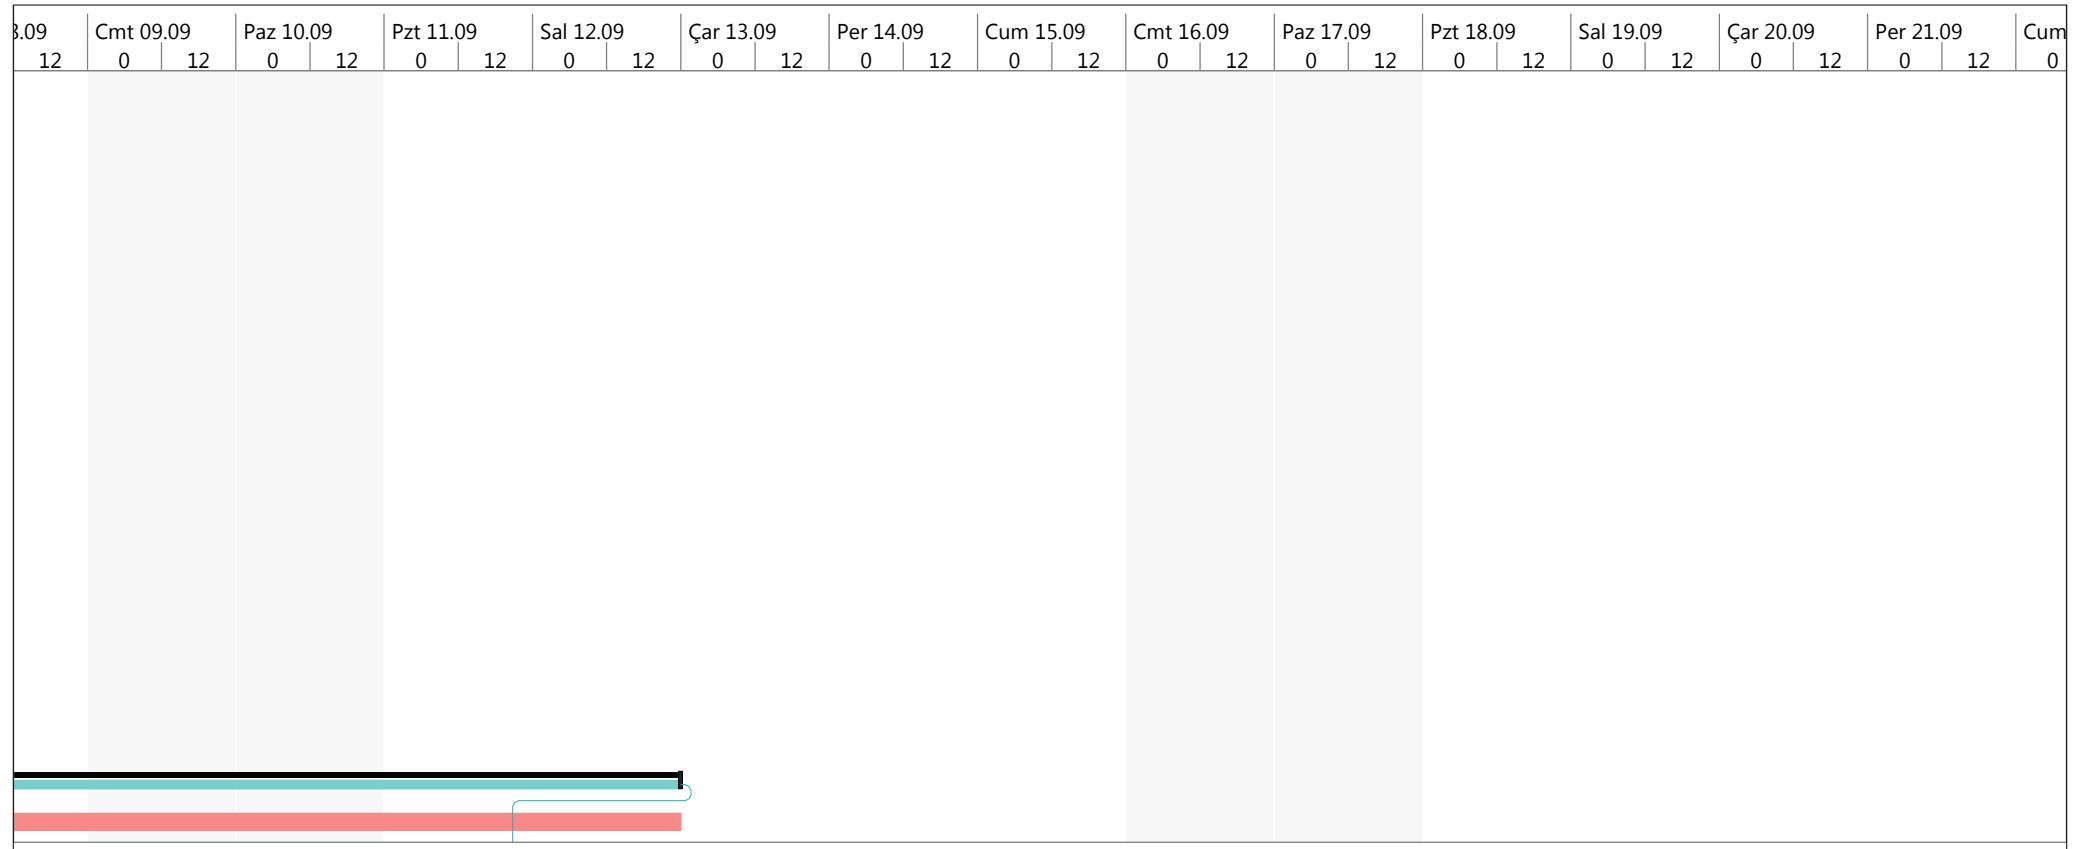


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özet | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özet Toplaması | | | |

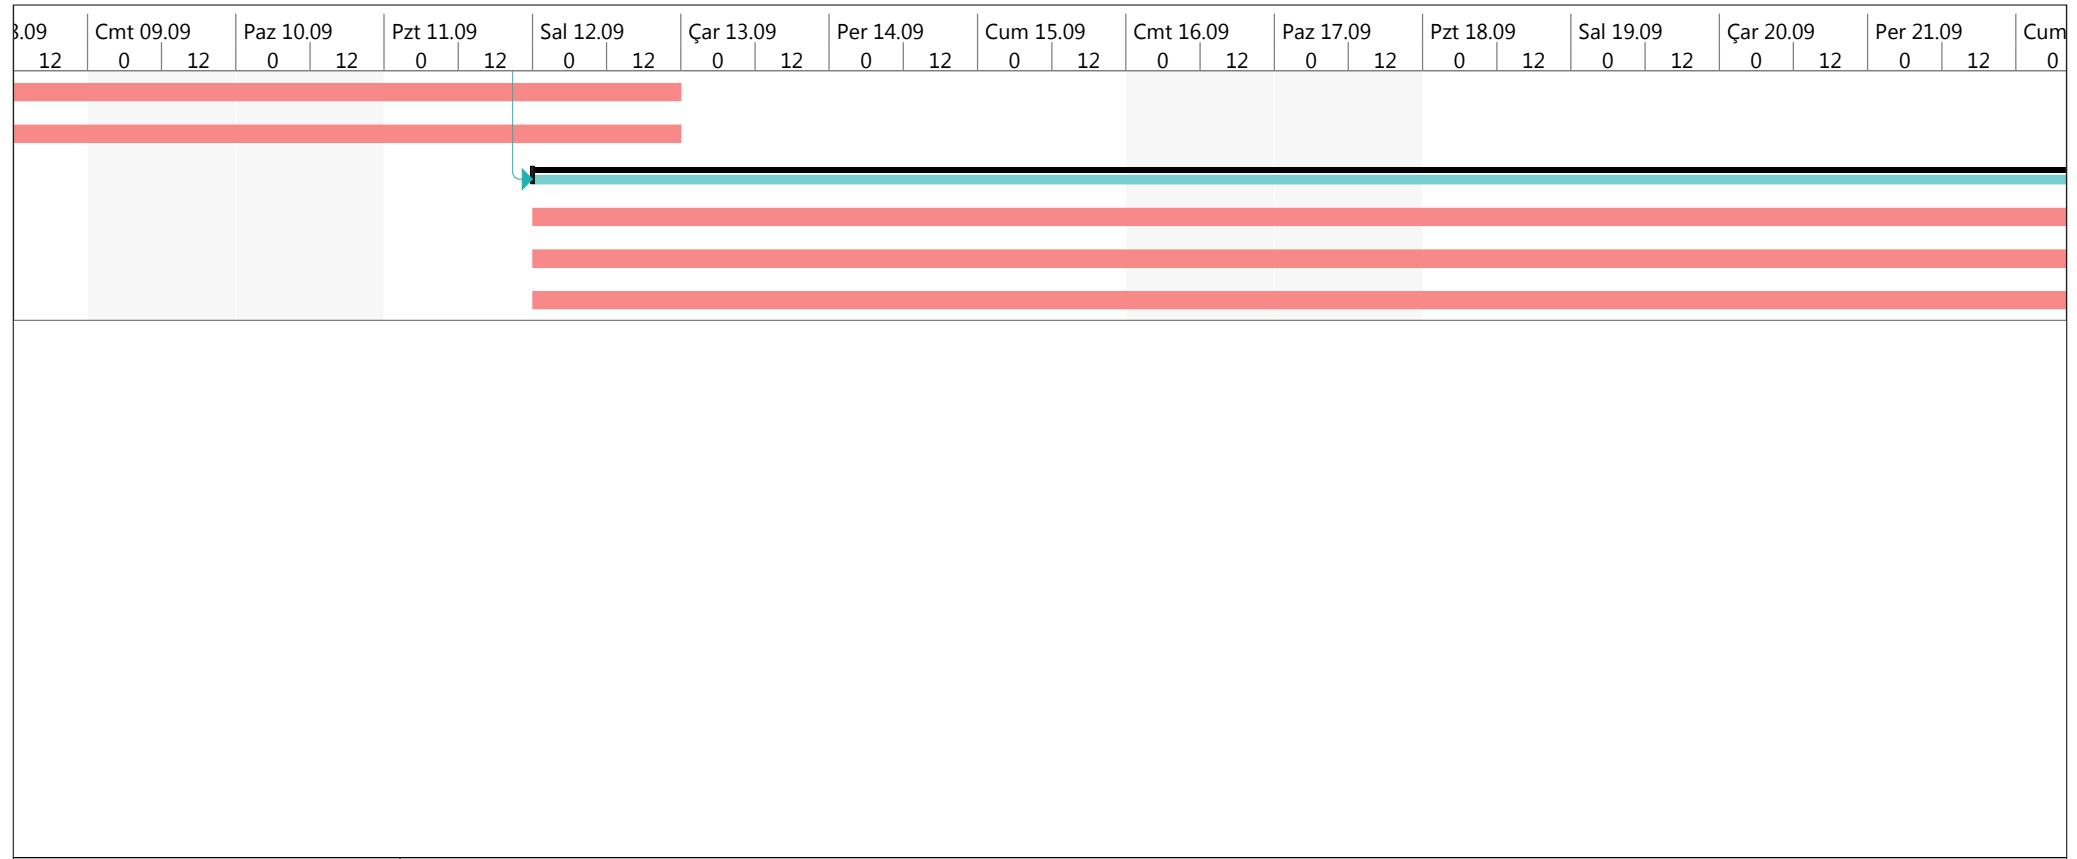


Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17


| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

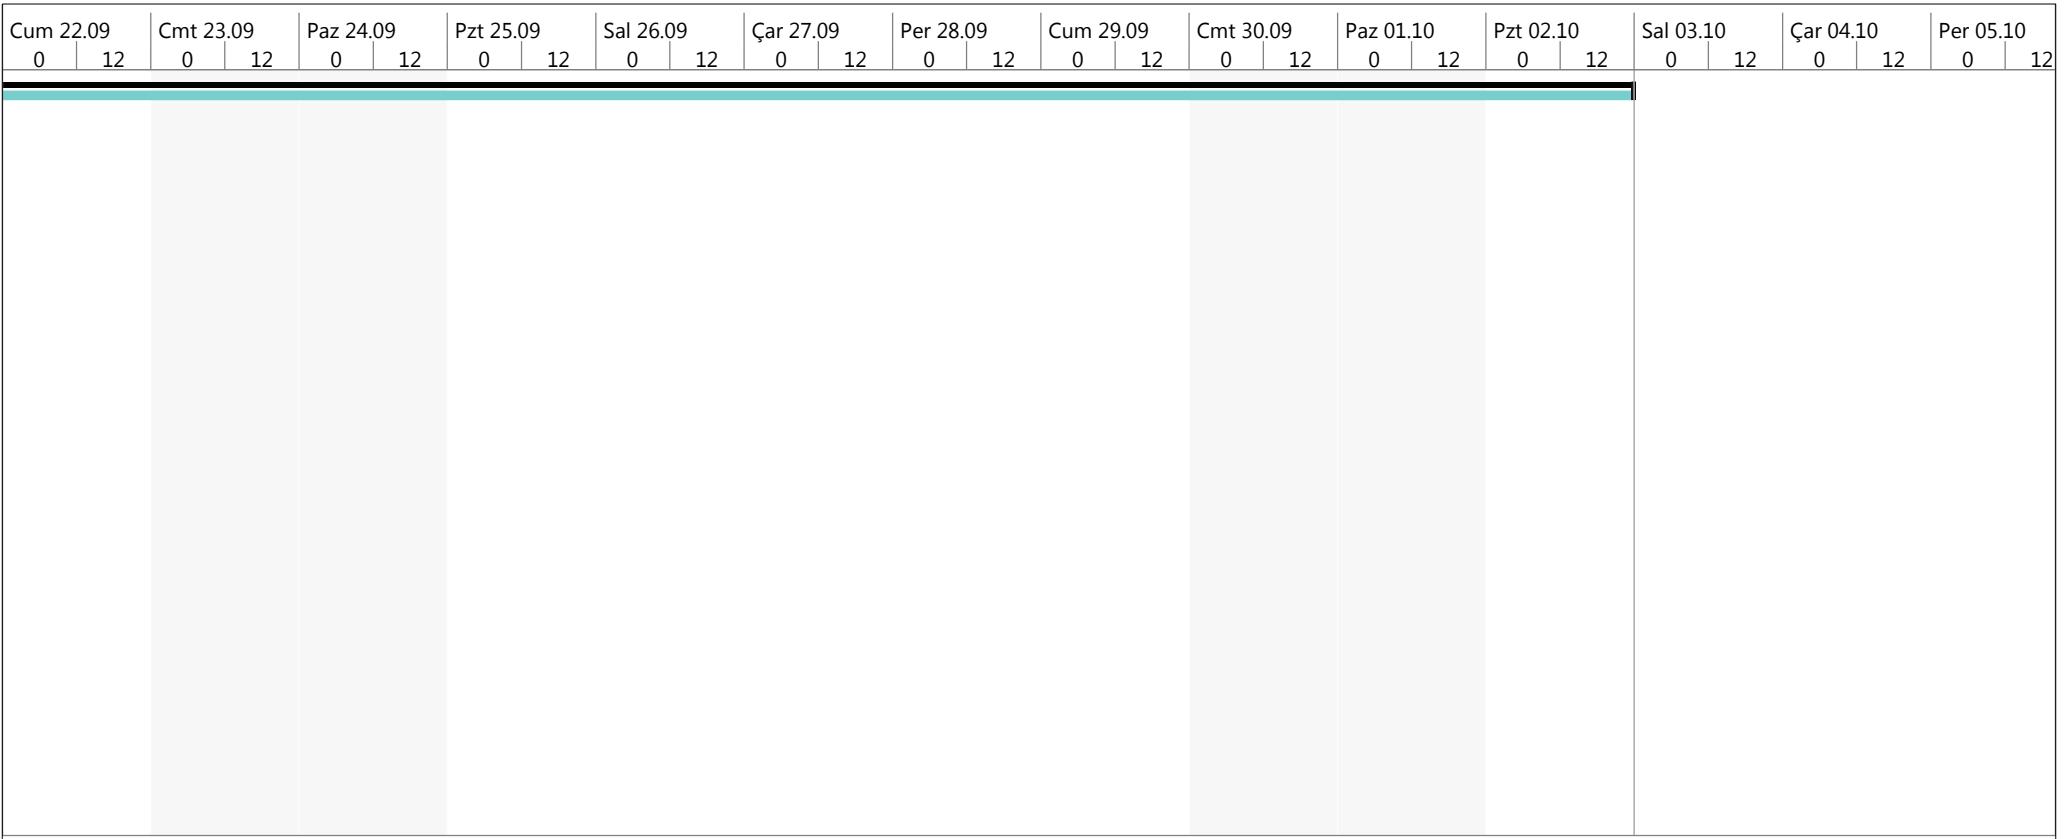

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 22.09 0 | Cmt 23.09 0 | Paz 24.09 0 | Pzt 25.09 0 | Sal 26.09 0 | Çar 27.09 0 | Per 28.09 0 | Cum 29.09 0 | Cmt 30.09 0 | Paz 01.10 0 | Pzt 02.10 0 | Sal 03.10 0 | Çar 04.10 0 | Per 05.10 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

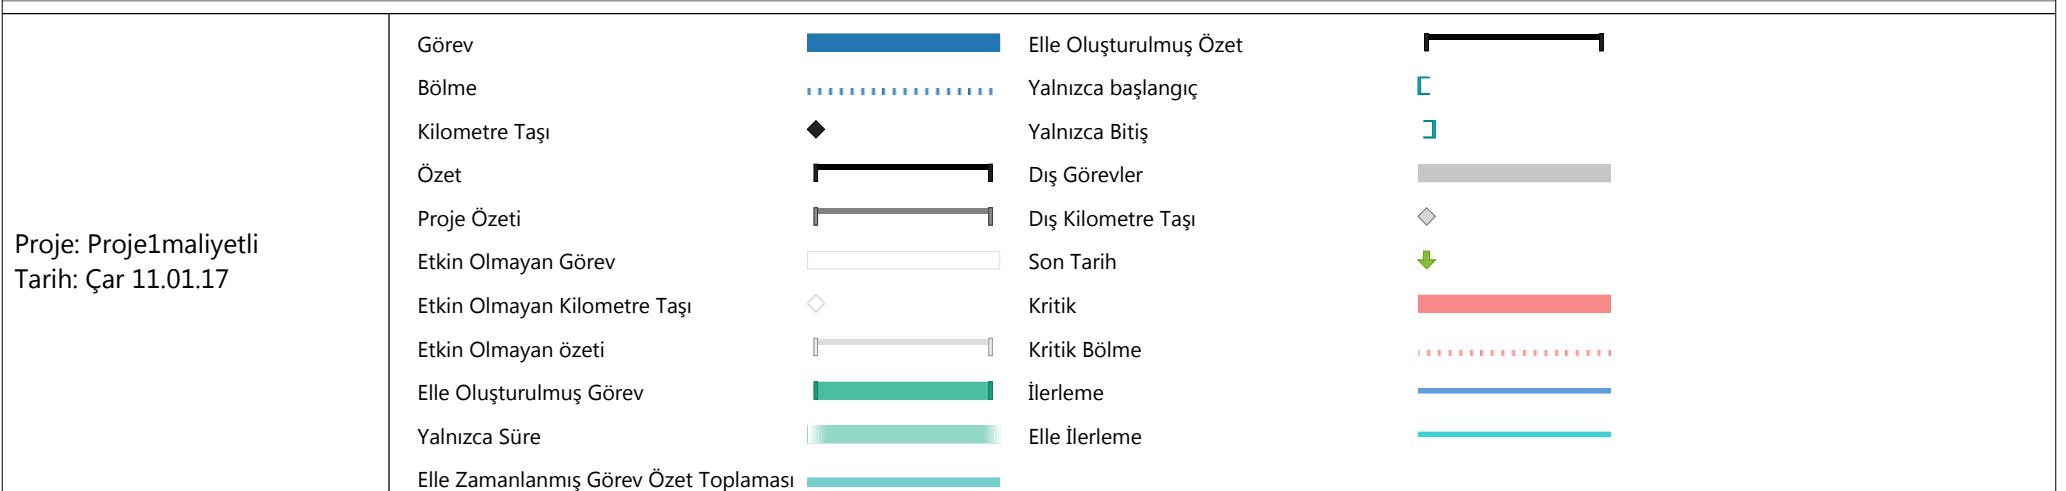

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 22.09 0 | Cmt 23.09 0 | Paz 24.09 0 | Pzt 25.09 0 | Sal 26.09 0 | Çar 27.09 0 | Per 28.09 0 | Cum 29.09 0 | Cmt 30.09 0 | Paz 01.10 0 | Pzt 02.10 0 | Sal 03.10 0 | Çar 04.10 0 | Per 05.10 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

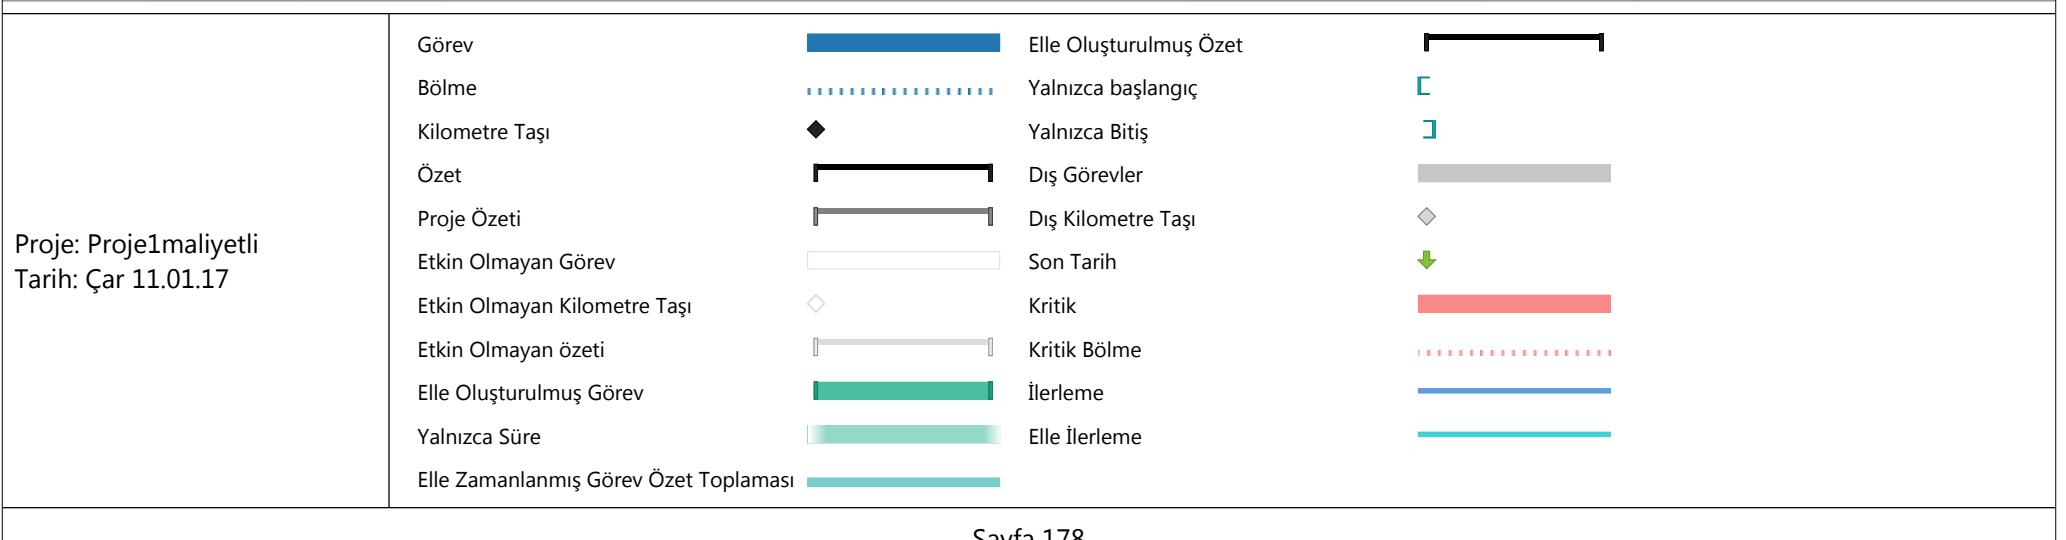

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 22.09 0 | Cmt 23.09 0 | Paz 24.09 0 | Pzt 25.09 0 | Sal 26.09 0 | Çar 27.09 0 | Per 28.09 0 | Cum 29.09 0 | Cmt 30.09 0 | Paz 01.10 0 | Pzt 02.10 0 | Sal 03.10 0 | Çar 04.10 0 | Per 05.10 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 22.09 0 | Cmt 23.09 0 | Paz 24.09 0 | Pzt 25.09 0 | Sal 26.09 0 | Çar 27.09 0 | Per 28.09 0 | Cum 29.09 0 | Cmt 30.09 0 | Paz 01.10 0 | Pzt 02.10 0 | Sal 03.10 0 | Çar 04.10 0 | Per 05.10 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cum 22.09 0 | Cmt 23.09 0 | Paz 24.09 0 | Pzt 25.09 0 | Sal 26.09 0 | Çar 27.09 0 | Per 28.09 0 | Cum 29.09 0 | Cmt 30.09 0 | Paz 01.10 0 | Pzt 02.10 0 | Sal 03.10 0 | Çar 04.10 0 | Per 05.10 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17 | Görev | | Elle Oluşturulmuş Özet | |
| | Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| | Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| | Özet | | Dış Görevler | |
| | Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| | Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| | Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| | Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| | Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| | Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| | Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |

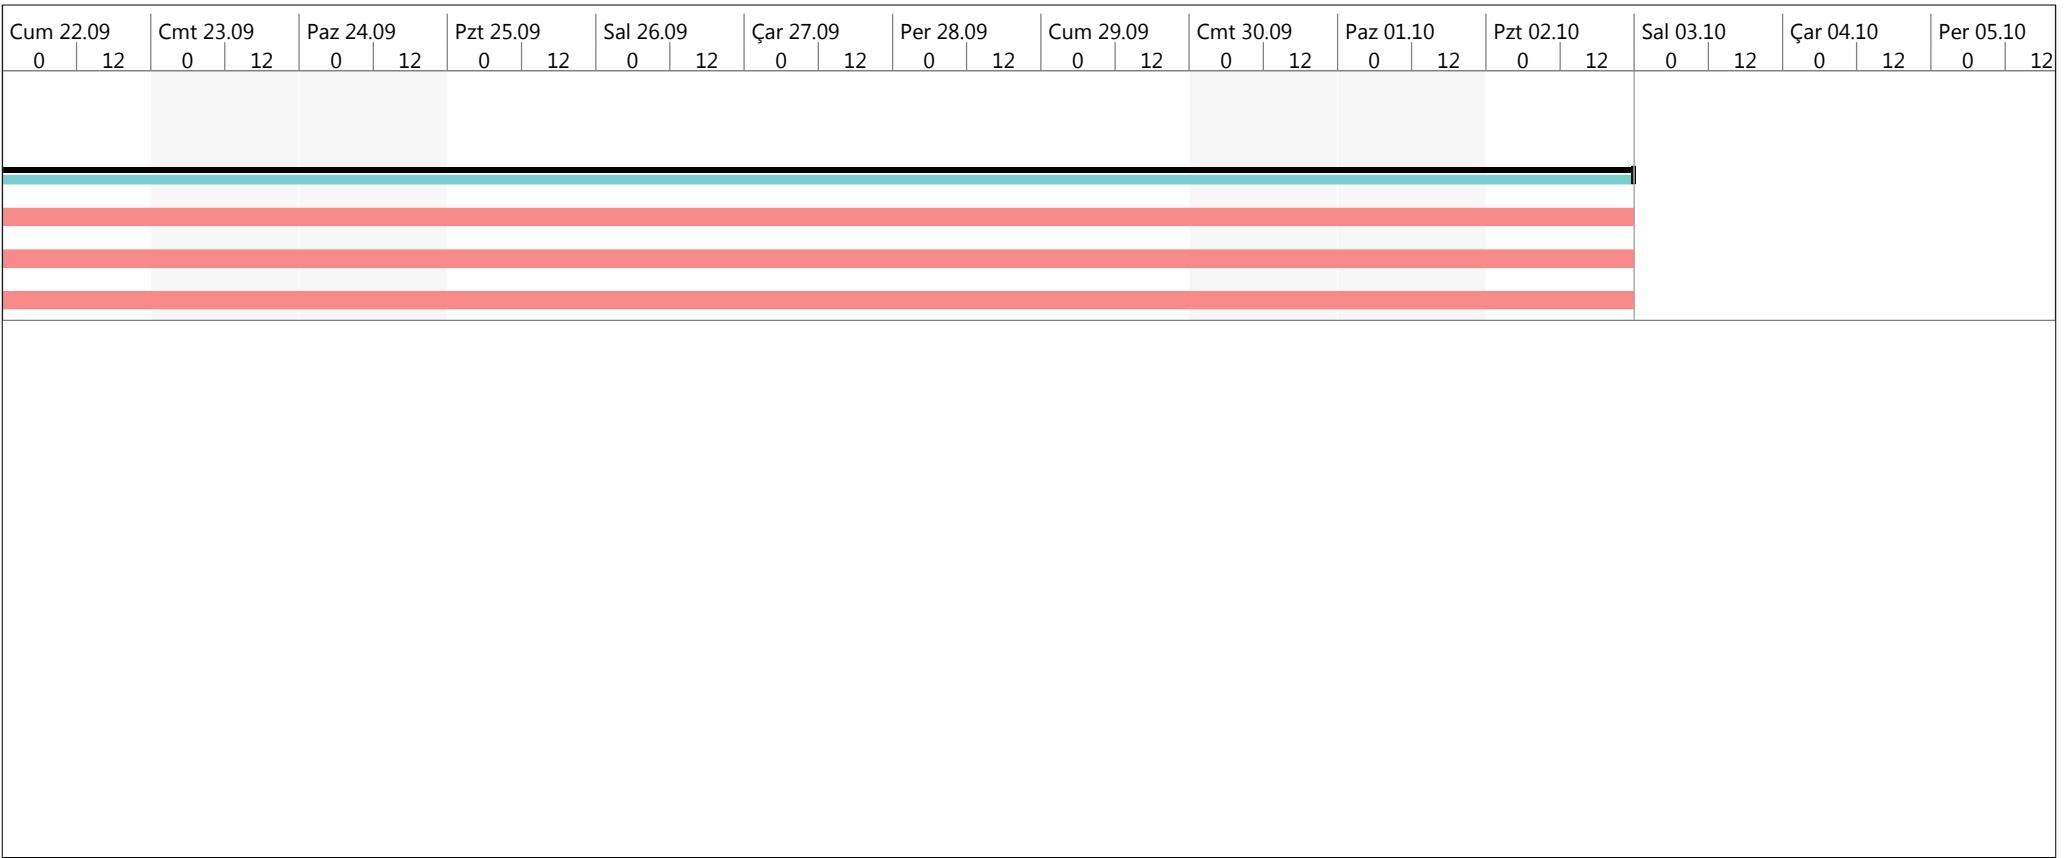

Proje: Proje1maliyetli
Tarih: Çar 11.01.17

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Görev | | Elle Oluşturulmuş Özeti | |
| Bölme | | Yalnızca başlangıç | |
| Kilometre Taşı | | Yalnızca Bitiş | |
| Özet | | Dış Görevler | |
| Proje Özeti | | Dış Kilometre Taşı | |
| Etkin Olmayan Görev | | Son Tarih | |
| Etkin Olmayan Kilometre Taşı | | Kritik | |
| Etkin Olmayan özeti | | Kritik Bölme | |
| Elle Oluşturulmuş Görev | | İlerleme | |
| Yalnızca Süre | | Elle İlerleme | |
| Elle Zamanlanmış Görev Özeti Toplaması | | | |
